

福岡市立病院機構における  
重要課題の進捗状況


- 1 新しいこども病院の進捗状況について
- 2 「ふくおかハウス」建設募金について
- 3 福岡市民病院の別館建設について

地方独立行政法人

福岡市立病院機構

# 1 新しいこども病院の進捗状況について

平成 26 年 11 月の新病院開院を目指し、整備を進めており、建設工事については平成 24 年 12 月 15 日に着工し、現在は基礎工事及び躯体工事を行っているところである。

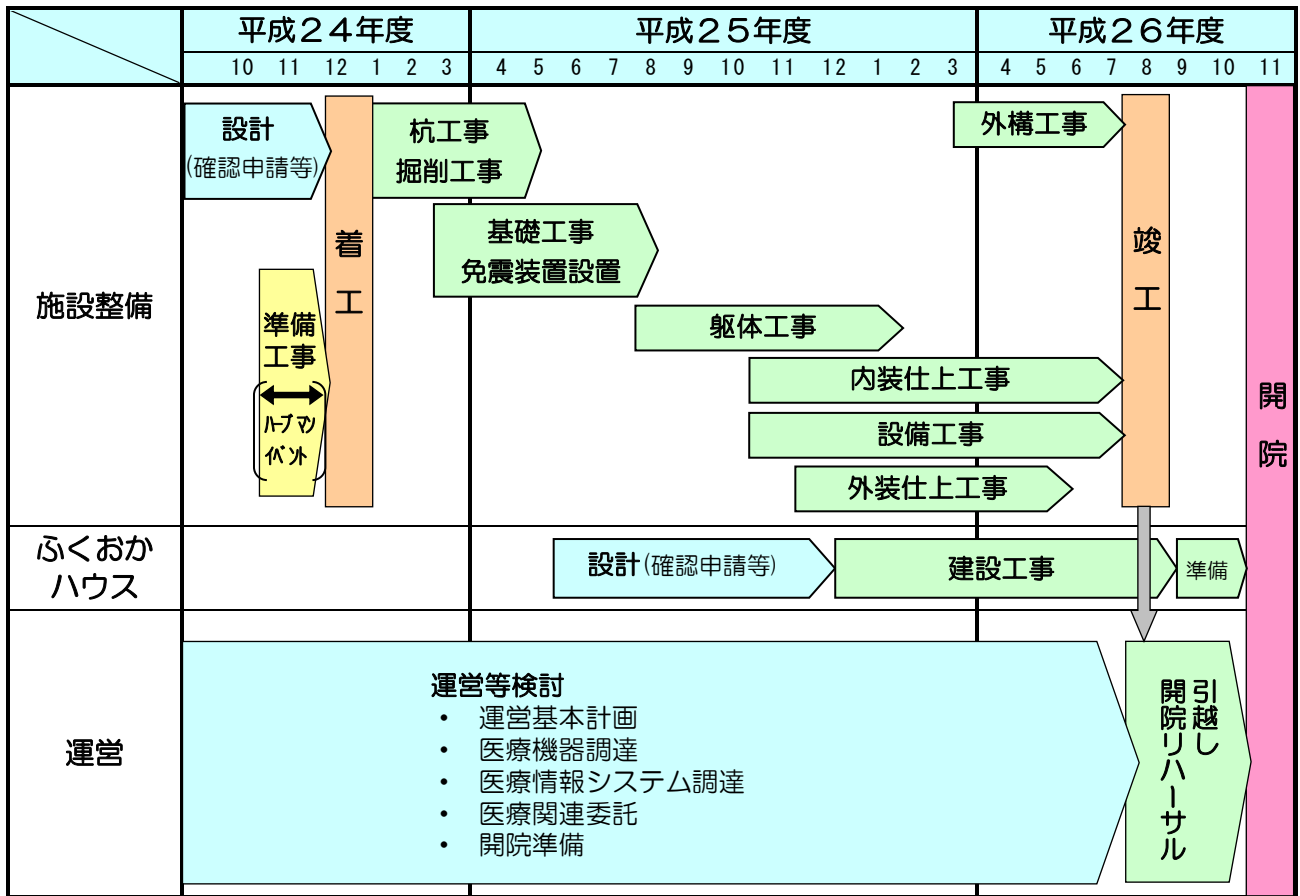

## <参考> 建設現場の状況について



建設現場全景（アイランドタワー15Fより平成25年7月撮影）



仮囲い設置状況  
(こども病院/新採用看護師研修にて)




基礎工事の様子



鉄筋工事の様子



免震装置設置前の様子

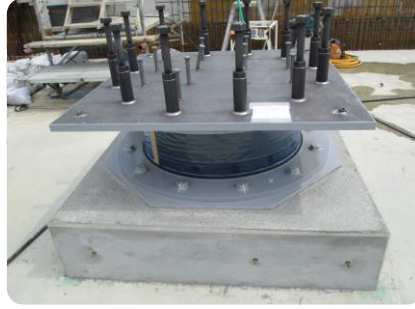

免震装置設置後の様子



1階床面の様子

## 2 「ふくおかハウス」建設募金について

### (1) 「ふくおかハウス」建設募金活動状況

#### ①募金委員会委員の就任について

「がんの子どもを守る会」九州北支部代表幹事 高橋和子氏が新たに就任 ※計 29 団体 28 名

#### ②募金活動の取り組み状況

○周知活動・・・リーフレット配布約 28,300 枚、ポスター掲示約 160 枚  
ホームページ約 5,800 アクセス (7/11 現在)

○募金活動・・・天神、どんたく、ヤフオクドーム、アイランドシティなど計 8 回実施

○募金箱設置・・・16ヶ所設置[計 23 個]

#### ③新聞報道等

○新聞記事掲載・・・5/1 日経、5/2 毎日・西日本・朝日、5/11 読売、5/12 毎日、  
7/3 読売

○TV放送・・・5/1、5/2

### (2) 今後の取り組みについて

#### ①主な取組み先

○行政関係・・・市関係機関、福岡都市圏広域行政事業組合、4都市交流連携協定など

○経済界・・・経済団体、発起人関係企業、九州の有力企業など

○医療界・・・県医師会、市医師会、九州自治体病院災害相互応援協定を締結病院など

#### ②今後の活動

募金委員会委員の所属する企業・団体を中心に寄付の依頼を行うとともに、引き続き、周知活動を通してふるさと福岡応援寄付を利用した寄付を呼び掛けていく。


### 3 福岡市民病院の別館建設について

感染症専用病床（4床）の新設や救急診療体制の強化のために整備を予定している別館（4階建）は、フロア毎の機能を確定し、設計業務が概ね終了。  
平成26年度の早い時期の業務開始を目指し、今後、施工業者の選定などを行う予定。

○ 別館の概要【地上4階建て、建床面積381.7㎡、延床面積1416.59㎡】

区分	用途	
	平常時	感染症流行時及び災害発生時
1階	救急処置室、救急受付、待合室 説明室、救急スタッフ室、検査室	専用外来（トリアージの実施及び診察） 感染症専用診察室、救急処置室・など
2階	多目的ホール 備品庫（簡易ベッド）	患者の収容 仮設病床（50床程度）
3階	更衣室、備品庫（食料等）、当直室 医局	常駐スタッフの執務・待機スペース シャワー室、更衣室、仮眠室・など
4階	感染症病床（4床）、備品庫（防護服・マスク等）、器材庫、ナースステーション、更衣室、説明室	重症～中等症の感染症患者の収容 感染症病床（4床）、器材庫、ナースステーション、更衣室、感染予防シャワー室

○ 配置図

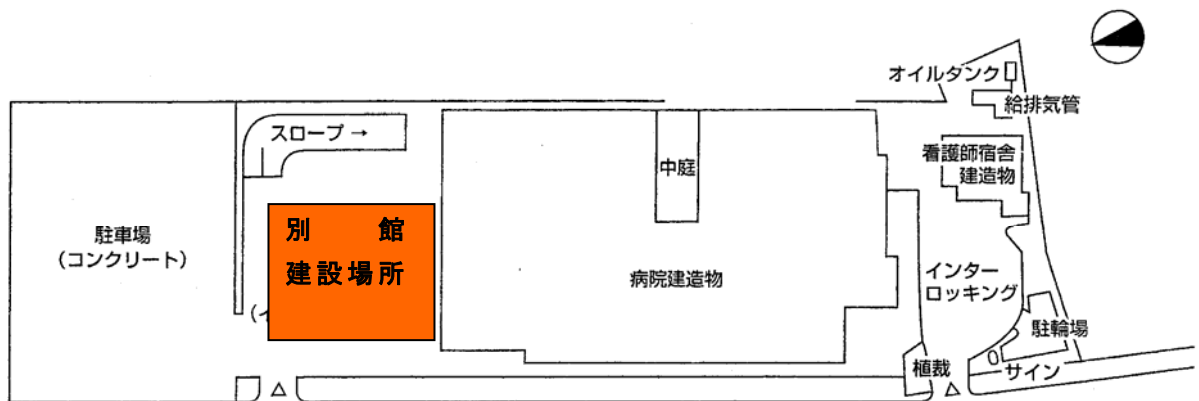

○ スケジュール

平成25年度												平成26年度			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 15px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <span>詳細設計</span> </div>															
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 15px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <span>建築確認申請</span> </div>															
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 15px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <span>7/2 地元説明会</span> </div>															
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 15px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <span>工事業者選定</span> </div>															
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 150px; height: 15px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <span>建設工事</span> </div>												<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">竣工(予定)</div>			
												<div style="width: 100px; height: 15px; background-color: #FFD700; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <span>業務開始</span>			
