

造成工事の概要（予定）

■ 造成工事の概要

○ 主な工事内容：

- ・盛土工事
- ・構造物撤去工事
- ・舗装工事



■ 造成工事の進め方（案）

- ・ 工区を分割し、歩行者動線や駐車場、交通広場機能（臨時バス・タクシー乗り場）を確保しながら、段階的に進めていく。

< 造成工事に伴う駐車場等の移転先（予定） >

- 一般駐車場（A駐車場） → 暫定駐車場（現交通広場）
- 臨時バス乗り場（交通広場） → イベントヤード
- タクシー乗り場（交通広場） → 国際会議場ロータリー

< 造成工事のスケジュール（予定） >

H30年8月～H31年9月（予定）

※スケジュールや工事の進め方等は現時点での計画であり、今後、契約手続きや工事の進捗等により変更となる可能性がある



イベントヤードでの臨時バス乗り場の様子



国際会議場ロータリーでのタクシー乗り場の様子




造成工事の段階的な施工計画について（予定）


	H30年度				H31年度			
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	
1工区			①					
2工区				②				
3工区					③			
4工区						④		

※スケジュールや工事範囲等は現時点での想定であり、
今後、施工業者との協議や工事の進捗状況等により
変更となる可能性がある。


① 1工区施工時（H30.8頃～H30.11頃）

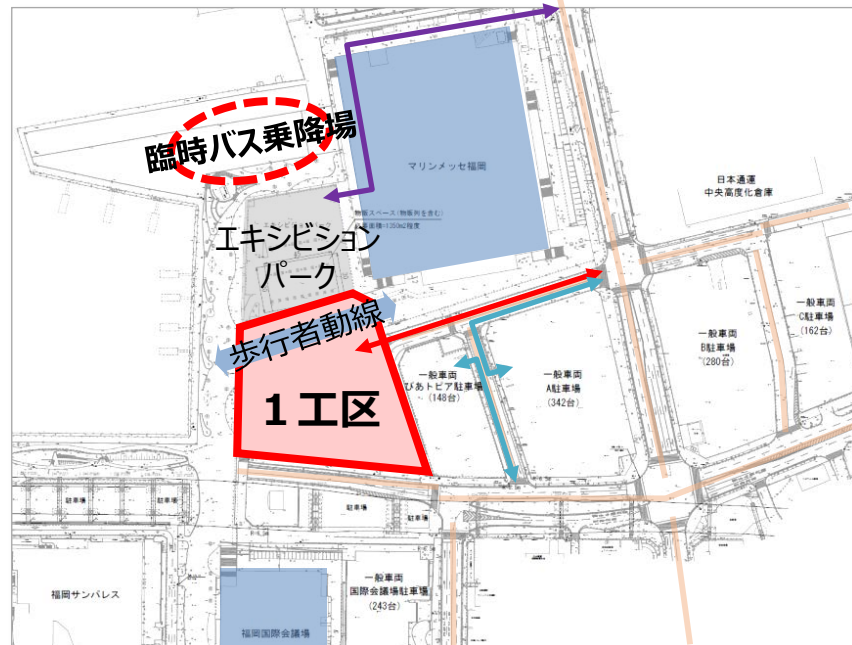

③ 3工区施工時（H31.1頃～H31.6頃）

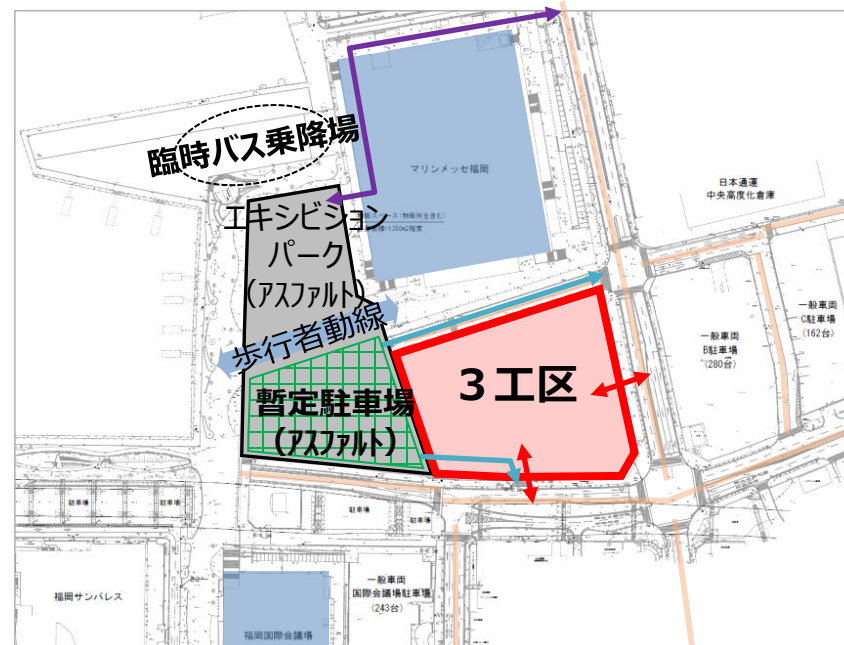

② 2工区施工時（H30.12頃）

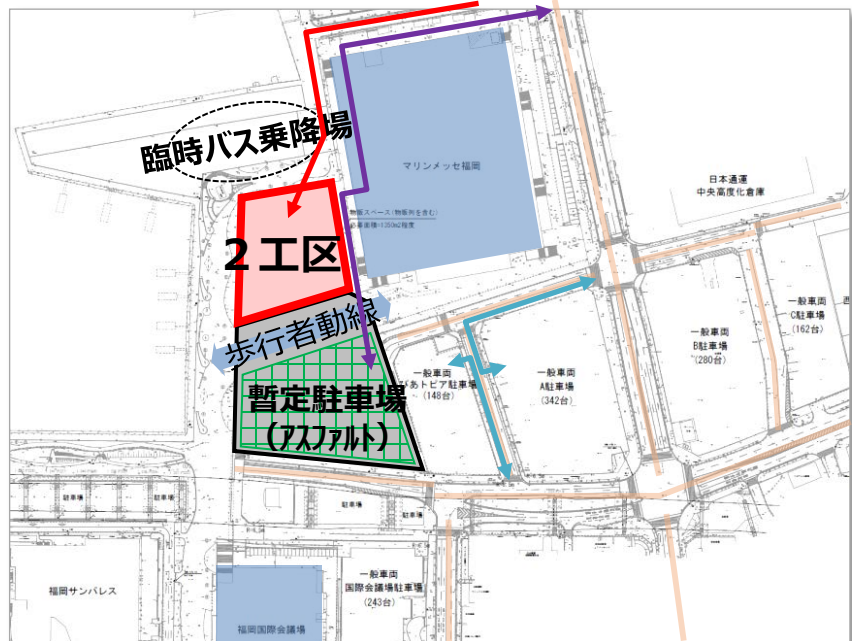

④ 4工区施工時（H31.7頃～H31.9頃）



凡例	
	工事範囲（想定）
	関係車両動線（想定）
	一般車両動線（想定）
	工事車両動線（想定）
