

# 西部資源化センター 解体工事

## 工事説明会

博栄・橋本・都市資源開発工事共同企業体

# 工事概要

1. 工期：令和7年9月13日～令和8年10月5日
2. 発注者：福岡市環境局施設部西部工場再整備課
3. 施工者：博栄・橋本・都市資源開発工事共同企業体
4. 解体範囲：建物解体(FLより上部)、渡り廊下、プラント設備、その他外構 など



# 作業工程、工事工程

## ◆一日の作業工程

現場入場	7:00	～	8:00
朝礼 始業前点検等	8:00	～	8:30
作業時間	8:30	～	17:00
片付・清掃	17:00	～	17:30
現場退出	17:30	～	18:30

## ◆工事工程(予定)








R7年12月～R8年2月末まで

# 仮設計画図① 渡り廊下解体

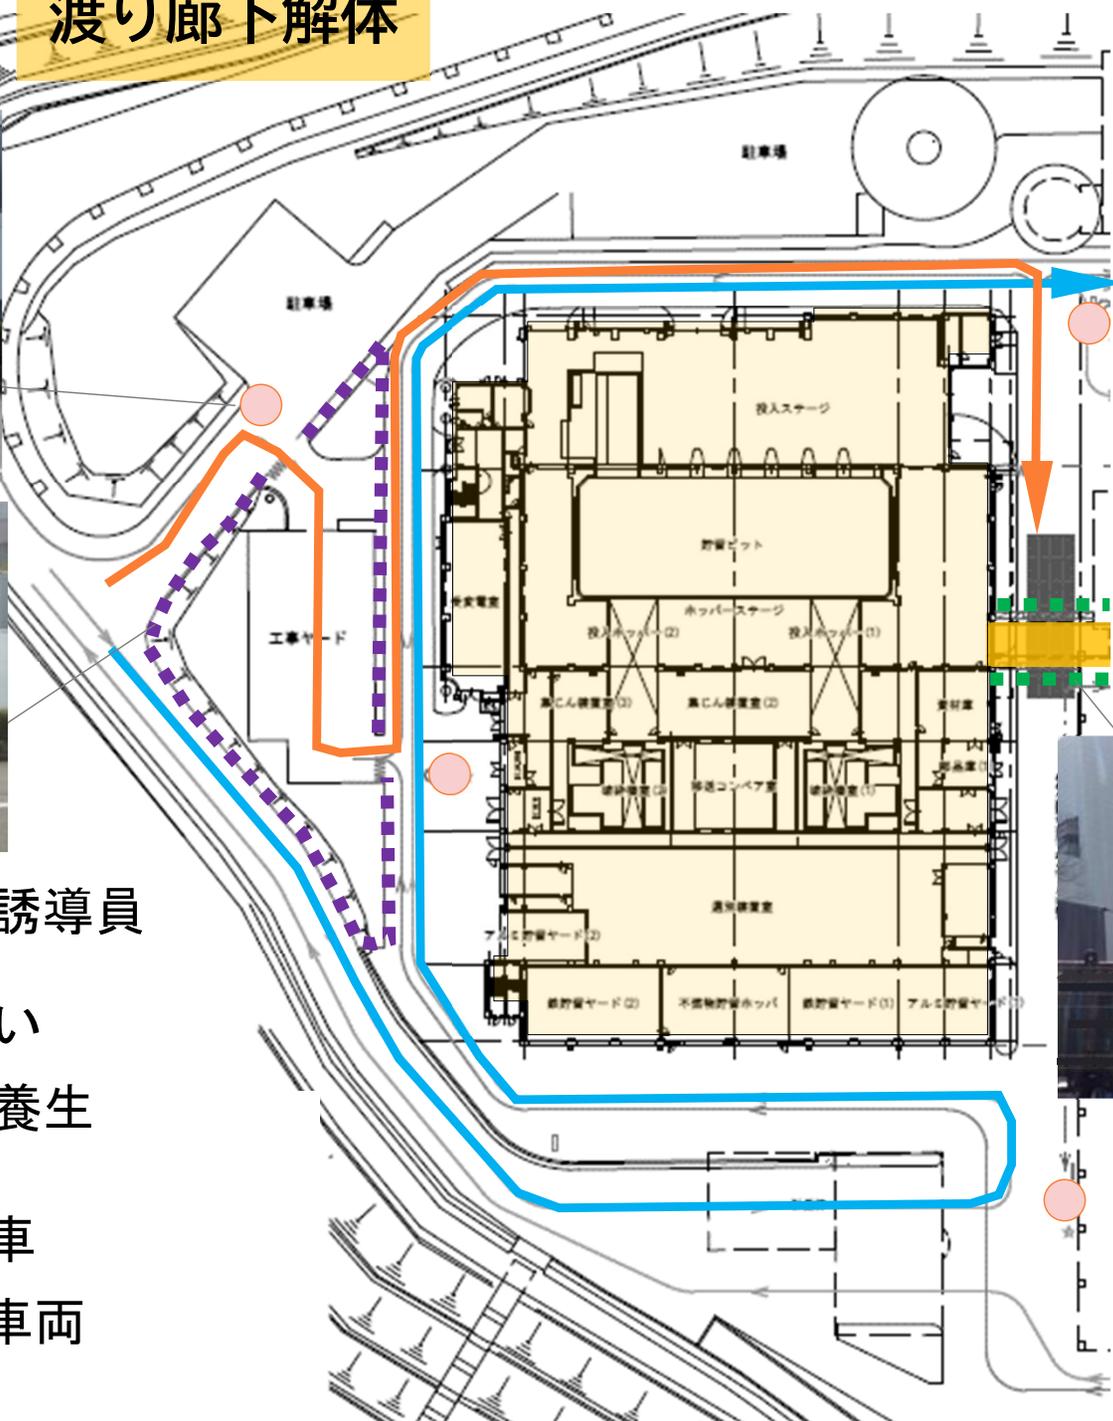

- 交通誘導員
- 仮囲い
- 足場養生
- 搬入車
- 工事車両






# 仮設計画図②

## 本体解体

R8年3月～R8年8月末まで

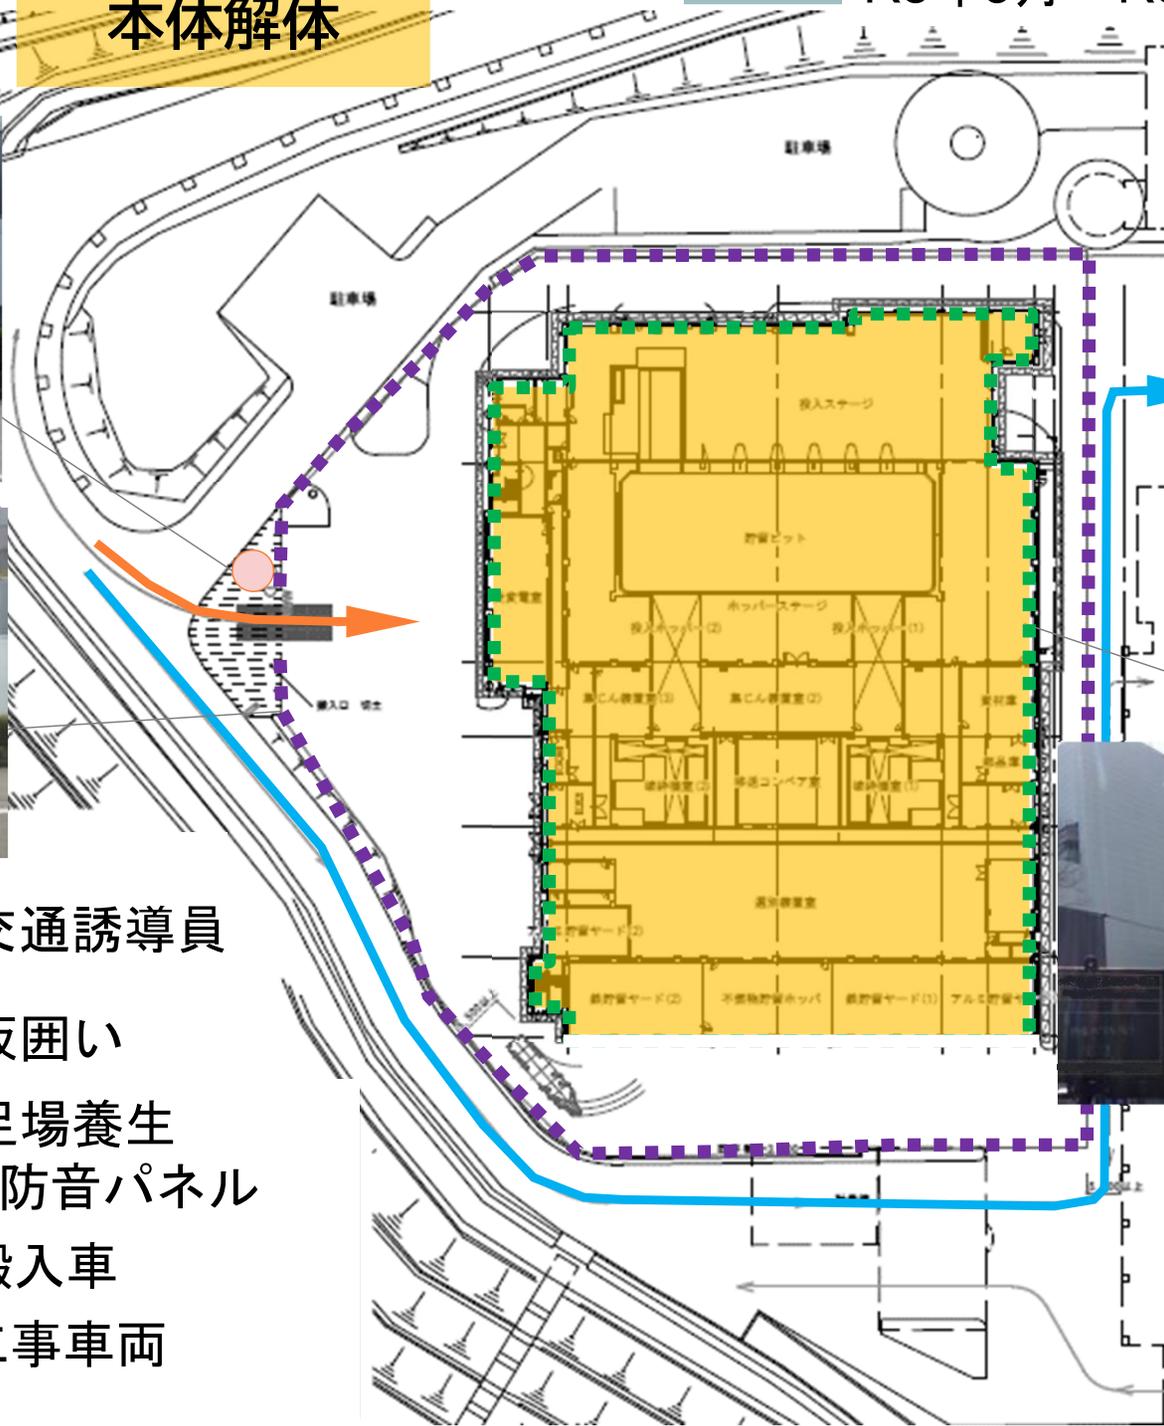

- 交通誘導員
- 仮囲い
- 足場養生+防音パネル
- 搬入車
- 工事車両



# 工事作業日・作業時間について

①作業日：平日（月～金）

土曜・日曜・祝日は原則、作業は行いません。

②作業時間原則 8：30～18：00（12：00～13：00休憩時間）

音・振動・ほこりの出る作業は8：30～17：00まで、  
17：00～18：00は音の出ない作業、片付け作業とします。

③工事関係車両の駐車場は現場敷地内に確保します。



④大型車両の搬出入 9：00～17：00（搬出入時は誘導員配置）

朝の出勤・登校時を避けます。

⑤緊急対策等（台風、強風、悪天候など）は時間外、平日外  
作業となる場合 がございます。ご了承お願いします。


# 工事に伴う安全対策 (現場周辺への配慮)

- **飛散防止対策**として、高さ3mの仮囲いにシートで**1.8m嵩上げ**を行います

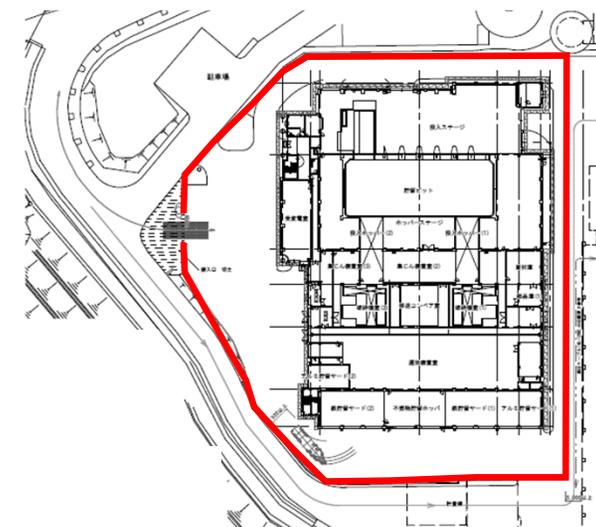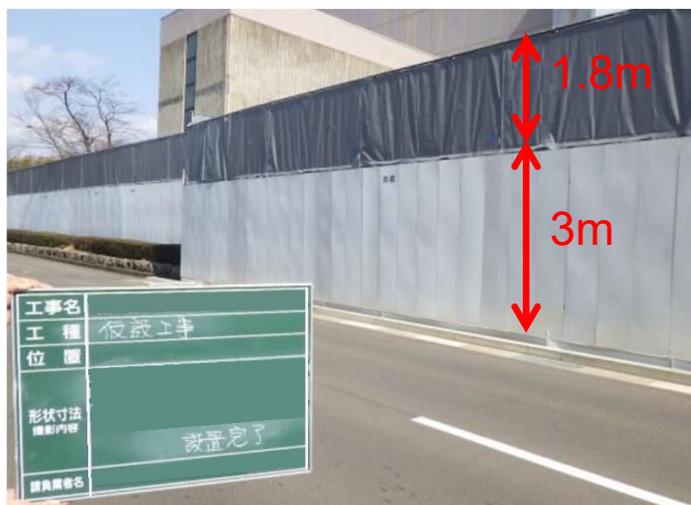

— 仮囲い(本体解体時)

- **常時誘導員を配置**し、車両搬出入時の安全確保を行います。

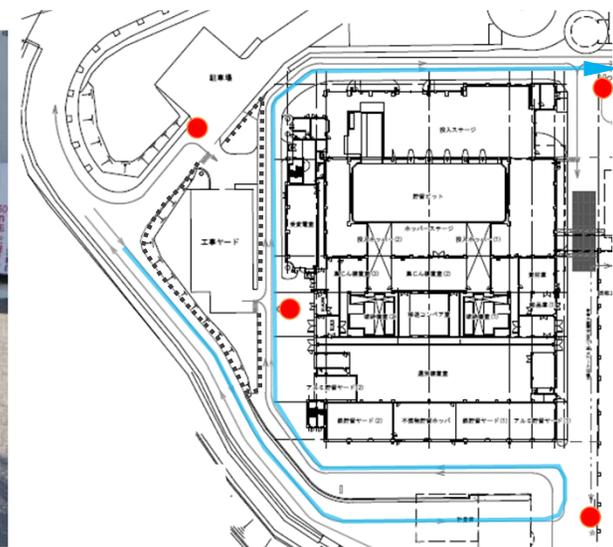


● 交通誘導員(渡り廊下解体時)

# 工事に伴う安全対策 (現場周辺への配慮)


- 解体建物を防音パネルで囲み、作業時の騒音低減、ほこり発生抑制を行います



- 工事車両出入口周辺、曲がり角付近の仮囲いはクリアフェンスを使用し、場内車両通行時の安全を確保します

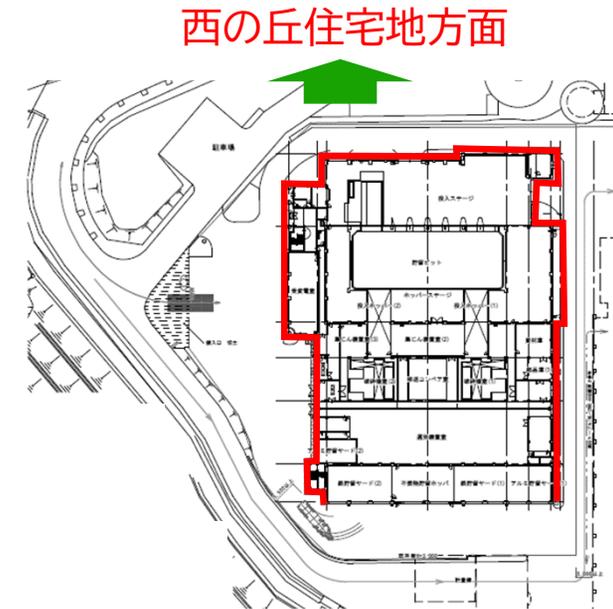

— 防音パネル

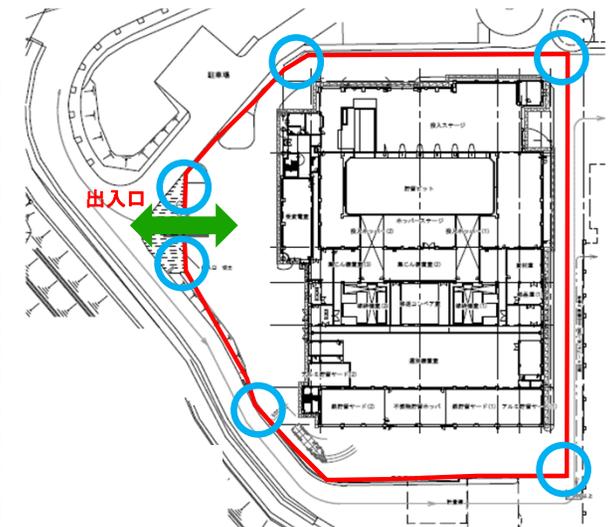

○ クリアフェンス設置箇所

# 工事に伴う安全対策 (現場周辺への配慮)

- 使用重機は低振動、低騒音のものを使用します



- 工事車両のタイヤ洗浄を徹底し、前面道路への汚れ対策を行います




# 工事に伴う安全対策 (現場周辺への配慮)

- コンクリート解体作業時は、  
適宜散水を行い、ほこり  
発生を抑制します



- 敷地外から見える箇所に  
騒音・振動計を掲示し、  
法令基準値※を遵守します

※騒音85dB、振動75dB以内

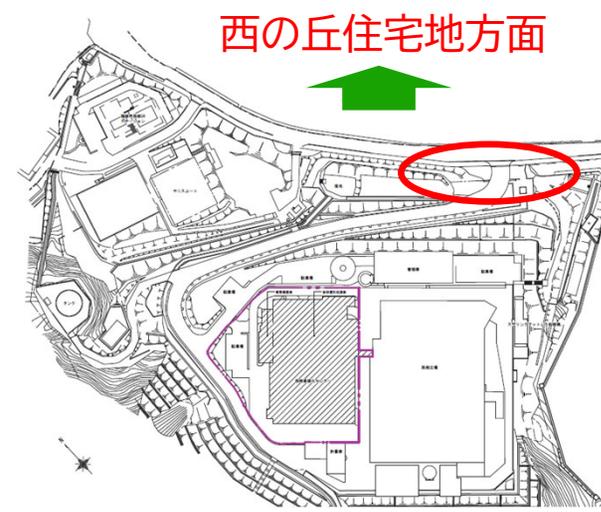

○ 騒音・振動計掲示(位置検討中)

