


新校舎建設工事の進捗状況について

【全体工程表】

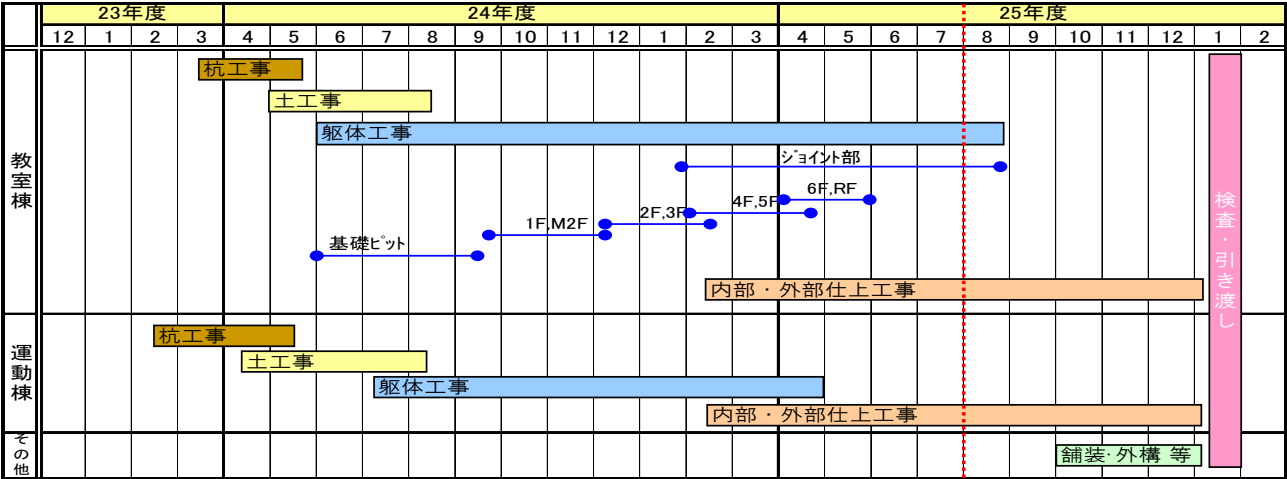

- 教室棟及び運動棟ともに、躯体工事を完了し、現在は、主に内装工事、外装工事を行っている。(全体工程の7割まで完了)
- 平成26年1月の竣工に向けて、工事は順調に進捗している。

【現在の工事状況】敷地全景（H25.7末）

■ 北側から撮影



■ 南西側から撮影



舞鶴小・中学校（仮称） 現場写真（平成25年7月31日撮影）



屋上



6階①



6階②



6階③



2階職員室①



2階職員室②



校庭①（西側）



校庭②（北側）



校庭③（東側）



校庭④（南側）



校庭⑤




校庭⑥




1 階（プール）



地下①（体育館・小学校）

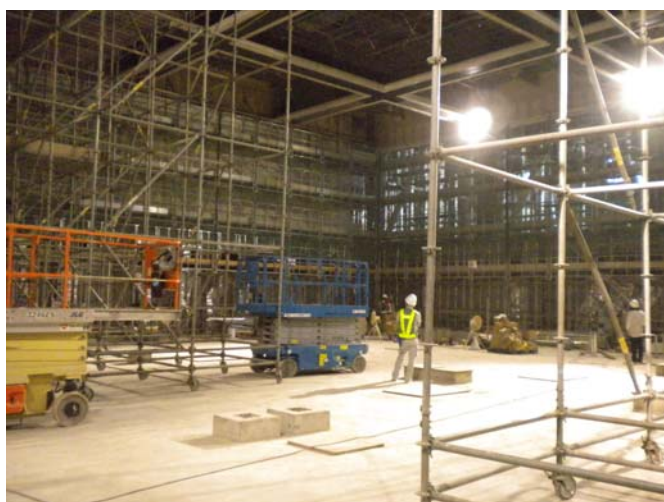

地下②（体育館・中学校）

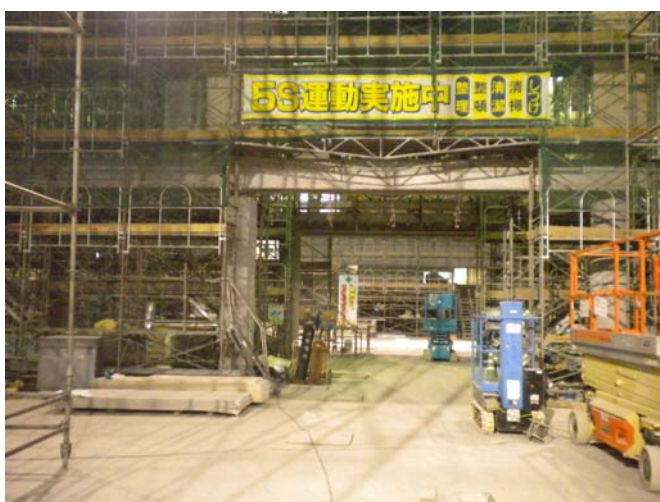

地下③（体育館）



1 階（公民館用駐車場）



1 階（駐車場）
