

社会資本総合整備計画 事後評価

計画 I : 福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現

計画 II-1 : 福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（防災・安全）

計画 II-2 : 福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（防災・安全）（重点）

計画 III : 福岡市における良好な水環境の創造

目次

資料 3－1	事後評価シート
資料 3－2	事後評価説明資料

令和 6 年 1 2 月
福岡市 道路下水道局
計画部 下水道企画課

社会資本総合整備計画 事後評価

福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現

事後評価シート

令和 6 年12月
福岡県福岡市

事後評価シート

様式 1

都道府県名	福岡県		市町村名		福岡市		計画名		福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現		
交付期間	令和元年度～令和5年度		事後評価実施時期		令和6年度		交付対象事業見込額		13,811百万円	国費率	50～55%
1) 事業の実施状況	計画に位置づけ実施した事業	基幹事業	事業名								
			No. 2 和白処理区 : アイランドシティ地区雨水管整備、アイランドシティ地区污水管整備、アイランドシティポンプ場増強、和白水処理センター汚泥処理増設 No. 3 東部処理区 : 夾雑物対策、下水道管渠汚泥処理場新設 No. 5 中部処理区 : 夾雑物対策、博多駅周辺地区分流化整備、天神周辺地区分流化整備、七隈第1污水幹線 No. 6 西部処理区 : 西部水処理センター汚泥処理増設、西部水処理センター水処理増設 No. 7 新西部処理区 : 新西部水処理センター汚泥処理増設 No. 8 全処理区 : 施設計画見直し等								
		関連事業	—								
		効果促進事業	分流化改造工事費助成								
	当初計画から削除した事業	基幹事業	事業名				削除／追加の理由		削除／追加による目標、指標、数値目標への影響		
			—				—		—		
		効果促進事業	—				—		—		
			新たに追加した事業	基幹事業	No. 2 和白処理区 : 和白水処理センター汚泥処理増設 No. 3 東部処理区 : 東部水処理センター水処理増設 No. 6 西部処理区 : 西部水処理センター水処理増設 No. 7 新西部処理区 : 新西部水処理センター水処理増設				下水道ビジョンに基づく下水道計画において、事業スケジュールの変更や調整、状況変化に応じ、当整備計画内で左記の事業の追加を行った。		—
	効果促進事業	—				—		—			
	交付期間の変更	当初	令和元年度～令和5年度		交付期間の変更による事業、指標、目標数値への影響				—		
変更		—									
2) 社会資本総合整備計画に記載した評価の指標（定量的指標）の実現状況	指標		単位	従前値	基準年度	目標値	目標年度	実績値	見込値	目標達成度	目標達成度○×の理由
	指標 1	下水道処理人口普及率	%	99.7	R元	99.7	R5	99.7	—	○	計画的な事業の実施によって目標を達成した。
	指標 2	合流式下水道改善率	%	99	R元	100	R5	100	—	○	計画的な事業の実施によって目標を達成した。

※指標改善への貢献度
○：評価値が目標値に達した場合
△：評価値が目標値には達していないものの、基準年度よりは改善していると認められる場合

事後評価シート

様式 1

都道府県名	福岡県	市町村名	福岡市	計画名	福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現		
交付期間	令和元年度～令和5年度	事後評価実施時期	令和6年度	交付対象事業見込額	13,811百万円	国費率	50～55%
3) 効果発現状況の整理	各指標の効果が得られた要因の整理 (成果と実施過程の関係性の整理)	・「指標1：下水道処理人口普及率」 本市の公共下水道普及率は目標値の99.7%となり、残り0.1%は未整備地区、0.2%は他事業（集落排水事業等）となっている。 下水道計画区域内人口の増加に加え、公共下水道の未整備地区について、アイランドシティ等のまちづくりに併せた污水管の整備を計画的に実施した結果、下水道普及率は目標値を達成した。 公共下水道の整備により、居住環境の改善や、適切な下水処理による公共用水域の水質保全・清らかな水環境の創造に寄与した。 ・「指標2：合流式下水道改善率」 博多駅周辺地区や天神周辺地区の分流化整備を進めるとともに、合流区域における夾雑物対策を実施することで、合流式下水道の改善率が向上し、公共用水域の水質保全等に寄与した。					
	検討体制の整理	・本市では、公共事業再評価等監視委員会による事業評価システムを導入し、事業内容の評価及び検証を行っており、当事業についても当委員会による審議を行うこととしている。 ・計画の策定と事業実施、事業管理を行う部署を区分し、チェック体制の強化及び適切な事業推進体制を構築している。					
4) 実施過程の検証	モニタリングの実施状況	・毎年指標の達成状況をモニタリングし、事業進捗との調整を行ってきた。					
	住民参加プロセスの実施状況	・市政だよりやホームページ、市民向け広報誌等によって、事業内容や財政状況等を積極的に発信している。 市民が参加できる身近なイベントとして、毎年「下水道フェア」を開催しており、夏休みには小学生とその保護者を対象とした「下水道たんけん隊」を水処理センターで開催している。 また、下水道部局による出前講座の開催（市民からの要望があれば随時開催）、「ほんブラザ（福岡市下水道博物館）」（ポンプ場施設の上部に下水道のPRコーナーや文化施設を併設）の活用等、多様な媒体による幅広い広報手段により、下水道事業の「見える化」を進めている。					
	持続的な事業推進体制の構築	・本市では、公共事業再評価等監視委員会による事業評価システムを導入し、事業内容の評価及び検証を行っており、当事業についても当委員会による審議を継続して行うこととしている。 ・事業実施と事業管理、計画の申請手続を行う部署を区分し、今後もチェック体制の強化及び適切な事業推進体制を維持する。					
	パブリックコメントでの意見	—					
5) 今後の方策	課題	—					
	今後の取組み方針	・アイランドシティのまちづくりの事業進捗に合わせて、計画的に下水道整備を実施していく。					
6) 次期計画への指標の継続性	次期計画の名称	福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（4期計画）					
	計画期間	令和6年度～令和10年度（5年間）					
	現在設定している指標	既に事業実施中のため、以下の指標を設定している。 ①公共下水道の供用を開始した面積					
	指標に対する検討事項	・下水道処理人口普及率は99.7%と概成しており、合流式下水道改善率は100%に達したため、次期計画では「公共下水道の供用を開始した面積」を指標として、引き続き管理を行っていく。					

要素事業と指標との関係

A. 基幹事業

番号	事業種別	事業及び施設種別	要素となる事業名 (事業個所)	事業内容	指標改善への貢献度	
					指標 1	指標 2
No. 1 西戸崎処理区						
A07-001	下水道	管渠 (合流)	西戸崎処理区夾雑物対策	3箇所		○
No. 2 和白処理区						
A07-002	下水道	管渠 (雨水)	アイランドシティ地区雨水管整備	L=3, 821m	○	
A07-003	下水道	管渠 (汚水)	アイランドシティ地区汚水管整備	L=6, 315m	○	
A07-005	下水道	ポンプ場	アイランドシティポンプ場増強	汚水ポンプ等	○	
A07-017	下水道	処理場	和白水処理センター汚泥処理増設	消化ガス発電設備等	○	
No. 3 東部処理区						
A07-004	下水道	管渠 (合流)	東部処理区夾雑物対策	2箇所		○
A07-006	下水道	処理場	下水道管渠汚泥処理場新設	処理能力 60m ³ /日	○	
A07-016	下水道	処理場	東部水処理センター水処理増設	汚水ポンプ設備等	○	
No. 4 南部処理区						
No. 5 中部処理区						
A07-007	下水道	管渠 (合流)	中部処理区夾雑物対策	41箇所		○
A07-008	下水道	管渠 (雨水)	博多駅周辺地区分流化整備(合流改善)	浸透側溝 L=2, 713m		○
A07-009	下水道	管渠 (雨水)	天神周辺地区分流化整備(合流改善)	浸透側溝 L=6, 960m		○
A07-010	下水道	管渠 (汚水)	七隈第1汚水幹線	L=440m	○	
A07-011	下水道	処理場	中部水処理センター汚泥処理増設	脱硫設備等	○	
No. 6 西部処理区						
A07-012	下水道	処理場	西部水処理センター汚泥処理増設	汚泥燃料化施設	○	
A07-013	下水道	処理場	西部水処理センター水処理増設	沈砂池設備等	○	
No. 7 新西部処理区						

A07-014	下水道	処理場	新西部水処理センター汚泥処理増設	重力濃縮設備等	○	
A07-018	下水道	処理場	新西部水処理センター水処理増設	沈砂池設備等	○	
No. 8 全処理区（下水道事業計画区域全体）						
A07-015	下水道		施設計画見直し等	調査・計画策定	○	

※指標改善への貢献度
○：指標への効果が見込まれる事業

C. 効果促進事業

様式 2

番号	事業種別	事業及び 施設種別	要素となる事業名 (事業個所)	事業内容	指標改善への貢献度	
					指標 1	指標 2
C07-001	下水道		分流化改造工事費助成	宅内分流化改造工事費助成		○
C07-002	下水道		生活保護世帯水洗化補助	生活保護世帯に対する助成	○	

※指標改善への貢献度

○：指標への効果が見込まれる事業

福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現

事業規模	基幹事業	効果促進事業	処理区別（基幹事業）							
			西戸崎処理区	和白処理区	東部処理区	南部処理区	中部処理区	西部処理区	新西部処理区	全処理区
事業実施数	14	1	0	4	2	0	4	2	1	1
整備計画の全事業数	18	2	1	4	3	0	5	2	2	1

主要施策	主な事業内容
未整備区域の解消	下水道未整備区域の管渠整備、水処理センターの増設、ポンプ場の増強を実施。 【主な事業】 ○アイランドシティ地区雨水・污水管整備 ○アイランドシティポンプ場増強 ○新西部水処理センター汚泥処理増設 など
合流式下水道の改善	合流式下水道の改善（分流化）を浸水対策と連携して進めており、博多駅周辺及び天神周辺地区で実施。 【主な事業】 ○博多駅周辺地区分流化整備 ○天神周辺地区分流化整備 など ◆分流化による合流式下水道の改善イメージ 対策前（合流式） 対策後（分流化）

博多駅周辺地区

天神周辺地区

事業実施期間

様式 4

A 1 下水道事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					備考
											R1	R2	R3	R4	R5	
No. 1 西戸崎処理区																
A07-001	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	合流	新設	西戸崎処理区夾雑物対策	3箇所	福岡市						
No. 2 和白処理区																
A07-002	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	アイランドシティ地区雨水管整備	L=3,821m	福岡市						
A07-003	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	汚水	新設	アイランドシティ地区汚水管整備	L=6,315m	福岡市						
A07-005	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	増設	アイランドシティポンプ場増強	汚水ポンプ等	福岡市						
A07-017	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	増設	和白水処理センター汚泥処理増設	消化ガス発電設備等	福岡市						
No. 3 東部処理区																
A07-004	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	合流	新設	東部処理区夾雑物対策	2箇所	福岡市						
A07-006	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	増設	下水道管渠汚泥処理場新設	処理能力 60m ³ /日	福岡市						
A07-016	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	増設	東部水処理センター水処理増設	汚水ポンプ設備等	福岡市						
No. 4 南部処理区																
No. 5 中部処理区																
A07-007	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	合流	新設	中部処理区夾雑物対策	41箇所	福岡市						
A07-008	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	博多駅周辺地区分流化整備(合流改善)	浸透側溝 L=2,713m	福岡市						
A07-009	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	天神周辺地区分流化整備(合流改善)	浸透側溝 L=6,960m	福岡市						
A07-010	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	汚水	新設	七隈第1汚水幹線	L=440m	福岡市						
A07-011	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	増設	中部水処理センター汚泥処理増設	脱硫設備等	福岡市						
No. 6 西部処理区																
A07-012	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	増設	西部水処理センター汚泥処理増設	汚泥燃料化施設	福岡市						
A07-013	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	増設	西部水処理センター水処理増設	沈砂池設備等	福岡市						
No. 7 新西部処理区																
A07-014	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	増設	新西部水処理センター汚泥処理増設	重力濃縮設備等	福岡市						
A07-018	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	増設	新西部水処理センター水処理増設	沈砂池設備等	福岡市						
No. 8 全処理区（下水道事業計画区域全体）																
A07-015	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市			施設計画見直し等	調査・計画策定	福岡市						
A 2 河川事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					備考
											R1	R2	R3	R4	R5	
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	市町村名	事業実施期間（年度）					備考
											R1	R2	R3	R4	R5	
C 効果促進事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	市町村名	事業実施期間（年度）					備考
											R1	R2	R3	R4	R5	
C07-001	下水道	一般	福岡市	間接	民間		分流化改造工事費助成	宅内分流化改造工事費助成	福岡市	福岡市						
C07-002	下水道	一般	福岡市	間接	民間		生活保護世帯水洗化補助	生活保護世帯に対する助成	福岡市	福岡市						

社会資本総合整備計画 事後評価

福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現
(防災・安全)

事後評価シート

令和6年12月
福岡県福岡市

事後評価シート

様式 1

都道府県名	福岡県	市町村名	福岡市	計画名	福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（防災・安全）		
交付期間	令和元年度～令和5年度	事後評価実施時期	令和6年度	交付対象事業見込額	78,308百万円	国費率	50～55%

1) 事業の実施状況	計画に位置づけ実施した事業	基幹事業	事業名									
			No. 1 西戸崎処理区：西戸崎水処理センター改築（水処理、汚泥処理）、志賀島ポンプ場改築、西戸崎ポンプ場耐震化 No. 2 和白処理区：和白水処理センター改築（水処理、汚泥処理）、ポンプ場改築（アイランドシティ、和白処理区）、和白水処理センター耐震化、和白処理区管渠耐震化 No. 3 東部処理区：東部水処理センター改築（水処理、汚泥処理）、東部処理区ポンプ場改築、ポンプ場耐震化（城浜、東浜第2、坂本町、宮松第2、宮松第3）、東部水処理センター耐震化、東部処理区管渠耐震化 No. 4 南部処理区：ポンプ場改築（月隈、南部処理区）、南部処理区管渠耐震化、東長尾第1雨水幹線改築 No. 5 中部処理区：中部水処理センター改築（水処理、汚泥処理）、ポンプ場改築（浜の町、梅光園、中部処理区）、中部水処理センター耐震化、ポンプ場耐震化（城西、浜の町、向島、田島、鳥飼第2、草ヶ江）、中部処理区管渠耐震化、天神幹線改築 No. 6 西部処理区：西部水処理センター改築（水処理、汚泥処理）、西部処理区ポンプ場改築、ポンプ場耐震化（姪の浜、原第1）、西部水処理センター耐震化、西部処理区管渠耐震化 No. 7 新西部処理区：新西部水処理センター汚泥処理改築、今宿ポンプ場改築 No. 8 全処理区：水処理センター耐震補強詳細検討、ポンプ場耐震補強詳細検討、下水道管渠内調査、施設設計見直し等									
			関連事業									
			効果促進事業									
			事業名				削除／追加の理由		削除／追加による目標、指標、数値目標への影響			
	当初計画から削除した事業		基幹事業		－				－		－	
			効果促進事業		－				－		－	
	新たに追加した事業		基幹事業		No. 3 東部処理区：ポンプ場耐震化（東浜第2、坂本町、宮松第2、宮松第3） No. 4 南部処理区：東長尾第1雨水幹線改築 No. 5 中部処理区：ポンプ場耐震化（鳥飼第2、草ヶ江） No. 6 西部処理区：原第1ポンプ場耐震化				下水道ビジョンに基づく下水道計画において、事業スケジュールの変更や調整、状況変化に応じ、当整備計画内で事業の追加を行った。		－	
		効果促進事業		－				－		－		
	交付期間の変更	当初		令和元年度～令和5年度		交付期間の変更による事業、指標、目標数値への影響			－			
変更		－										

2) 社会資本総合整備計画に記載した評価の指標（定量的指標）の実現状況	指標		単位	従前値	基準年度	目標値	目標年度	実績値	見込値	目標達成度	目標達成度○×の理由
	指標 1	重要な管渠の地震対策達成率	%	67	R1	86	R5	120	－	○	計画的な事業の実施によって目標を達成した。
	指標 2	重要な施設の地震対策達成率	%	0	R1	50	R5	50	－	○	計画的な事業の実施によって目標を達成した。
	指標 3	予防保全工事実施率	%	0	R1	100	R5	71	－	△	汚水ポンプ場及び水処理センターの老朽度調査の結果、想定よりも老朽化が進んでいなかったことから、改築時期を先送りしたため、目標値を下回っているが、引き続き、適切な時期に改築更新を実施していく。
	指標 4	50年経過管渠における改築更新実施率	%	0	R1	100	R5	100	－	○	計画的な事業の実施によって目標を達成した。

※指標改善への貢献度

○：評価値が目標値に達した場合

△：評価値が目標値には達していないものの、基準年度よりは改善していると認められる場合

事後評価シート

様式 1

都道府県名	福岡県	市町村名	福岡市	計画名	福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（防災・安全）		
交付期間	令和元年度～令和5年度	事後評価実施時期	令和6年度	交付対象事業見込額	78,308百万円	国費率	50～55%

3) 効果発現状況の整理	各指標の効果が得られた要因の整理 (成果と実施過程の関係性の整理)	「指標1：重要な管渠の地震対策達成率」 下水道施設としての機能や防災上の観点を踏まえ、優先的に実施していく管渠を「重要な管渠」として抽出し、計画的な耐震診断や耐震化を実施したため、実施率は目標値を達成した。耐震化により、被災時にも下水道の流下機能が確保され、安定した排水が可能となり、生活環境の向上や市民の安全・安心の確保に寄与した。 「指標2：重要な施設の地震対策達成率」 下水道の根幹となる水処理センターやポンプ場のうち、常駐施設の人命保護を最優先として建築構造物から計画的に耐震化を実施し、対策が順調進んだことで実施率は目標値を達成した。耐震化の進捗により、生活環境の向上や市民の安全・安心の確保に寄与した。 「指標3：予防保全工事実施率」 改築が必要な施設については、計画的に改築工事を実施し、市民の安全・安心の確保に寄与した。 「指標4：50年経過管渠における改築更新実施率」 計画的な改築更新により、実施率は目標値を達成し、市民の安全・安心の確保に寄与した。引き続き、実施率を計画的に引き上げていけるよう事業を推進していく。
	検討体制の整理	- 本市では、公共事業再評価等監視委員会による事業評価システムを既に導入し、事業内容の評価及び検証を行っており、当事業についても当委員会による審議を行うこととしている。 - 計画の策定と事業実施、事業管理を行う部署を区分し、チェック体制の強化及び適切な事業推進体制を構築している。
4) 実施過程の検証	モニタリングの実施状況	毎年指標の達成状況をモニタリングし、事業進捗との調整を行ってきた。
	住民参加プロセスの実施状況	- 市政だよりやホームページ、市民向け広報誌等によって、事業内容や財政状況等を積極的に発信している。 - 市民が参加できる身近なイベントとして、毎年「下水道フェア」を開催しており、夏休みには小学生とその保護者を対象とした「下水道たんけん隊」を水処理センターで開催している。 - また、下水道部局による出前講座の開催（市民からの要望があれば随時開催）、「ぼんブラザ（福岡市下水道博物館）」（ポンプ場施設の上部に下水道のPRコーナーや文化施設を併設）の活用等、多様な媒体による幅広い広報手段で下水道事業の「見える化」を進めている。
	持続的な事業推進体制の構築	- 本市では、公共事業再評価等監視委員会による事業評価システムを導入し、事業内容の評価及び検証を行っており、当事業についても当委員会による審議を継続して行うこととしている。 - 事業実施と事業管理、計画の申請手続を行う部署を区分し、今後もチェック体制の強化及び適切な事業推進体制を維持する。
	パブリックコメントでの意見	—
5) 今後の方策	課題	今後も都心部での工事となり、現場条件の厳しい施工環境のもと実施するため、事業進捗への影響の可能性がある。
	今後の取組み方針	- 事業進捗管理を更に強化し、事業の進捗に遅れが生じた事業がある場合は、要因を分析し、早期完了を目指す。 - 今後も事業に対する市民の理解と協力が得られるように、公共機関の連携や市民との対話機会を増やすなどの取組みを行う。
6) 次期計画への指標の継続性	次期計画の名称	福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（防災・安全）（4期計画）
	計画期間	令和6年度～令和10年度（5年間）
	現在設定している指標	既に事業実施中のため、以下の指標を設定している。 ①重要な管渠の地震対策達成率 ②予防保全工事実施率
	指標に対する検討事項	「重要な管渠の地震対策達成率」及び「予防保全工事実施率」については、引き続き指標として設定する。 「重要な施設の地震対策達成率」については、「福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（防災・安全）（重点計画）」において設定する。

要素事業と指標との関係

様式 2

A. 基幹事業

番号	事業種別	事業及び施設種別	要素となる事業名 (事業個所)	事業内容	指標改善への貢献度			
					指標 1	指標 2	指標 3	指標 4
A-1下水道事業								
No. 1 西戸崎処理区								
A07-001	下水道	処理場	西戸崎水処理センター水処理改築	中央監視制御設備等			○	
A07-002	下水道	処理場	西戸崎水処理センター汚泥処理改築	ガスタンク等			○	
A07-003	下水道	ポンプ場	西戸崎ポンプ場	監視制御設備等			○	
A07-004	下水道	ポンプ場	志賀島ポンプ場	監視制御設備等			○	
A07-005	下水道	ポンプ場	西戸崎処理区ポンプ場改築	自動除塵機等			○	
A07-006	下水道	ポンプ場	西戸崎ポンプ場	耐震化		○		
A07-007	下水道	ポンプ場	志賀島ポンプ場	耐震化		○		
A07-008	下水道	汚水	西戸崎処理区下水道管渠耐震化	L = 5, 583m	○			
No. 2 和白処理区								
A07-009	下水道	処理場	和白水処理センター水処理改築	送風機等			○	
A07-010	下水道	処理場	和白水処理センター汚泥処理改築	消化設備等			○	
A07-011	下水道	ポンプ場	アイランドシティポンプ場	汚水ポンプ等			○	
A07-012	下水道	ポンプ場	和白処理区ポンプ場改築	自動除塵機等			○	
A07-013	下水道	処理場	和白水処理センター	耐震化		○		
A07-014	下水道	汚水	和白処理区下水道管渠耐震化	L = 2, 873m	○			

※指標改善への貢献度

○：指標への効果が見込まれる事業

要素事業と指標との関係

A. 基幹事業

番号	事業種別	事業及び施設種別	要素となる事業名 (事業個所)	事業内容	指標改善への貢献度			
					指標 1	指標 2	指標 3	指標 4
No. 3 東部処理区								
A07-015	下水道	処理場	東部水処理センター水処理改築	生物反応槽設備等			○	
A07-016	下水道	処理場	東部水処理センター汚泥処理改築	焼却設備等			○	
A07-017	下水道	ポンプ場	東部処理区ポンプ場改築	自動除塵機等			○	
A07-018	下水道	ポンプ場	堅粕第 1 ポンプ場	耐震化		○		
A07-019	下水道	ポンプ場	堅粕第 3 ポンプ場	耐震化		○		
A07-020	下水道	ポンプ場	城浜ポンプ場	耐震化		○		
A07-021	下水道	ポンプ場	米田ポンプ場	耐震化		○		
A07-022	下水道	処理場	東部水処理センター	耐震化		○		
A07-023	下水道	汚水	東部処理区下水道管渠耐震化	L = 17, 163m	○			
A07-059	下水道	ポンプ場	原田ポンプ場	耐震化		○		
A07-060	下水道	ポンプ場	筥松第 1 ポンプ場	耐震化		○		
A07-061	下水道	ポンプ場	香椎浜ポンプ場	耐震化		○		
A07-062	下水道	ポンプ場	東浜第 2 ポンプ場	耐震化		○		
A07-064	下水道	ポンプ場	筥松第 4 ポンプ場	耐震化		○		
A07-066	下水道	ポンプ場	坂本町ポンプ場	耐震化		○		
A07-067	下水道	ポンプ場	筥松第 2 ポンプ場	耐震化		○		
A07-068	下水道	ポンプ場	筥松第 3 ポンプ場	耐震化		○		
No. 4 南部処理区								
A07-024	下水道	ポンプ場	月隈ポンプ場	電気設備等			○	
A07-025	下水道	ポンプ場	南部処理区ポンプ場改築	自動除塵機等			○	
A07-026	下水道	ポンプ場	月隈ポンプ場	耐震化		○		
A07-027	下水道	汚水	南部処理区下水道管渠耐震化	L = 17, 805m	○			
A07-071	下水道	雨水	東長尾第 1 雨水幹線	L = 200m				○

※指標改善への貢献度

○ : 指標への効果が見込まれる事業

要素事業と指標との関係

様式 2

A. 基幹事業

番号	事業種別	事業及び施設種別	要素となる事業名 (事業個所)	事業内容	指標改善への貢献度			
					指標 1	指標 2	指標 3	指標 4
No. 5 中部処理区								
A07-028	下水道	処理場	中部水処理センター水処理改築	送風機等			○	
A07-029	下水道	処理場	中部水処理センター汚泥処理改築	脱水機設備等			○	
A07-030	下水道	ポンプ場	沖浜ポンプ場	汚水ポンプ等			○	
A07-031	下水道	ポンプ場	築地町ポンプ場	汚水ポンプ等			○	
A07-032	下水道	ポンプ場	浜の町ポンプ場	汚水ポンプ等			○	
A07-033	下水道	ポンプ場	藤崎ポンプ場	汚水ポンプ等			○	
A07-034	下水道	ポンプ場	梅光園ポンプ場	汚水ポンプ等			○	
A07-035	下水道	ポンプ場	中部処理区ポンプ場等改築	自動除塵機等			○	
A07-036	下水道	処理場	中部水処理センター	耐震化		○		
A07-037	下水道	ポンプ場	城西ポンプ場	耐震化		○		
A07-038	下水道	ポンプ場	浜の町ポンプ場	耐震化		○		
A07-039	下水道	ポンプ場	向島ポンプ場	耐震化		○		
A07-040	下水道	ポンプ場	田島ポンプ場	耐震化		○		
A07-041	下水道	合流	中部処理区下水道管渠耐震化	L＝36,537m	○			
A07-042	下水道	合流	天神幹線	L＝300m				○
A07-069	下水道	ポンプ場	鳥飼第2ポンプ場	耐震化		○		
A07-070	下水道	ポンプ場	草ヶ江ポンプ場	耐震化		○		

※指標改善への貢献度

○：指標への効果が見込まれる事業

要素事業と指標との関係

A. 基幹事業

番号	事業種別	事業及び施設種別	要素となる事業名 (事業個所)	事業内容	指標改善への貢献度			
					指標 1	指標 2	指標 3	指標 4
No. 6 西部処理区								
A07-043	下水道	処理場	西部水処理センター水処理改築	送風機等			○	
A07-044	下水道	処理場	西部水処理センター汚泥処理改築	脱水機設備等			○	
A07-045	下水道	ポンプ場	能古ポンプ場	監視制御設備等			○	
A07-046	下水道	ポンプ場	西部処理区ポンプ場改築	自動除塵機等			○	
A07-047	下水道	ポンプ場	姪の浜ポンプ場	耐震化		○		
A07-048	下水道	処理場	西部水処理センター	耐震化		○		
A07-049	下水道	汚水	西部処理区下水道管渠耐震化	L = 23,438m	○			
A07-063	下水道	ポンプ場	飛石町ポンプ場	耐震化		○		
A07-065	下水道	ポンプ場	原第 1 ポンプ場	耐震化		○		
No. 7 新西部処理区								
A07-050	下水道	処理場	新西部水処理センター水処理改築	汚水ポンプ等			○	
A07-051	下水道	処理場	新西部水処理センター汚泥処理改築	汚泥貯留設備等			○	
A07-052	下水道	ポンプ場	今宿ポンプ場	汚水ポンプ等			○	
A07-053	下水道	ポンプ場	新西部処理区ポンプ場改築	自動除塵機等			○	
A07-054	下水道	汚水	新西部処理区下水道管渠耐震化	L = 3,749m	○			
No. 8 全処理区（下水道事業計画区域全体）								
A07-055	下水道	処理場	水処理センター耐震補強詳細検討	調査・計画策定		○		
A07-056	下水道	ポンプ場	ポンプ場耐震補強詳細検討	調査・計画策定		○		
A07-057	下水道	－	下水道管渠内調査	T Vカメラ調査等				○
A07-058	下水道	－	施設設計見直し等	調査・計画策定	○	○	○	○

※指標改善への貢献度

○：指標への効果が見込まれる事業

要素事業と指標との関係

様式 2

C. 効果促進事業

番号	事業種別	事業及び 施設種別	要素となる事業名 (事業個所)	事業内容	指標改善への貢献度			
					指標 1	指標 2	指標 3	指標 4
C07-001	下水道	—	下水道業務継続計画策定	計画策定	○	○	○	○

※指標改善への貢献度
○：指標への効果が見込まれる事業

福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（防災・安全）

事業規模	基幹事業	効果促進事業	処理区別							
			西戸崎処理区	和白処理区	東部処理区	南部処理区	中部処理区	西部処理区	新西部処理区	全処理区
事業実施数	51	1	4	6	10	4	14	7	2	4
整備計画の全事業数	71	1	8	6	17	5	17	9	5	4

主要施策	主な事業内容
地震対策	地震時における最低限の下水道機能を確保するため、緊急輸送路下などの重要な幹線管渠等や、ポンプ場、水処理センターの耐震化を実施。 ◆下水道管渠の耐震化の例 施行前  施行後（管更生）  【主な事業】 ○和白唐の原污水幹線 ○塩原老司雨水幹線 ○西新第1雨水幹線 ○ポンプ場耐震化 ○和白、東部、中部、西部水処理センター耐震化 など

福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（防災・安全）

主要施策	事業内容
改築更新	下水道の役割を適切に果たし、市民の暮らしを支え続けるため、老朽化が進行する下水道施設の改築更新を計画的に実施。 ◆下水道施設（処理場）の改築更新の例 施行前（汚泥脱水設備）  施行後（汚泥脱水設備）  ○天神幹線 ○汚水ポンプ場改築 ○西戸崎、和白、東部、中部、西部、新西部水処理センター改築 など

事業実施期間

様式 4

A 1 下水道事業																				
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工程	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					備考				
											R1	R2	R3	R4	R5					
No. 1 西戸崎処理区																				
A07-001	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	改築	西戸崎水処理センター水処理改築	中央監視制御設備等	福岡市										
A07-002	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	改築	西戸崎水処理センター汚泥処理改築	ガスタンク等	福岡市										
A07-003	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	西戸崎ポンプ場	監視制御設備等	福岡市										
A07-004	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	志賀島ポンプ場	監視制御設備等	福岡市										
A07-005	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	西戸崎処理区ポンプ場改築	自動除塵機等	福岡市										
A07-006	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	西戸崎ポンプ場	耐震化	福岡市										
A07-007	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	志賀島ポンプ場	耐震化	福岡市										
A07-008	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	汚水	改築	西戸崎処理区下水道管渠耐震化	L = 5, 583m	福岡市										
No. 2 和白処理区																				
A07-009	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	改築	和白水処理センター水処理改築	送風機等	福岡市										
A07-010	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	改築	和白水処理センター汚泥処理改築	消化設備等	福岡市										
A07-011	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	アイランドシティポンプ場	汚水ポンプ等	福岡市										
A07-012	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	和白処理区ポンプ場改築	自動除塵機等	福岡市										
A07-013	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	改築	和白水処理センター	耐震化	福岡市										
A07-014	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	汚水	改築	和白処理区下水道管渠耐震化	L = 2, 873m	福岡市										
No. 3 東部処理区																				
A07-015	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	改築	東部水処理センター水処理改築	生物反応槽設備等	福岡市										
A07-016	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	改築	東部水処理センター汚泥処理改築	焼却設備等	福岡市										
A07-017	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	東部処理区ポンプ場改築	自動除塵機等	福岡市										
A07-018	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	堅粕第 1 ポンプ場	耐震化	福岡市										
A07-019	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	堅粕第 3 ポンプ場	耐震化	福岡市										
A07-020	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	城浜ポンプ場	耐震化	福岡市										
A07-021	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	米田ポンプ場	耐震化	福岡市										
A07-022	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	改築	東部水処理センター	耐震化	福岡市										
A07-023	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	汚水	改築	東部処理区下水道管渠耐震化	L = 17, 163m	福岡市										
A07-059	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	原田ポンプ場	耐震化	福岡市										
A07-060	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	筥松第 1 ポンプ場	耐震化	福岡市										
A07-061	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	香椎浜ポンプ場	耐震化	福岡市										
A07-062	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	東浜第 2 ポンプ場	耐震化	福岡市										
A07-064	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	筥松第 4 ポンプ場	耐震化	福岡市										
A07-066	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	坂本町ポンプ場	耐震化	福岡市										
A07-067	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築													

事業実施期間

様式 4

A 1 下水道事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					備考
											R1	R2	R3	R4	R5	
No. 6 西部処理区																
A07-043	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	改築	西部水処理センター水処理改築	送風機等	福岡市						
A07-044	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	改築	西部水処理センター汚泥処理改築	脱水機設備等	福岡市						
A07-045	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	能古ポンプ場	監視制御設備等	福岡市						
A07-046	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	西部処理区ポンプ場改築	自動除塵機等	福岡市						
A07-047	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	姪の浜ポンプ場	耐震化	福岡市						
A07-048	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	改築	西部水処理センター	耐震化	福岡市						
A07-049	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	汚水	改築	西部処理区下水道管渠耐震化	L＝23.438m	福岡市						
A07-063	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	飛石町ポンプ場	耐震化	福岡市						
A07-065	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	原第1ポンプ場	耐震化	福岡市						
No. 7 新西部処理区																
A07-050	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	改築	新西部水処理センター水処理改築	汚水ポンプ等	福岡市						
A07-051	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	改築	新西部水処理センター汚泥処理改築	汚泥貯留設備等	福岡市						
A07-052	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	今宿ポンプ場	汚水ポンプ等	福岡市						
A07-053	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	新西部処理区ポンプ場改築	自動除塵機等	福岡市						
A07-054	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	汚水	改築	新西部処理区下水道管渠耐震化	L＝3.749m	福岡市						
No. 8 全処理区（下水道事業計画区域全体）																
A07-055	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	改築	水処理センター耐震補強詳細検討	調査・計画策定	福岡市						
A07-056	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	ポンプ場耐震補強詳細検討	調査・計画策定	福岡市						
A07-057	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	－	－	下水道管渠内調査	T Vカメラ調査等	福岡市						
A07-058	下水道	一般	福岡市	間接	民間	－	－	施設設計見直し等	調査・計画策定	福岡市						
A 2 河川事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					備考
											R1	R2	R3	R4	R5	
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					備考	
										R1	R2	R3	R4	R5		
C 効果促進事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					備考	
										R1	R2	R3	R4	R5		
C07-001	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	－	下水道業務継続計画策定	計画策定	福岡市							

社会資本総合整備計画 事後評価

福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現
(防災・安全) (重点計画)

事後評価シート

令和6年12月
福岡県福岡市

事後評価シート

様式 1

都道府県名	福岡県	市町村名	福岡市	計画名	福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（防災・安全）（重点計画）		
交付期間	令和元年度～令和5年度	事後評価実施時期	令和6年度	交付対象事業見込額	26,832百万円	国費率	50%

1) 事業の実施状況	計画に位置づけ実施した事業	基幹事業	事業名										
			No. 2 和白処理区 : 雨水管整備（唐の原第1雨水幹線、唐の原第3雨水幹線、唐の原第7雨水幹線、和白丘地区）、ポンプ場改築（塩浜、奈多第1） No. 3 東部処理区 : 雨水管整備（松田地区、松島地区、筥松地区）、東部水処理センター改築、ポンプ場改築（城浜、松崎第1、筥松第1、筥松第2、堅粕第1、堅粕第3、原田、坂本町、筥松第3） No. 4 南部処理区 : 三宅ポンプ場新設、雨水管整備（金隈地区、柳河内地区） No. 5 中部処理区 : 雨水管整備（天神外地区準幹線、大楠地区）、ポンプ場改築（博多駅東、城西第2、菰川、藤崎） No. 6 西部処理区 : 雨水管整備（田村地区、姪浜地区、友丘地区、苅岐東地区雨水幹線）、ポンプ場改築（飛石町、姪の浜、原第2） No. 7 新西部処理区 : 雨水管整備（元岡第4雨水幹線、周船寺第1雨水幹線） No. 8 全処理区 : 施設計画見直し等、雨水流出抑制施設助成										
			—										
	関連事業	—											
	効果促進事業	No. 6 西部処理区 : 雨水・水位情報システムの構築、内水ハザードマップの作成、排水設備の設置促進											
	当初計画から削除した事業	基幹事業	事業名						削除／追加の理由		削除／追加による目標、指標、数値目標への影響		
			—						—		—		
		効果促進事業	—						—		—		
			基幹事業	No. 3 東部処理区 : 筥松地区雨水管整備、ポンプ場改築（原田、坂本町、筥松第3、米田、東浜第2） No. 4 南部処理区 : 那珂地区雨水幹線整備 No. 5 中部処理区 : ポンプ場改築（藤崎、博多駅北） No. 6 西部処理区 : 苅岐東地区雨水幹線整備、ポンプ場改築（原第1、原第2、弁天町）						下水道ビジョンに基づく下水道計画において、事業スケジュールの変更や調整、状況変化に応じ、当整備計画内で事業の追加を行った。		—	
				効果促進事業	No. 5 中部処理区 : 雨水・水位情報システムの構築、内水ハザードマップの作成、排水設備の設置促進						—		—
交付期間の変更	当初	令和元年度～令和5年度			交付期間の変更による事業、指標、目標数値への影響				—				
	変更	—											
2) 社会資本総合整備計画に記載した評価の指標（定量的指標）の実現状況	指標		単位	従前値	基準年度	目標値	目標年度	実績値	見込値	目標達成度	目標達成度○×の理由		
	指標 1	下水道による浸水対策実施率	%	51.1	R1	53.0	R5	52.2	—	△	田村地区雨水管整備等において、地元調整や立坑用地選定に時間を要したこと等により完了時期が遅れたため、目標値を下回っているが、引き続き、早期完了に向けて事業を推進していく。		
	指標 2	浸水防除機能が確保される面積率	%	22.9	R1	100	R5	71.3	—	△	雨水ポンプ場の改築更新において、劣化が想定よりも進んでいなかったことから、改築時期を先送りしたため、値は向上したが、未達成となった。		

※指標改善への貢献度
○：評価値が目標値に達した場合
△：評価値が目標値には達していないものの、基準年度よりは改善していると認められる場合

事後評価シート

様式 1

都道府県名	福岡県	市町村名	福岡市	計画名	福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（防災・安全）（重点計画）		
交付期間	令和元年度～令和5年度	事後評価実施時期	令和6年度	交付対象事業見込額	26,832百万円	国費率	50%

3) 効果発現状況の整理	各指標の効果が得られた要因の整理 (成果と実施過程の関係性の整理)	「指標1：下水道による浸水対策実施率」 「レインボープラン天神」「雨水整備D.O.プラン」により、浸水安全度は着実に向上している。 令和5年度の市政アンケート調査（回答数：537件）によると、81%がこれまで実施してきた浸水対策に満足しており、市民の安全・安心の確保に寄与した。 「指標2：浸水防除機能が確保される面積率」 改築が必要な施設については、計画的に改築工事を実施し、市民の安全・安心の確保に寄与した。
	検討体制の整理	- 本市では、公共事業再評価等監視委員会による事業評価システムを既に導入し、事業内容の評価及び検証を行っており、当事業についても当委員会による審議を行うこととしている。 - 計画の策定と事業実施、事業管理を行う部署を区分し、チェック体制の強化及び適切な事業推進体制を構築している。
4) 実施過程の検証	モニタリングの実施状況	- 毎年指標の達成状況をモニタリングし、事業進捗との調整を行ってきた。 - 浸水対策事業は、大規模な工事を伴うことから、事業の実施途中における進捗の改善が難しい部分がある。
	住民参加プロセスの実施状況	- 市政だよりやホームページ、市民向け広報紙等によって、事業内容や財政状況等を積極的に発信している。 - 市民が参加できる身近なイベントとして、毎年「下水道フェア」を開催しており、夏休みには小学生とその保護者を対象とした「下水道たんけん隊」を水処理センターで開催している。 - また、下水道部局による出前講座の開催（市民からの要望があれば随時開催）、「ぼんブラザ（福岡市下水道博物館）」（ポンプ場施設の上部に下水道のPRコーナーや文化施設を併設）の活用等、多様な媒体による幅広い広報手段により、下水道事業の「見える化」を進めている。
	持続的な事業推進体制の構築	- 本市では、公共事業再評価等監視委員会による事業評価システムを導入し、事業内容の評価及び検証を行っており、当事業についても当委員会による審議を継続して行うこととしている。 - 事業実施と事業管理、計画の申請手続を行う部署を区分し、今後もチェック体制の強化及び適切な事業推進体制を維持する。
	パブリックコメントでの意見	—
5) 今後の方策	課題	今後も都心部での工事となり、現場条件の厳しい施工環境のもと実施するため、事業の遅延等が発生する恐れがある。
	今後の取り組み方針	事業進捗管理を更に強化し、事業の進捗に遅れが生じた事業がある場合は、要因を分析し、早期完了を目指す。
6) 次期計画への指標の継続性	次期計画の名称	福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（防災・安全）（重点計画）（4期計画）
	計画期間	令和6年度～令和10年度（5年間）
	現在設定している指標	既に事業実施中のため、以下の指標を設定している。 ①下水道による浸水対策実施率 ②浸水防除機能が確保される面積率 ③地震時下水排除機能が確保される面積率 ④省エネ設備導入等によるエネルギー削減率
	指標に対する検討事項	「下水道による浸水対策実施率」及び「浸水防除機能が確保される面積率」については、引き続き指標として設定する。 「地震時下水排除機能が確保される面積率」については、次期計画から（防災・安全）（重点計画）の指標として設定する。 ※令和元年度～令和5年度（防災・安全）において設定していた「重要な施設の地震対策達成率」を「望ましい目標例（国土交通省事務連絡）」に準じて設定したもの。 「省エネ設備導入等によるエネルギー削減率」については、次期計画から（防災・安全）（重点計画）の指標として設定する。 ※令和元年度～令和5年度は（防災・安全）において設定していた「予防保全工事実施率」のうち、省エネ事業についての指標を新たに設定したもの。

要素事業と指標との関係

A. 基幹事業

番号	事業種別	事業及び施設種別	要素となる事業名 （事業個所）	事業内容	指標改善への貢献度	
					指標 1	指標 2
No. 1 西戸崎処理区						
A07-051	下水道	ポンプ場	大岳ポンプ場	監視抑制御設備等		○
No. 2 和白崎処理区						
A07-001	下水道	雨水	唐の原第 1 雨水幹線	L＝270m	○	
A07-002	下水道	雨水	唐の原第 3 雨水幹線	L＝290m	○	
A07-003	下水道	雨水	唐の原第 7 雨水幹線	L＝30m	○	
A07-004	下水道	雨水	和白丘地区雨水管整備	L＝250m	○	
A07-052	下水道	ポンプ場	塩浜ポンプ場	監視抑制御設備等		○
A07-053	下水道	ポンプ場	奈多第 1 ポンプ場	監視抑制御設備等		○
No. 3 東部処理区						
A07-005	下水道	雨水	松田地区雨水管整備	L＝290m	○	
A07-006	下水道	雨水	原田（2）地区雨水管整備	L＝750m	○	
A07-007	下水道	雨水	松島地区雨水管整備	L＝340m	○	
A07-008	下水道	雨水	原田（1）地区雨水管整備	L＝460m	○	
A07-009	下水道	雨水	吉塚地区雨水管整備	L＝210m	○	
A07-010	下水道	雨水	千代地区雨水管整備	L＝550m	○	
A07-011	下水道	雨水	堅粕地区雨水管整備	L＝170m	○	
A07-012	下水道	雨水	東比恵地区雨水管整備	L＝800m	○	
A07-054	下水道	処理場	東部水処理センター	非常用発電設備		○
A07-055	下水道	ポンプ場	城浜ポンプ場	監視抑制御設備等		○
A07-056	下水道	ポンプ場	松崎第 1 ポンプ場	発電機設備等		○
A07-057	下水道	ポンプ場	津屋ポンプ場	監視抑制御設備等		○
A07-058	下水道	ポンプ場	筥松第 1 ポンプ場	非常用発電設備		○
A07-059	下水道	ポンプ場	筥松第 2 ポンプ場	監視抑制御設備等		○

A07-060	下水道	ポンプ場	堅粕第1ポンプ場	監視抑制御設備等		○
A07-061	下水道	ポンプ場	堅粕第3ポンプ場	監視抑制御設備等		○
A07-076	下水道	雨水	筥松地区雨水管整備	L=500m	○	
A07-078	下水道	ポンプ場	原田ポンプ場	屋上防水等		○
A07-079	下水道	ポンプ場	坂本町ポンプ場	防食等		○
A07-082	下水道	ポンプ場	筥松第3ポンプ場	屋上防水等		○
A07-083	下水道	ポンプ場	米田ポンプ場	監視抑制御設備等		○
A07-084	下水道	ポンプ場	東浜第2ポンプ場	電気設備等		○
No. 4 南部処理区						
A07-013	下水道	ポンプ場	三宅ポンプ場新設	雨水 6.1m ³ /s	○	
A07-014	下水道	雨水	東月隈地区雨水管整備	L=142m	○	
A07-015	下水道	雨水	西月隈地区雨水管整備	L=1,180m	○	
A07-016	下水道	雨水	金隈地区雨水管整備	L=1,330m	○	
A07-017	下水道	雨水	井相田地区雨水管整備	L=190m	○	
A07-018	下水道	雨水	横手地区雨水管整備	L=150m	○	
A07-019	下水道	雨水	柳河内地区雨水管整備	L=40m	○	
A07-020	下水道	雨水	花畑地区雨水管整備	L=160m	○	
A07-021	下水道	雨水	老司地区雨水管整備	L=115m	○	
A07-075	下水道	雨水	那珂地区雨水幹線整備	L=360m	○	
No. 5 中部処理区						
A07-022	下水道	雨水	中部5号幹線	L=75m	○	
A07-023	下水道	雨水	中部6・8号幹線	L=523m	○	
A07-024	下水道	雨水	中部9号幹線	L=150m	○	
A07-025	下水道	雨水	中部11号幹線	L=439m	○	
A07-026	下水道	雨水	中部12号幹線	L=807m	○	
A07-027	下水道	雨水	中部13号幹線	L=292m	○	
A07-028	下水道	雨水	中部15号幹線	L=9m	○	

A07-029	下水道	雨水	天神外地区準幹線	L = 4, 888m	○	
A07-030	下水道	雨水	浸透施設	L = 5, 000m	○	
A07-031	下水道	雨水	上呉服地区雨水管整備	L = 500m	○	
A07-032	下水道	雨水	下川端地区雨水管整備	L = 270m	○	
A07-033	下水道	雨水	上川端地区雨水管整備	L = 150m	○	
A07-034	下水道	雨水	中洲地区雨水管整備	L = 420m	○	
A07-035	下水道	雨水	港地区雨水管整備	L = 270m	○	
A07-036	下水道	雨水	市崎地区雨水管整備	L = 22m	○	
A07-037	下水道	雨水	大楠地区雨水管整備	L = 1, 210m	○	
A07-062	下水道	ポンプ場	博多駅東ポンプ場	監視抑制御設備等		○
A07-063	下水道	ポンプ場	向島ポンプ場	監視抑制御設備等		○
A07-064	下水道	ポンプ場	鳥飼ポンプ場	監視抑制御設備等		○
A07-065	下水道	ポンプ場	城西第2ポンプ場	監視抑制御設備等		○
A07-066	下水道	ポンプ場	菰川ポンプ場	監視抑制御設備等		○
A07-077	下水道	ポンプ場	藤崎ポンプ場	監視抑制御設備等		○
A07-085	下水道	ポンプ場	博多駅北ポンプ場	監視抑制御設備等		○

No. 6 西部処理区						
A07-038	下水道	雨水	田村地区雨水管整備	L = 1,500m	○	
A07-039	下水道	雨水	西長尾第2 4雨水幹線	L = 55m	○	
A07-040	下水道	雨水	小戸地区雨水管整備	L = 160m	○	
A07-041	下水道	雨水	姪浜地区雨水管整備	L = 60m	○	
A07-042	下水道	雨水	福重地区雨水管整備	L = 40m	○	
A07-043	下水道	雨水	友丘地区雨水管整備	L = 45m	○	
A07-044	下水道	雨水	干隈地区雨水管整備	L = 60m	○	
A07-045	下水道	雨水	賀茂地区雨水管整備	L = 190m	○	
A07-067	下水道	ポンプ場	興徳寺ポンプ場	監視抑制御設備等		○
A07-068	下水道	ポンプ場	飛石町ポンプ場	電気設備等		○
A07-069	下水道	ポンプ場	室見ポンプ場	監視抑制御設備等		○
A07-070	下水道	ポンプ場	姪の浜ポンプ場	監視抑制御設備等		○
A07-071	下水道	ポンプ場	野添ポンプ場	雨水ポンプ等		○
A07-072	下水道	ポンプ場	神功町ポンプ場	監視抑制御設備等		○
A07-074	下水道	雨水	壱岐東地区雨水幹線整備	L = 500m	○	
A07-080	下水道	ポンプ場	原第1ポンプ場	沈砂池設備等		○
A07-081	下水道	ポンプ場	原第2ポンプ場	屋上防水等		○
A07-086	下水道	ポンプ場	弁天町ポンプ場	監視抑制御設備等		○
No. 7 新西部処理区						
A07-046	下水道	雨水	元岡第4雨水幹線	L = 860m	○	
A07-047	下水道	雨水	周船寺第1雨水幹線	L = 960m	○	
A07-048	下水道	雨水	田尻地区雨水管整備	L = 200m	○	
A07-073	下水道	ポンプ場	田尻ポンプ場	監視抑制御設備等		○
No. 8 全処理区（下水道事業計画区域全体）						
A07-049	下水道	—	施設計画見直し等	調査・計画策定		○
A07-050	下水道	—	雨水流出抑制施設助成	雨水貯留タンク、浸透施設		○

※指標改善への貢献度

○：指標への効果が見込まれる事業

要素事業と指標との関係

C. 効果促進事業

番号	事業種別	事業及び 施設種別	要素となる事業名 (事業個所)	事業内容	指標改善への貢献度	
					指標 1	指標 2
C07-001	下水道	—	雨水・水位情報システムの構築	システムの構築	○	
C07-002	下水道	—	内水ハザードマップの作成	内水ハザードマップの作成	○	
C07-003	下水道	—	排水設備の設置促進	排水設備の設置促進	○	


※指標改善への貢献度
○：指標への効果が見込まれる事業

事業の概要

様式 3

福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（防災・安全）（重点計画）

事業規模	基幹事業	効果促進事業	処理区別							
			西戸崎処理区	和白処理区	東部処理区	南部処理区	中部処理区	西部処理区	新西部処理区	全処理区
事業実施数	39	3	0	6	13	3	6	7	2	2
整備計画の全事業数	86	3	1	6	22	10	23	18	4	2

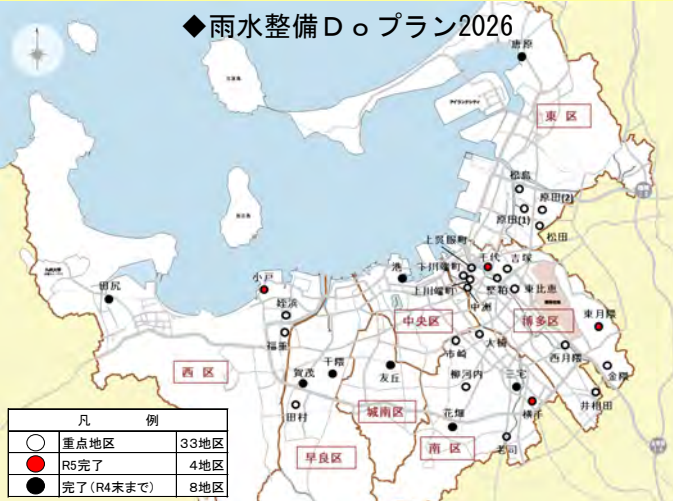主要施策	主な事業内容									
浸水対策	平成11年6月29日の豪雨で、浸水被害が重大であった地区について、重点的に雨水対策に取り組んでおり、令和元年度からは、重点地区を拡大し策定した「雨水整備D。プラン2026」に基づき、引き続き雨水対策を実施。 ○唐の原第1雨水幹線整備 ○金隈地区雨水管整備 ○三宅ポンプ場新設 ○友丘地区雨水管整備 ○田村地区雨水管整備 ○周船寺第1雨水幹線整備 ○雨水ポンプ場改築 など	◆雨水整備D。プラン2026  <table><tr><th colspan="2">凡 例</th></tr><tr><td>○</td><td>重点地区</td></tr><tr><td>●</td><td>R5完了</td></tr><tr><td>●</td><td>完了(R4末まで)</td></tr></table>	凡 例		○	重点地区	●	R5完了	●	完了(R4末まで)
凡 例										
○	重点地区									
●	R5完了									
●	完了(R4末まで)									

事業実施期間

様式 4

A 1 下水道事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					備考
											R1	R2	R3	R4	R5	
No. 1 西戸崎処理区																
A07-051	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	大岳ポンプ場（ストマネ）	監視抑制制御設備等	福岡市						
No. 2 和白処理区																
A07-001	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	唐の原第1雨水幹線	L＝270m	福岡市						
A07-002	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	唐の原第3雨水幹線	L＝290m	福岡市						
A07-003	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	唐の原第7雨水幹線	L＝30m	福岡市						
A07-004	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	和白丘地区雨水管整備	L＝250m	福岡市						
A07-052	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	塩浜ポンプ場（ストマネ）	監視抑制制御設備等	福岡市						
A07-053	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	奈多第1ポンプ場（ストマネ）	監視抑制制御設備等	福岡市						
No. 3 東部処理区																
A07-005	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	松田地区雨水管整備	L＝290m	福岡市						
A07-006	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	原田（2）地区雨水管整備	L＝750m	福岡市						
A07-007	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	松島地区雨水管整備	L＝340m	福岡市						
A07-008	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	原田（1）地区雨水管整備	L＝460m	福岡市						
A07-009	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	吉塚地区雨水管整備	L＝210m	福岡市						
A07-010	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	千代地区雨水管整備	L＝550m	福岡市						
A07-011	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	堅粕地区雨水管整備	L＝170m	福岡市						
A07-012	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	東比恵地区雨水管整備	L＝800m	福岡市						
A07-054	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	改築	東部水処理センター（ストマネ）	非常用発電設備	福岡市						
A07-055	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	城浜ポンプ場（ストマネ）	監視抑制制御設備等	福岡市						
A07-056	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	松崎第1ポンプ場（ストマネ）	発電機設備等	福岡市						
A07-057	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	津屋ポンプ場（ストマネ）	監視抑制制御設備等	福岡市						
A07-058	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	筥松第1ポンプ場（ストマネ）	非常用発電設備	福岡市						
A07-059	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	筥松第2ポンプ場（ストマネ）	監視抑制制御設備等	福岡市						
A07-060	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	堅粕第1ポンプ場（ストマネ）	監視抑制制御設備等	福岡市						
A07-061	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	堅粕第3ポンプ場（ストマネ）	監視抑制制御設備等	福岡市						
A07-076	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	筥松地区雨水管整備	L＝500m	福岡市						
A07-078	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	原田ポンプ場（ストマネ）	屋上防水等	福岡市						
A07-079	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	坂本町ポンプ場（ストマネ）	防食等	福岡市						
A07-082	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	筥松第3ポンプ場（ストマネ）	屋上防水等	福岡市						
A07-083	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	米田ポンプ場（ストマネ）	監視抑制制御設備等	福岡市						
A07-084	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	東浜第2ポンプ場（ストマネ）	電気設備等	福岡市						
No. 4 南部処理区																
A07-013	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	新設	三宅ポンプ場新設	雨水 6.1m ³ /s	福岡市						
A07-014	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	東月隈地区雨水管整備	L＝142m	福岡市						
A07-015	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	西月隈地区雨水管整備	L＝1,180m	福岡市						
A07-016	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	金隈地区雨水管整備	L＝1,330m	福岡市						
A07-017	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	井相田地区雨水管整備	L＝190m	福岡市						
A07-018	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	横手地区雨水管整備	L＝150m	福岡市						
A07-019	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	柳河内地区雨水管整備	L＝40m	福岡市						
A07-020	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	花畑地区雨水管整備	L＝160m	福岡市						
A07-021	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	老司地区雨水管整備	L＝115m	福岡市						
A07-075	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	那珂地区雨水幹線整備	L＝360m	福岡市						
No. 5 中部処理区																
A07-																

事業実施期間

様式 4

A07-025	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	中部 1 1 幹線	(総合浸水)	L = 439m	福岡市						
A07-026	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	中部 1 2 号幹線	(総合浸水)	L = 807m	福岡市						
A07-027	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	中部 1 3 号幹線	(総合浸水)	L = 292m	福岡市						
A07-028	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	中部 1 5 号幹線	(総合浸水)	L = 9m	福岡市						
A07-029	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	天神外地区準幹線	(総合浸水)	L = 4, 888m	福岡市						
A07-030	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	浸透施設	(総合浸水)	L = 5, 000m	福岡市						
A07-031	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	上呉服地区雨水管整備		L = 500m	福岡市						
A07-032	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	下川端地区雨水管整備		L = 270m	福岡市						
A07-033	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	上川端地区雨水管整備		L = 150m	福岡市						
A07-034	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	中洲地区雨水管整備		L = 420m	福岡市						
A07-035	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	港地区雨水管整備		L = 270m	福岡市						
A07-036	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	市崎地区雨水管整備		L = 22m	福岡市						
A07-037	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	大楠地区雨水管整備		L = 1, 210m	福岡市						
A07-062	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	博多駅東ポンプ場	(ストマネ)	監視抑制御設備等	福岡市						
A07-063	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	向島ポンプ場	(ストマネ)	監視抑制御設備等	福岡市						
A07-064	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	鳥飼ポンプ場	(ストマネ)	監視抑制御設備等	福岡市						
A07-065	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	城西第 2 ポンプ場	(ストマネ)	監視抑制御設備等	福岡市						
A07-066	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	菰川ポンプ場	(ストマネ)	監視抑制御設備等	福岡市						
A07-077	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	藤崎ポンプ場	(ストマネ)	監視抑制御設備等	福岡市						
A07-085	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	博多駅北ポンプ場	(ストマネ)	監視抑制御設備等	福岡市						
No. 6 西部処理区																	
A07-038	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	田村地区雨水管整備		L = 1, 500m	福岡市						
A07-039	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	西長尾第 2 4 雨水幹線		L = 55m	福岡市						
A07-040	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	小戸地区雨水管整備		L = 160m	福岡市						
A07-041	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	姪浜地区雨水管整備		L = 60m	福岡市						
A07-042	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	福重地区雨水管整備		L = 40m	福岡市						
A07-043	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	友丘地区雨水管整備		L = 45m	福岡市						
A07-044	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	干隈地区雨水管整備		L = 60m	福岡市						
A07-045	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	賀茂地区雨水管整備		L = 190m	福岡市						
A07-067	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	興徳寺ポンプ場	(ストマネ)	監視抑制御設備等	福岡市						
A07-068	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	飛石町ポンプ場	(ストマネ)	電気設備等	福岡市						
A07-069	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	室見ポンプ場	(ストマネ)	監視抑制御設備等	福岡市						
A07-070	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	姪の浜ポンプ場	(ストマネ)	監視抑制御設備等	福岡市						
A07-071	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	野添ポンプ場	(ストマネ)	雨水ポンプ等	福岡市						
A07-072	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	神功町ポンプ場	(ストマネ)	監視抑制御設備等	福岡市						
A07-074	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	壱岐東地区雨水幹線整備		L = 500m	福岡市						
A07-080	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	原第 1 ポンプ場	(ストマネ)	沈砂池設備等	福岡市						
A07-081	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	原第 2 ポンプ場	(ストマネ)	屋上防水等	福岡市						
A07-086	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	弁天町ポンプ場	(ストマネ)	監視抑制御設備等	福岡市						
No. 7 新西部処理区																	
A07-046	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	元岡第 4 雨水幹線		L = 860m	福岡市						
A07-047	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	周船寺第 1 雨水幹線		L = 960m	福岡市						
A07-048	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	雨水	新設	田尻地区雨水管整備		L = 200m	福岡市						
A07-073	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	ポンプ場	改築	田尻ポンプ場	(ストマネ)	監視抑制御設備等	福岡市						
No. 8 全処理区(下水道事業計画区域全体)																	
A07-049	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	—	—	施設計画見直し等		調査・計画策定	福岡市						
A07-050	下水道	一般	福岡市	間接	民間	—	—	雨水流出抑制施設助成		雨水貯留タンク、浸透施設	福岡市						

事業実施期間

様式 4

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					備考
										R1	R2	R3	R4	R5	
C 効果促進事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					備考
										R1	R2	R3	R4	R5	
No. 5 中部処理区															
C07-001	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	—	—	雨水・水位情報システムの構築	システムの構築	福岡市					
C07-002	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	—	—	内水ハザードマップの作成	内水ハザードマップの作成	福岡市					
C07-003	下水道	一般	福岡市	間接	民間	—	—	排水設備の設置促進	排水設備の設置促進	福岡市					

社会資本総合整備計画 事後評価

福岡市における良好な水環境の創造

事後評価シート

令和6年12月
福岡県福岡市

事後評価シート

様式 1

都道府県名	福岡県		市町村名	福岡市		計画名	福岡市における良好な水環境の創造					
交付期間	令和元年度～令和5年度		事後評価実施時期	令和6年度		交付対象事業見込額	1,728百万円	国費率	50%			
1) 事業の実施状況	計画に位置づけ実施した事業	基幹事業	事業名 No.1 中部処理区（中部処理区再生水管整備） No.2 東部処理区（東部処理区再生水管整備、東部水処理センター再生処理施設改築）									
		関連事業	—									
		効果促進事業	—									
	当初計画から削除した事業	基幹事業	事業名			削除／追加の理由			削除／追加による目標、指標、数値目標への影響			
		効果促進事業	—			—			—			
		新たに追加した事業	基幹事業	—			—			—		
			効果促進事業	—			—			—		
	交付期間の変更	当初	令和元年度～令和5年度		交付期間の変更による事業、指標、目標数値への影響	—						
		変更	—									
	2) 社会資本総合整備計画に記載した評価の指標（定量的指標）の実現状況	指標		単位	従前値	基準年度	目標値	目標年度	実績値	見込値	目標達成度	目標達成度○×の理由
指標 1		再生水供給面積	ha	1,485	R1	1,540	R5	1,528	—	△	九州大学箱崎キャンパス跡地のまちづくりの事業進捗にあわせて再生水供給面積を拡大した結果、想定よりも事業進捗が遅れたため、目標値を下回っているが、引き続き、まちづくりの事業進捗にあわせて再生水供給面積を拡大していく。	

※指標改善への貢献度
○：評価値が目標値に達した場合
△：評価値が目標値には達していないものの、基準年度よりは改善していると認められる場合

3) 効果発現状況の整理	各指標の効果が得られた要因の整理 (成果と実施過程の関係性の整理)	・まちづくりの事業進捗にあわせて再生水供給面積を拡大した結果、基準年度（令和元年度）よりも面積が増加した。
	検討体制の整理	・本市では、公共事業再評価等監視委員会による事業評価システムを既に導入し、事業内容の評価及び検証を行っており、当事業についても当委員会による審議を行うこととしている。 ・計画の策定と事業実施、事業管理を行う部署を区分し、チェック体制の強化及び適切な事業推進体制を構築している。
4) 実施過程の検証	モニタリングの実施状況	・毎年指標の達成状況をモニタリングし、事業進捗との調整を行ってきた。
	住民参加プロセスの実施状況	・市政だよりやホームページ、市民向け広報誌等によって、事業内容や財政状況等を積極的に発信している。 市民が参加できる身近なイベントとして、毎年「下水道フェア」を開催しており、夏休みには小学生とその保護者を対象とした「下水道たんけん隊」を水処理センターで開催している。 また、下水道部局による出前講座の開催（市民からの要望があれば随時開催）、「ぼんブラザ（福岡市下水道博物館）」（ポンプ場施設の上部に下水道のPRコーナーや文化施設を併設）の活用等、多様な媒体による幅広い広報手段により、下水道事業の「見える化」を進めている。
	持続的な事業推進体制の構築	・本市では、公共事業再評価等監視委員会による事業評価システムを導入し、事業内容の評価及び検証を行っており、当事業についても当委員会による審議を継続して行うこととしている。 ・事業実施と事業管理、計画の申請手続を行う部署を区分し、今後もチェック体制の強化及び適切な事業推進体制を維持する。
	パブリックコメントでの意見	—
5) 今後の方策	課題	—
	今後の取り組み方針	・福岡市の再生水利用下水道事業については、供給箇所数日本一を誇る事業であり、今後も積極的に供給ニーズに応じた管路網の整備及びエリアの拡大を実施していく。
6) 次期計画への指標の継続性	次期計画の名称	福岡市における良好な水環境の創造（4期計画）
	計画期間	令和6年度～令和10年度（5年間）
	現在設定している指標	既に事業実施中のため、以下の指標を設定している。 ①再生水供給面積
	指標に対する検討事項	・市側でのコントロールが難しい供給施設数ではなく、供給面積を指標として設定し、引き続き、事業を推進していく。

要素事業と指標との関係

様式 2

A. 基幹事業

番号	事業種別	事業及び施設種別	要素となる事業名 (事業個所)	事業内容	指標への貢献度
					指標 1
No. 1 中部処理区（再生水）					
A07-001	下水道	処理場	中部水処理センター	再生処理施設	○
A07-002	下水道	－	中部処理区再生水管整備	L＝4,593m	○
No. 2 東部処理区（再生水）					
A07-003	下水道	処理場	東部水処理センター	再生処理施設	○
A07-004	下水道	－	東部処理区再生水管整備	L＝15,023m	○

B. 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	事業及び 施設種別	要素事業 (事業個所)	事業内容	指標改善への貢献度
				計画（最終）内容	指標 1

C. 効果促進事業

番号	事業種別	事業及び 施設種別	要素事業 (事業個所)	事業内容	指標改善への貢献度
				計画（最終）内容	指標 1

※指標改善への貢献度

○：指標への効果が見込まれる事業

事業の概要

様式 3

福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現

事業規模	基幹事業	効果促進事業	処理区別							
			西戸崎処理区	和白処理区	東部処理区	南部処理区	中部処理区	西部処理区	新西部処理区	全処理区
事業実施数	4	0	0	0	2	0	2	0	0	0
整備計画の全事業数	4	0	0	0	2	0	2	0	0	0

主要施策	主な事業内容
処理水の有効利用	本市は節水型都市づくりを推進するため、全国に先駆けて「福岡市節水推進条例」を設置し、再生水利用に取り組んでおり、再生水管整備等を実施。 【主な事業】 ○東部処理区再生水管整備 ○中部処理区再生水管整備 ○東部水処理センター 再生処理施設改築 ○中部水処理センター 再生処理施設改築 ◆再生水供給区域  ◆再生処理施設(中部水処理センター)  ◆再生処理施設(東部水処理センター) 

事業実施期間

様式 4

A 1 下水道事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					備考
											R1	R2	R3	R4	R5	
No. 1 中部処理区（再生水）																
A07-001	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	改築	中部水処理センター	再生処理施設	福岡市						
A07-002	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	—	新設	中部処理区再生水管整備	L＝4,593m	福岡市						
No. 2 東部処理区（再生水）																
A07-003	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	処理場	改築	東部水処理センター	再生処理施設	福岡市						
A07-004	下水道	一般	福岡市	直接	福岡市	—	新設	東部処理区再生水管整備	L＝15,023m	福岡市						
A 2 河川事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					備考
											R1	R2	R3	R4	R5	
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					備考	
										R1	R2	R3	R4	R5		
C 効果促進事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					備考	
										R1	R2	R3	R4	R5		

社会資本総合整備計画（下水道事業） の事後評価


福岡市 道路下水道局 計画部
下水道企画課

1. 福岡市の下水道事業について
2. 社会資本総合整備計画の内容と主要施策
3. 要素事業の進捗・達成状況

1. 福岡市の下水道事業について

福岡市下水道ビジョン2026

本市の上位計画である「福岡市基本構想」及び「第9次福岡市基本計画」を下水道分野から総合的・計画的に推進するため、下水道ビジョン2018に続き、**今後10年間(2017～2026)に取り組むべき施策目標や成果指標を示した基本計画。**



基本理念

**快適な暮らしを守り、都市の魅力を高め、
未来につなげる下水道**

目指すべき将来像

- ① 時代の変化を先取りし、暮らしを支え続ける下水道
 - ◆ 持続可能な次世代下水道への進化 ◆ 最適な下水道サービスの提供
 - ◆ 災害に強い強靱な下水道
- ② ポテンシャルを活かし、豊かな環境を創出する下水道
 - ◆ 健全な水環境の創出 ◆ 水・資源・エネルギーの供給拠点
 - ◆ 低炭素・循環型社会の実現
- ③ 新たな価値の創造へ、チャレンジする下水道
 - ◆ 見える・魅せる下水道 ◆ 地域を引っ張る下水道のリーダー都市
 - ◆ 世界をリードする技術開発拠点 ◆ 国際貢献・水ビジネスのハブ都市

1. 福岡市の下水道事業について

福岡市下水道ビジョン2026

施策目標

- 
- I 持続可能な下水道システムの構築
 - II 災害に強い下水道
 - III 健全な水環境の創出
 - IV 低炭素・循環型社会への貢献
 - V 身近な下水道
 - VI 地域活性化への貢献

1. 福岡市の下水道事業について

福岡市下水道ビジョン2026

【目指すべき将来像】

時代の変化を先取りし、暮らしを支え続ける下水道

施策目標 I 持続可能な下水道システムの構築

主要施策

主要施設の再構築

- ・ 中部水処理センター関連再構築

下水道施設の適切な維持管理・更新

- ・ 既存施設の適切な維持管理
- ・ アセットマネジメントの推進

経営基盤の強化

- ・ 下水道経営計画の策定
- ・ 経営基盤の強化
- ・ 資産の有効利用

組織体制の強化・人材育成

- ・ 最適な執行体制の構築
- ・ 人材育成・技術継承

主要施設の再構築



下水道施設の適切な維持管理・更新



1. 福岡市の下水道事業について

福岡市下水道ビジョン2026

【目指すべき将来像】

時代の変化を先取りし、暮らしを支え続ける下水道

施策目標 II 災害に強い下水道

主要施策

浸水対策の推進


- ・ 雨水整備レインボープラン
天神の推進
- ・ 雨水整備計画D・oプランの見直し
- ・ ソフト対策の充実
- ・ 雨水流出抑制施設の導入促進

地震対策の推進

- ・ 下水道施設の耐震化
- ・ 下水道BCPの充実・強化

レインボープラン天神

レインボープラン天神イメージ図

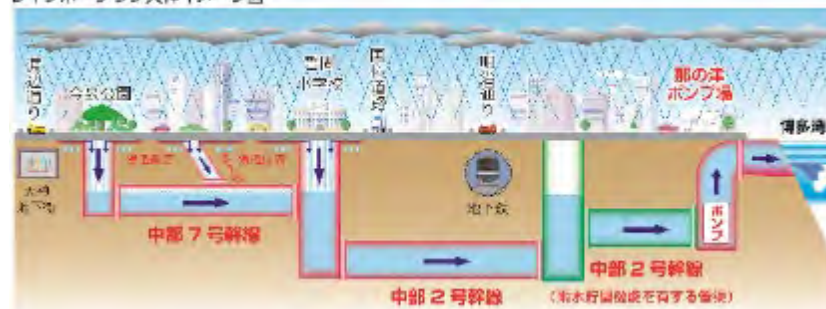

中部2号幹線



中部2号幹線 (内径 4.75m)

地震対策の推進



耐震化の事例 (ブレース設置)



震災訓練のイメージ

福岡市下水道ビジョン2026

【目指すべき将来像】

ポテンシャルを活かし、豊かな環境を創出する下水道

施策目標 Ⅲ 健全な水環境の創出

主要施策

汚水処理の最適化

- ・高度処理の推進
- ・未普及・未水洗化地区の解消

合流式下水道の改善

- ・ 博多駅周辺及び天神周辺地区の
分流通
- ・ 合流式下水道改善計画の見直し
- ・ 都心部の水辺空間等における対策
強化

分流化のイメージ（合流式下水道の改善）



博多駅周辺及び天神周辺地区の分流化

博多駅周辺地区（約300ha）

天神周辺地区（約173ha）



1. 福岡市の下水道事業について

福岡市下水道ビジョン2026

【目指すべき将来像】

ポテンシャルを活かし、豊かな環境を創出する下水道

施策目標 IV 低炭素・循環型社会への貢献

主要施策

下水処理水の有効利用

- ・ 再生水利用下水道事業の推進
- ・ 下水処理水の新たな活用

下水汚泥等の有効利用

- ・ 下水汚泥の新たな活用
- ・ 下水バイオガスの新たな活用
- ・ 下水道ポテンシャルの新たな活用

地球温暖化対策の推進

- ・ 省エネルギー化の推進
- ・ 再生可能エネルギーの導入推進
- ・ 環境報告書の公表

下水汚泥固定燃料化



下水バイオガスの活用



下水バイオガスからの水素の製造・利用のフロー図（水素リーダー都市プロジェクト）

1. 福岡市の下水道事業について

福岡市下水道ビジョン2026

【目指すべき将来像】

新たな価値の創造へ、チャレンジする下水道

施策目標 V 身近な下水道

下水道フェア、出前講座等の開催

主要施策

市民理解の促進

- ・ 市民の下水道事業への理解促進
- ・ お客様満足度の向上
- 「見える化」の推進
- ・ 多角的な広報
- ・ ぽんプラザ（福岡市下水道博物館）の活用推進

現在の市民参加型イベント

- ◇下水道フェア ◇夏休み下水道たんけん隊 ◇出前講座
- ◇小学生や市民団体等の見学対応



下水道フェアでの特別授業



ぽんプラザ（福岡市下水道博物館）



マンホールカード

1. 福岡市の下水道事業について

福岡市下水道ビジョン2026

【目指すべき将来像】

新たな価値の創造へ、チャレンジする下水道

施策目標 VI 地域活性化への貢献

主要施策

地域社会への貢献

- ・ まちづくり等への貢献
- ・ 周辺自治体等との連携

技術開発の推進

- ・ 技術開発の推進
- ・ 産学官との連携強化


国際貢献・ビジネス展開の推進

- ・ 国際貢献・国際協力
- ・ 官民連携のビジネス展開

海外技術者の研修受入れ



排水計画の技術指導

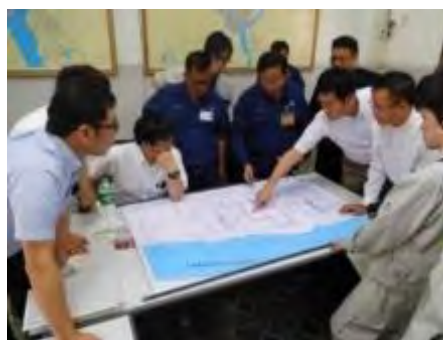

測量の技術指導




1. 福岡市の下水道事業について
- 2. 社会資本総合整備計画の内容と主要施策**
3. 要素事業の進捗・達成状況

2. 社会資本総合整備計画の内容と主要施策


交付金制度の変遷

- 平成22年度より、個別補助金制度を一つの交付金へ集約し、国土交通省所管とした。
これにより、地方公共団体にとっては、より自由度の高い制度となった。
- 平成25年度以降は、「防災・安全交付金」により、インフラ再構築（老朽化対策等）及び生活空間の安全確保の取組を集中的に支援するとともに、社会資本整備総合交付金により、地域の社会資本整備を総合的に支援する制度になった。

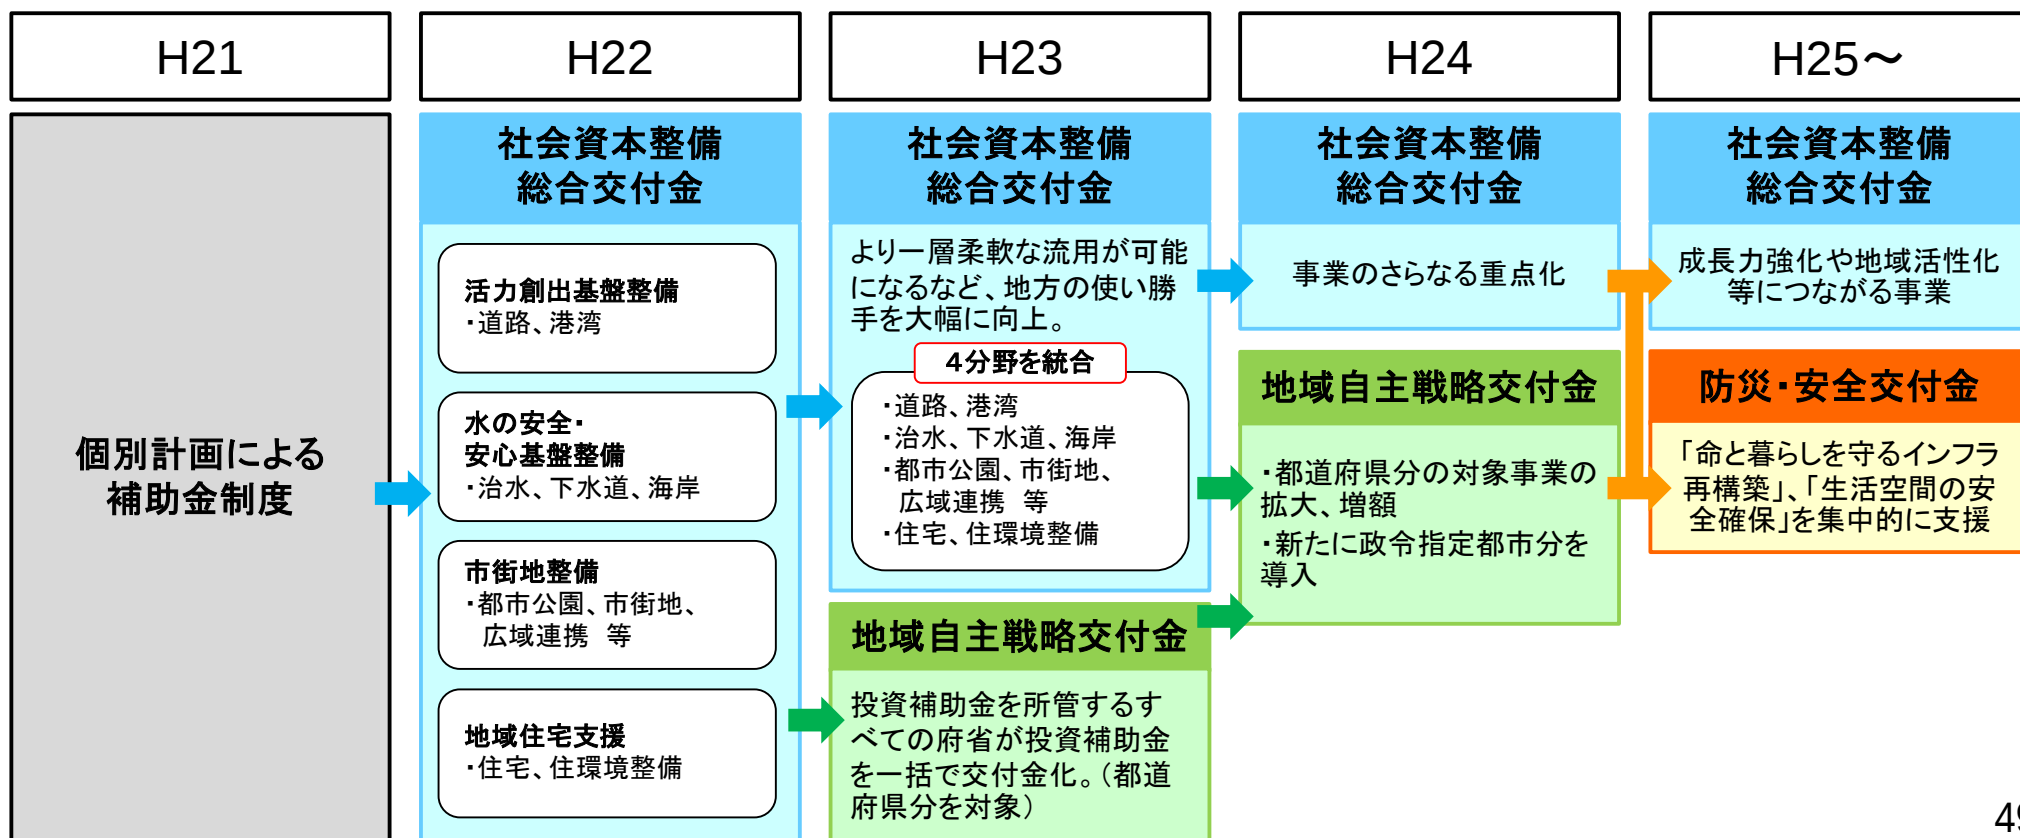

2. 社会資本総合整備計画の内容と主要施策

福岡市下水道ビジョンと社会資本総合整備計画

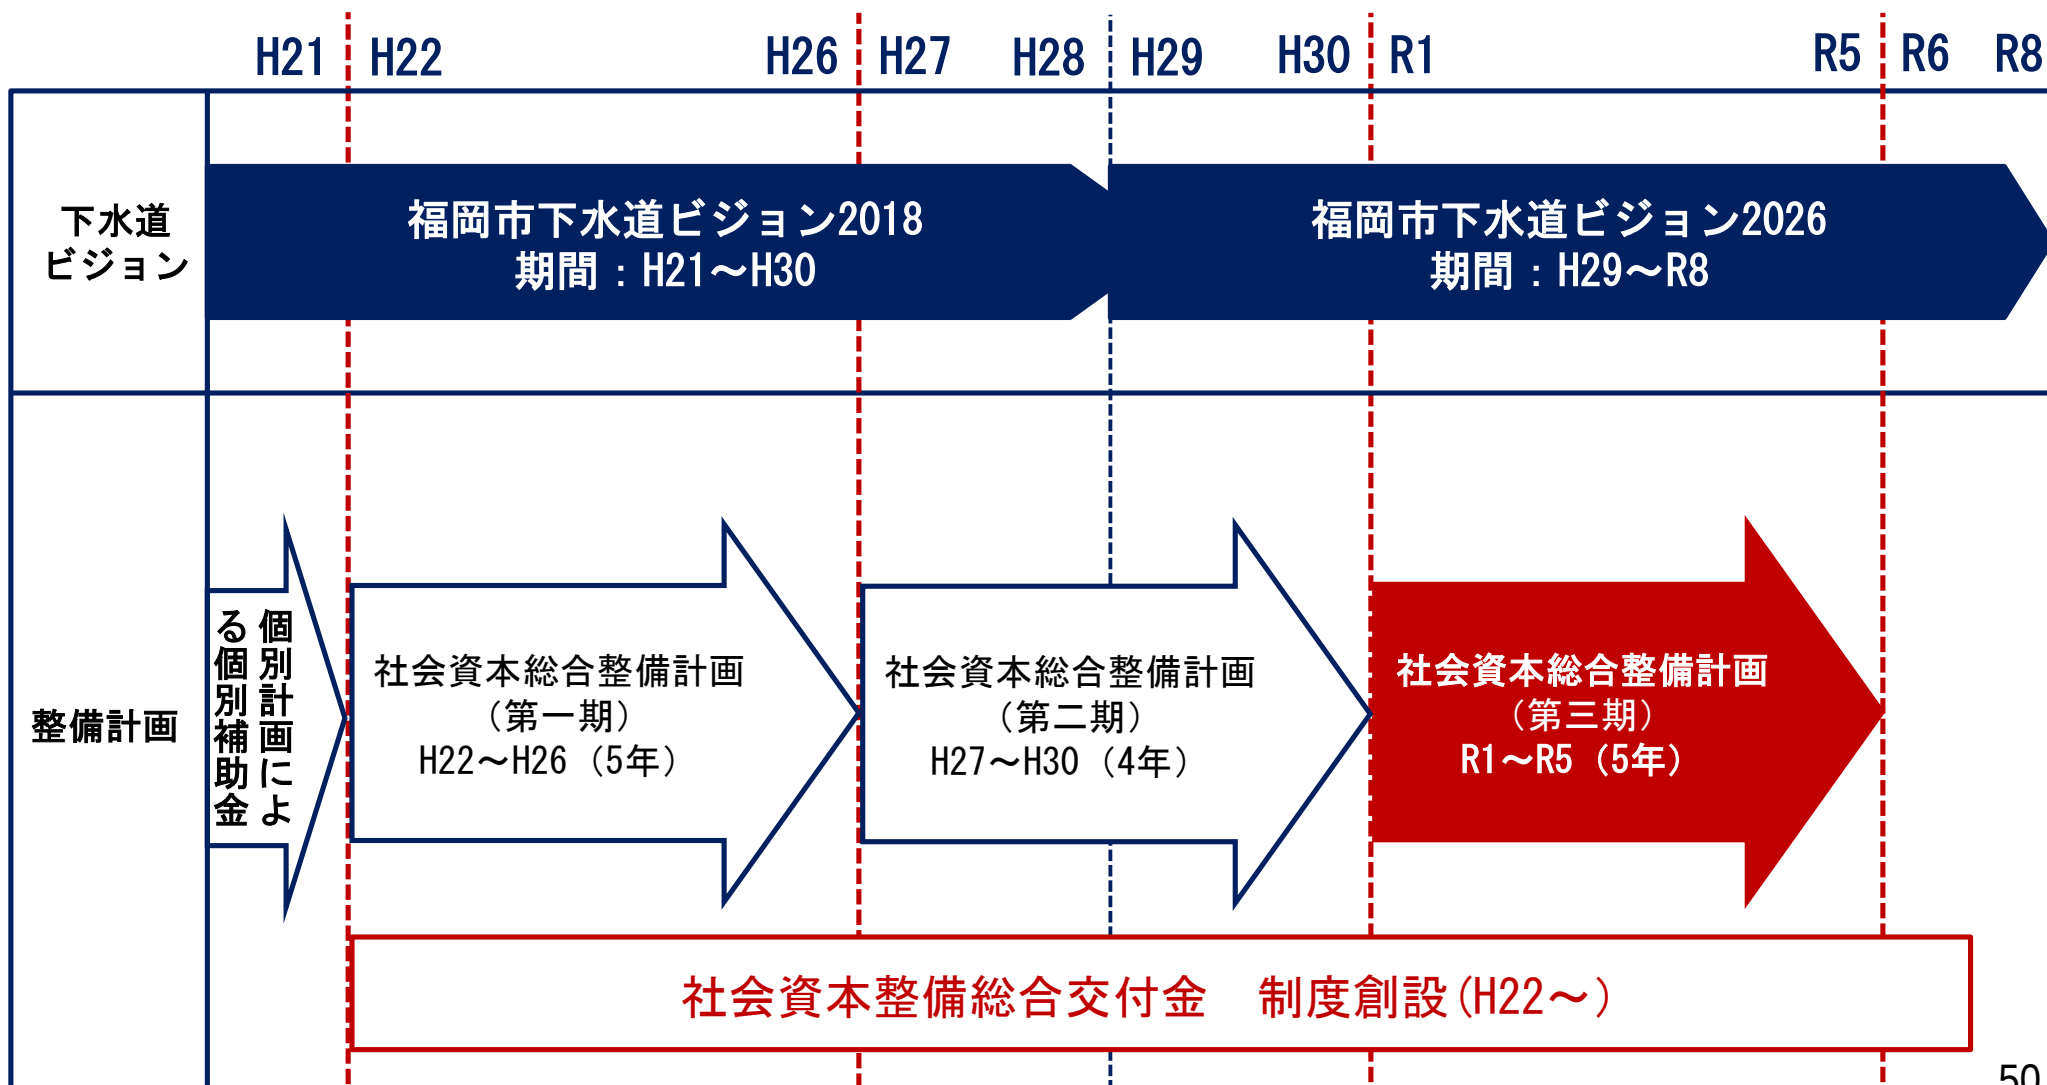

2. 社会資本総合整備計画の内容と主要施策

下水道ビジョン2026の主要施策と社会資本総合整備計画の関係

下水道ビジョン2026 施策目標		健全な 水環境の創出		持続可能な 下水道システ ムの構築	災害に 強い下水道		低炭素・ 循環型社会 への貢献
主要施策		汚水処理 の最適化	合流式 下水道 の改善	下水道施設の 適切な維持管 理・更新	浸水 対策の 推進	地震 対策の 推進	下水処理 水の有効 利用
社会 資本 総合 整備 計画	I 福岡市における安全・安心・ 快適な暮らしの実現	○	○				
	II-1 福岡市における安全・安心・ 快適な暮らしの実現 (防災・安全)			○		○	
	II-2 福岡市における安全・安心・ 快適な暮らしの実現 (防災・安全)(重点)				○		
	III 福岡市における 良好な水環境の創造						○

1. 福岡市の下水道事業について
2. 社会資本総合整備計画の内容と主要施策
- 3. 要素事業の進捗・達成状況**

3. 要素事業の進捗・達成状況 (1)整備計画Ⅰ

整備計画Ⅰ『福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現』

(下水道ビジョンの主要施策：「汚水処理の最適化」、「合流式下水道の改善」)

目 標	下水道整備により、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する
事業規模	期間：令和元年度～令和5年度、 事業費：約138億円(基幹136億円、効果促進2億円)

指 標		当初 現況値 (R1)	最終 目標値 (R5)	評価値 (R5)	達成度
指標 1	下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口(人)／行政人口(人)	99.7%	99.7%	99.7%	○
指標 2	合流式下水道改善率 合流式下水道改善済み面積(ha)／合流区域面積(ha)	99.2%	100%	100%	○

今後の 方針	・計画的な事業の実施により、指標1・2の目標値を達成した。 ・引き続き、アイランドシティのまちづくりの事業進捗にあわせて計画的に下水道整備を実施していく。 ・天神周辺地区等の分流化は、引き続き、レインボープラン天神等の浸水対策と連携し、整備を実施していく。
-----------	--


3. 要素事業の進捗・達成状況 (1)整備計画 I

◆ No. 1 西戸崎処理区




3. 要素事業の進捗・達成状況 (1)整備計画Ⅰ

◆ No. 2 和白処理区

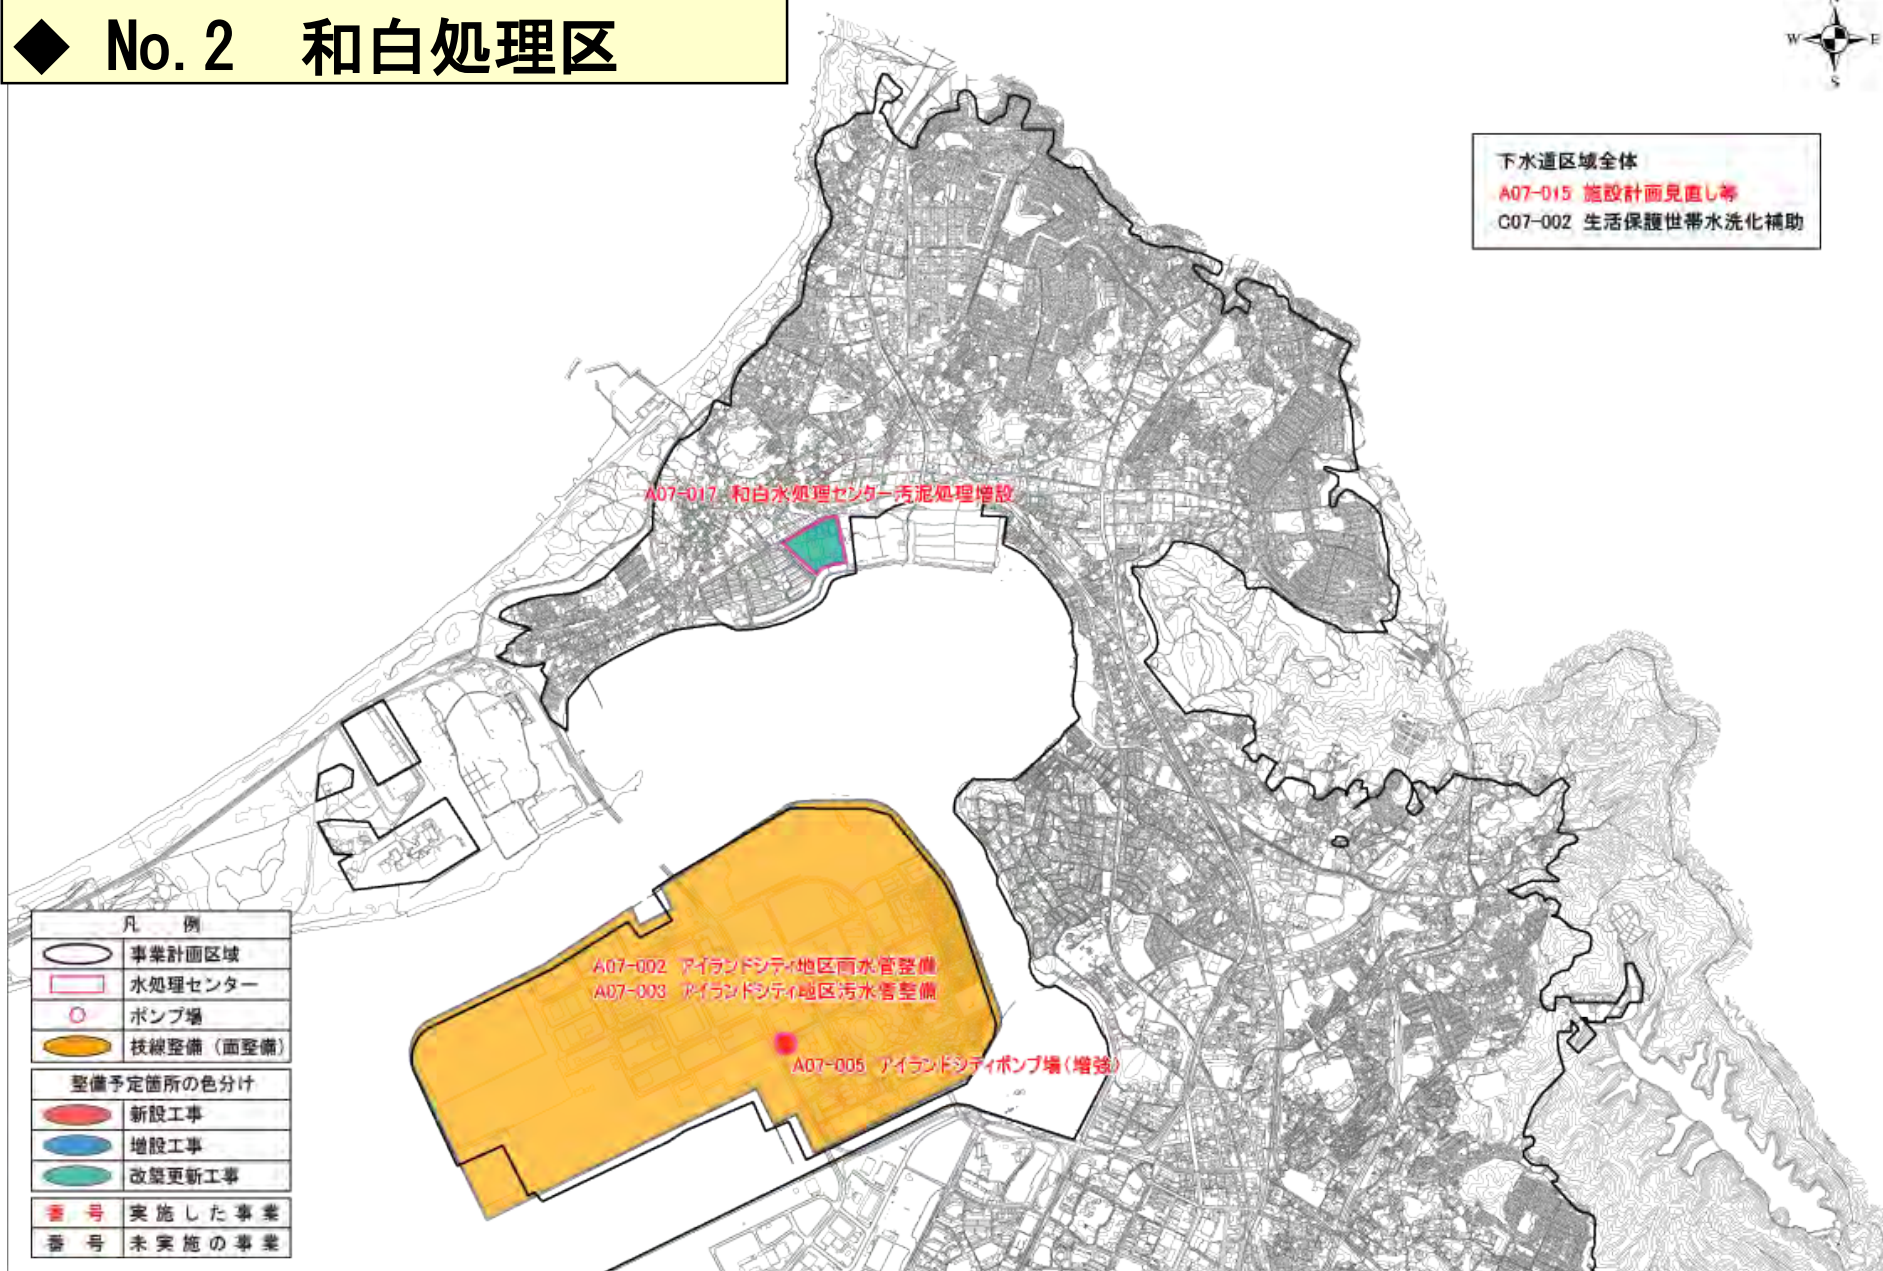


3. 要素事業の進捗・達成状況 (1)整備計画I

◆ No. 3 東部処理区

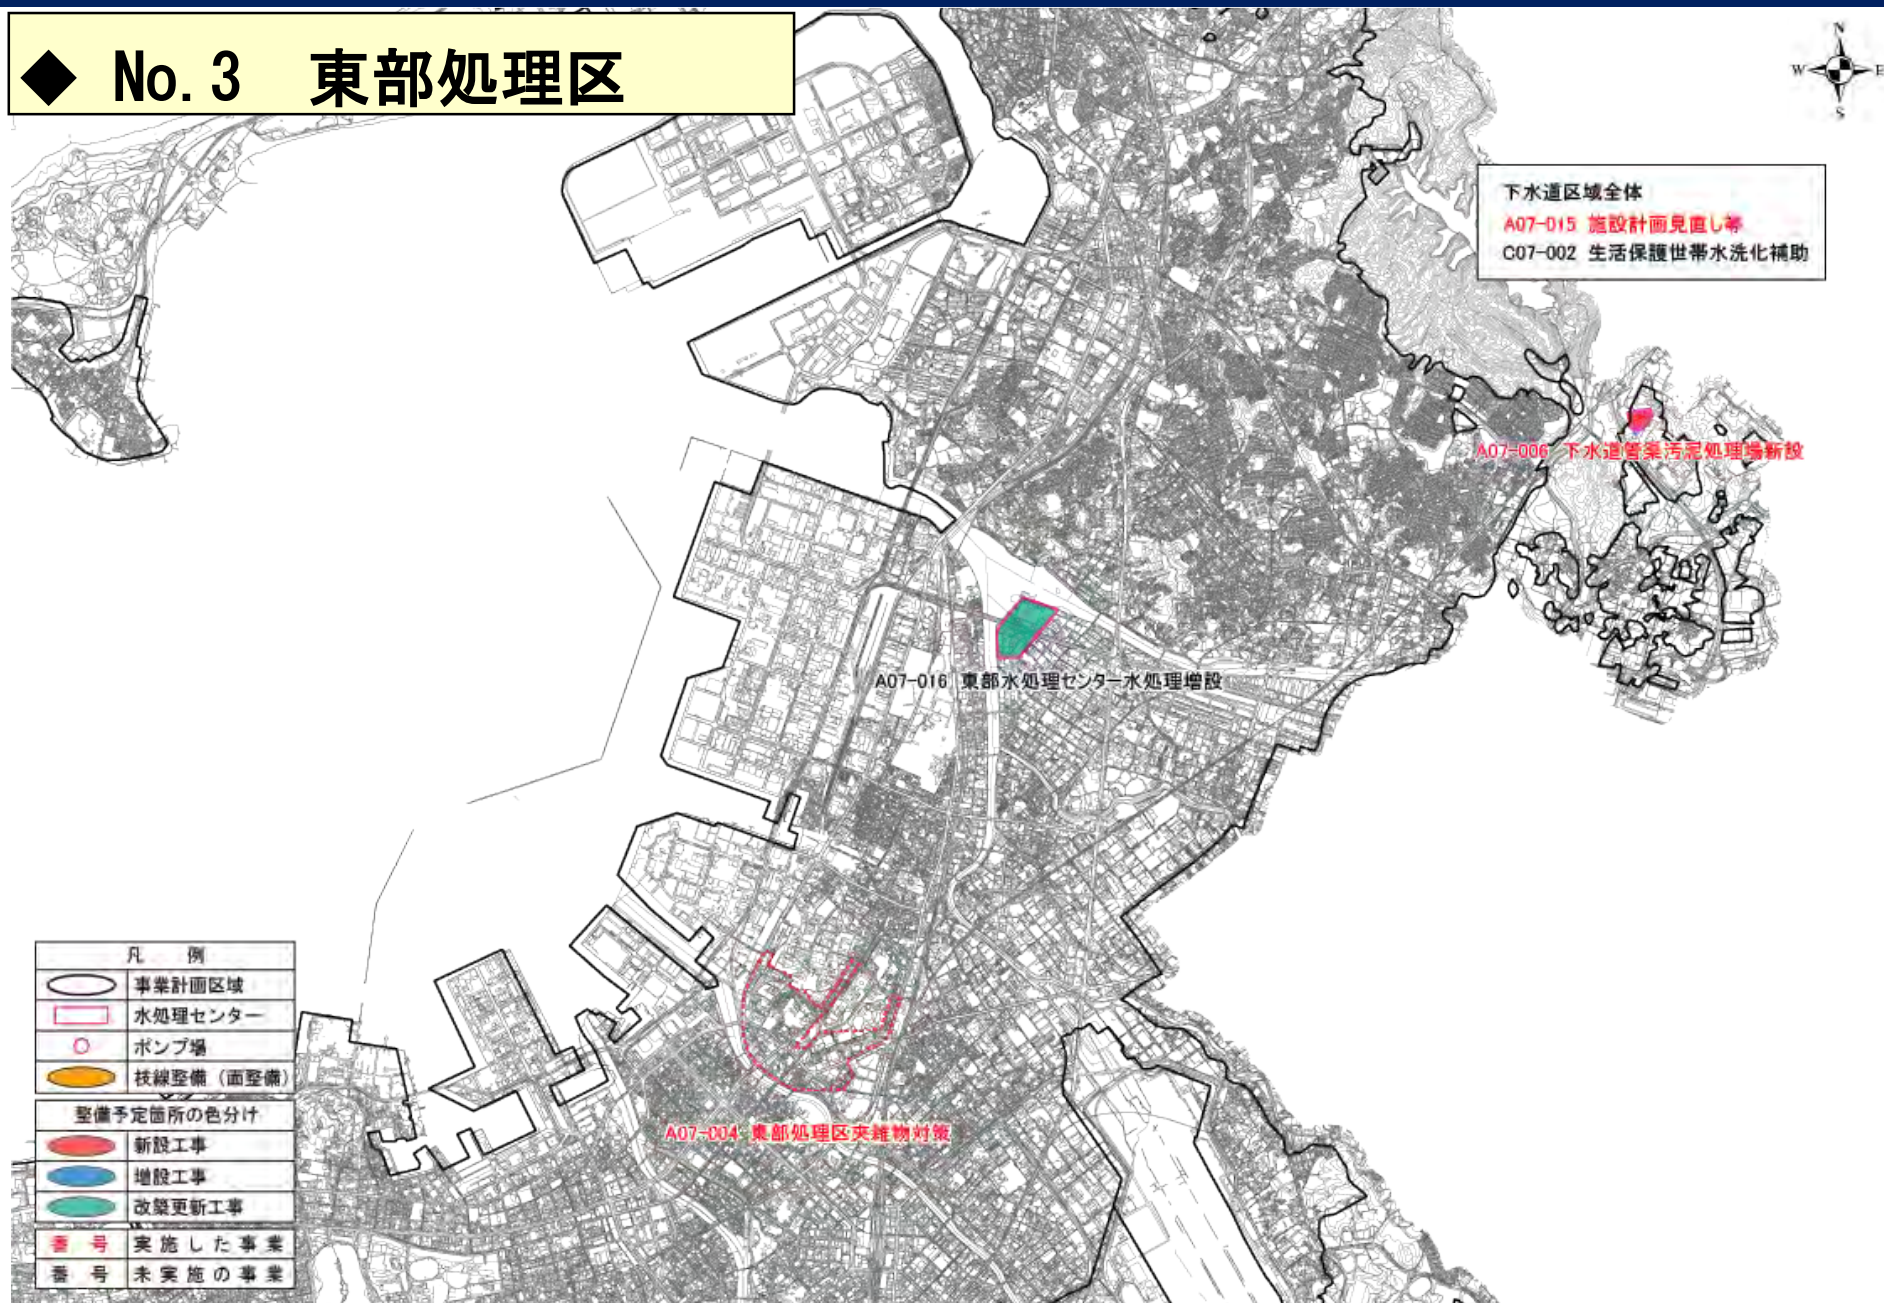


3. 要素事業の進捗・達成状況 (1)整備計画 I

◆ No. 4 南部処理区

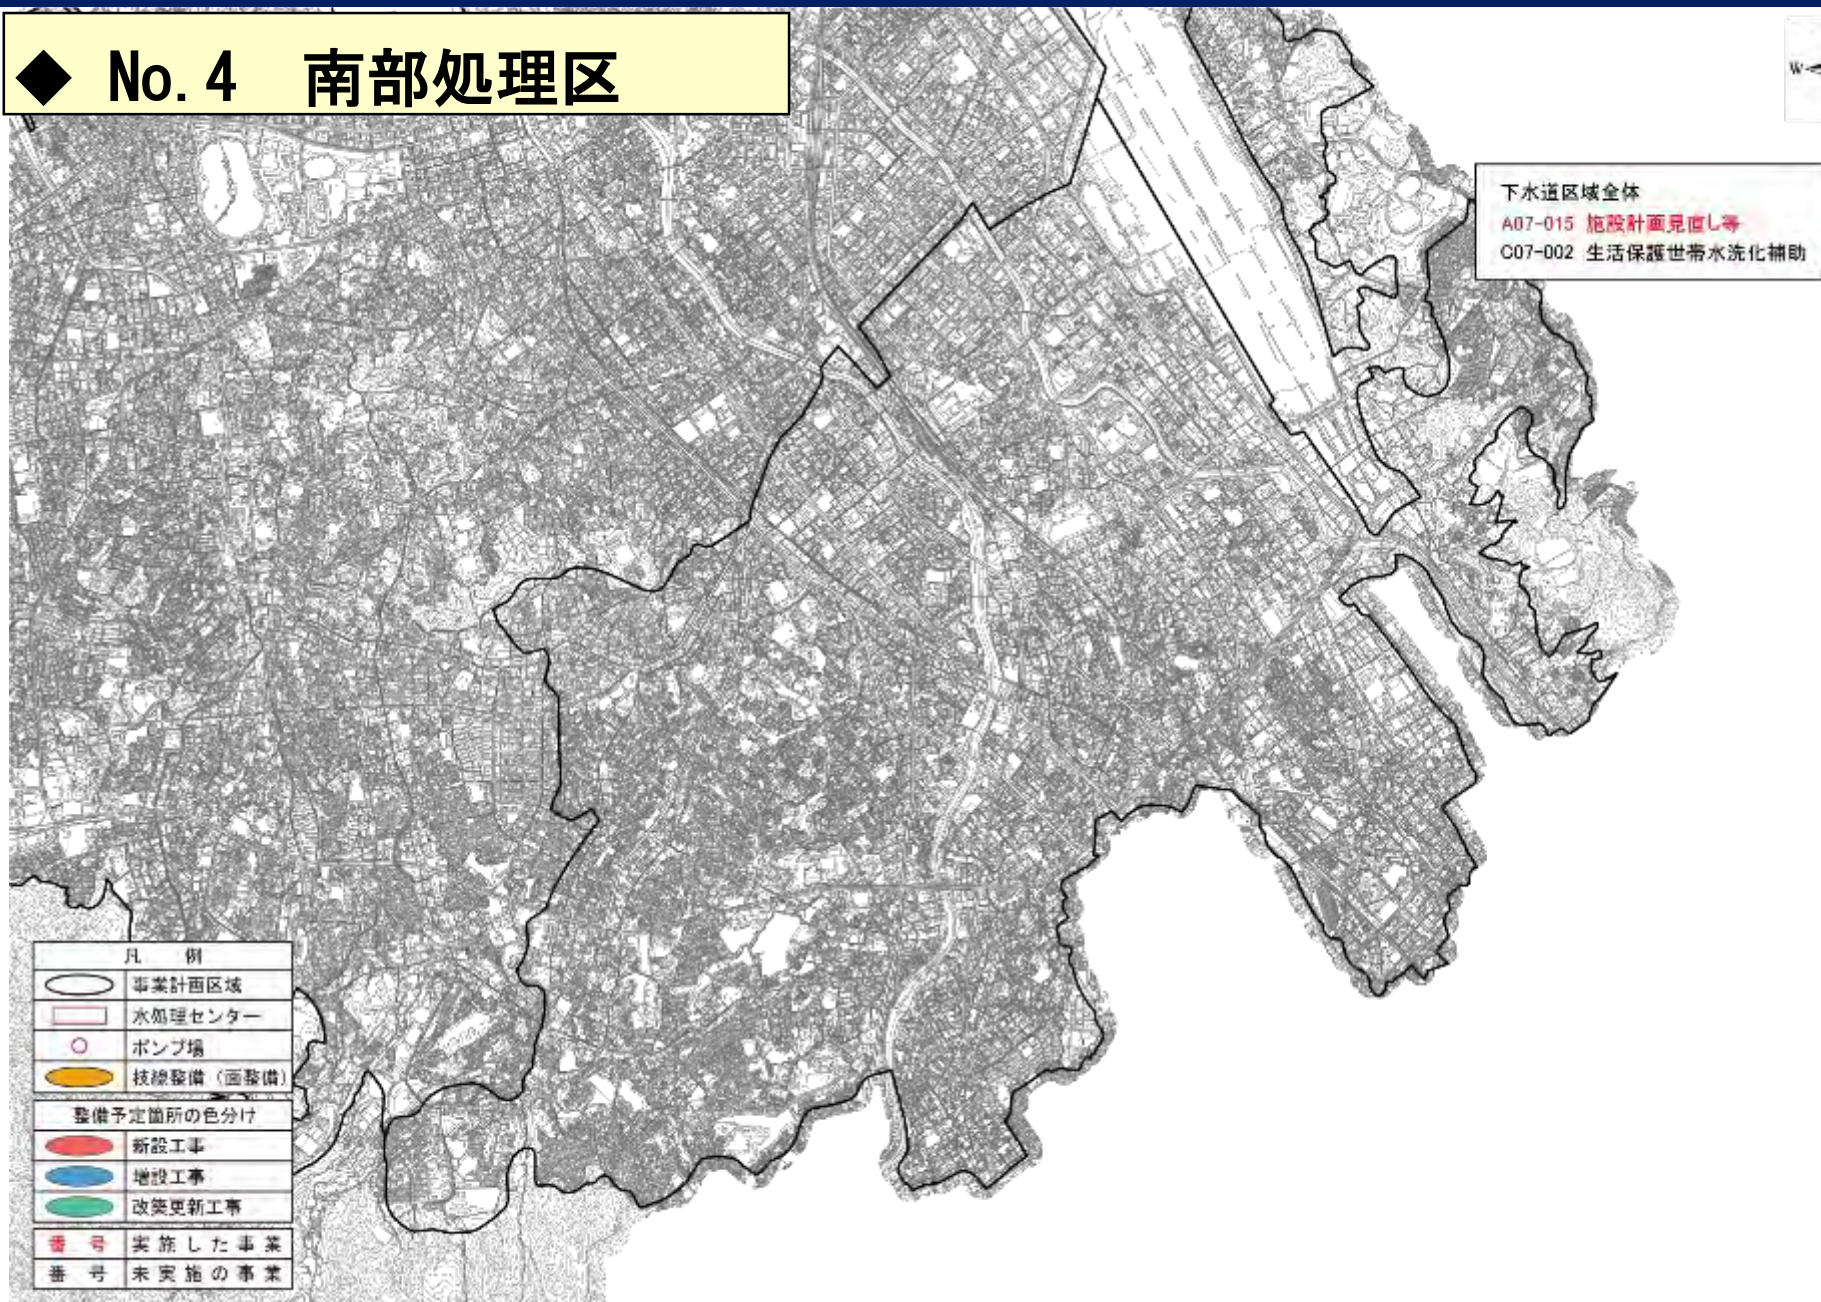


3. 要素事業の進捗・達成状況 (1)整備計画 I

◆ No. 5 中部処理区

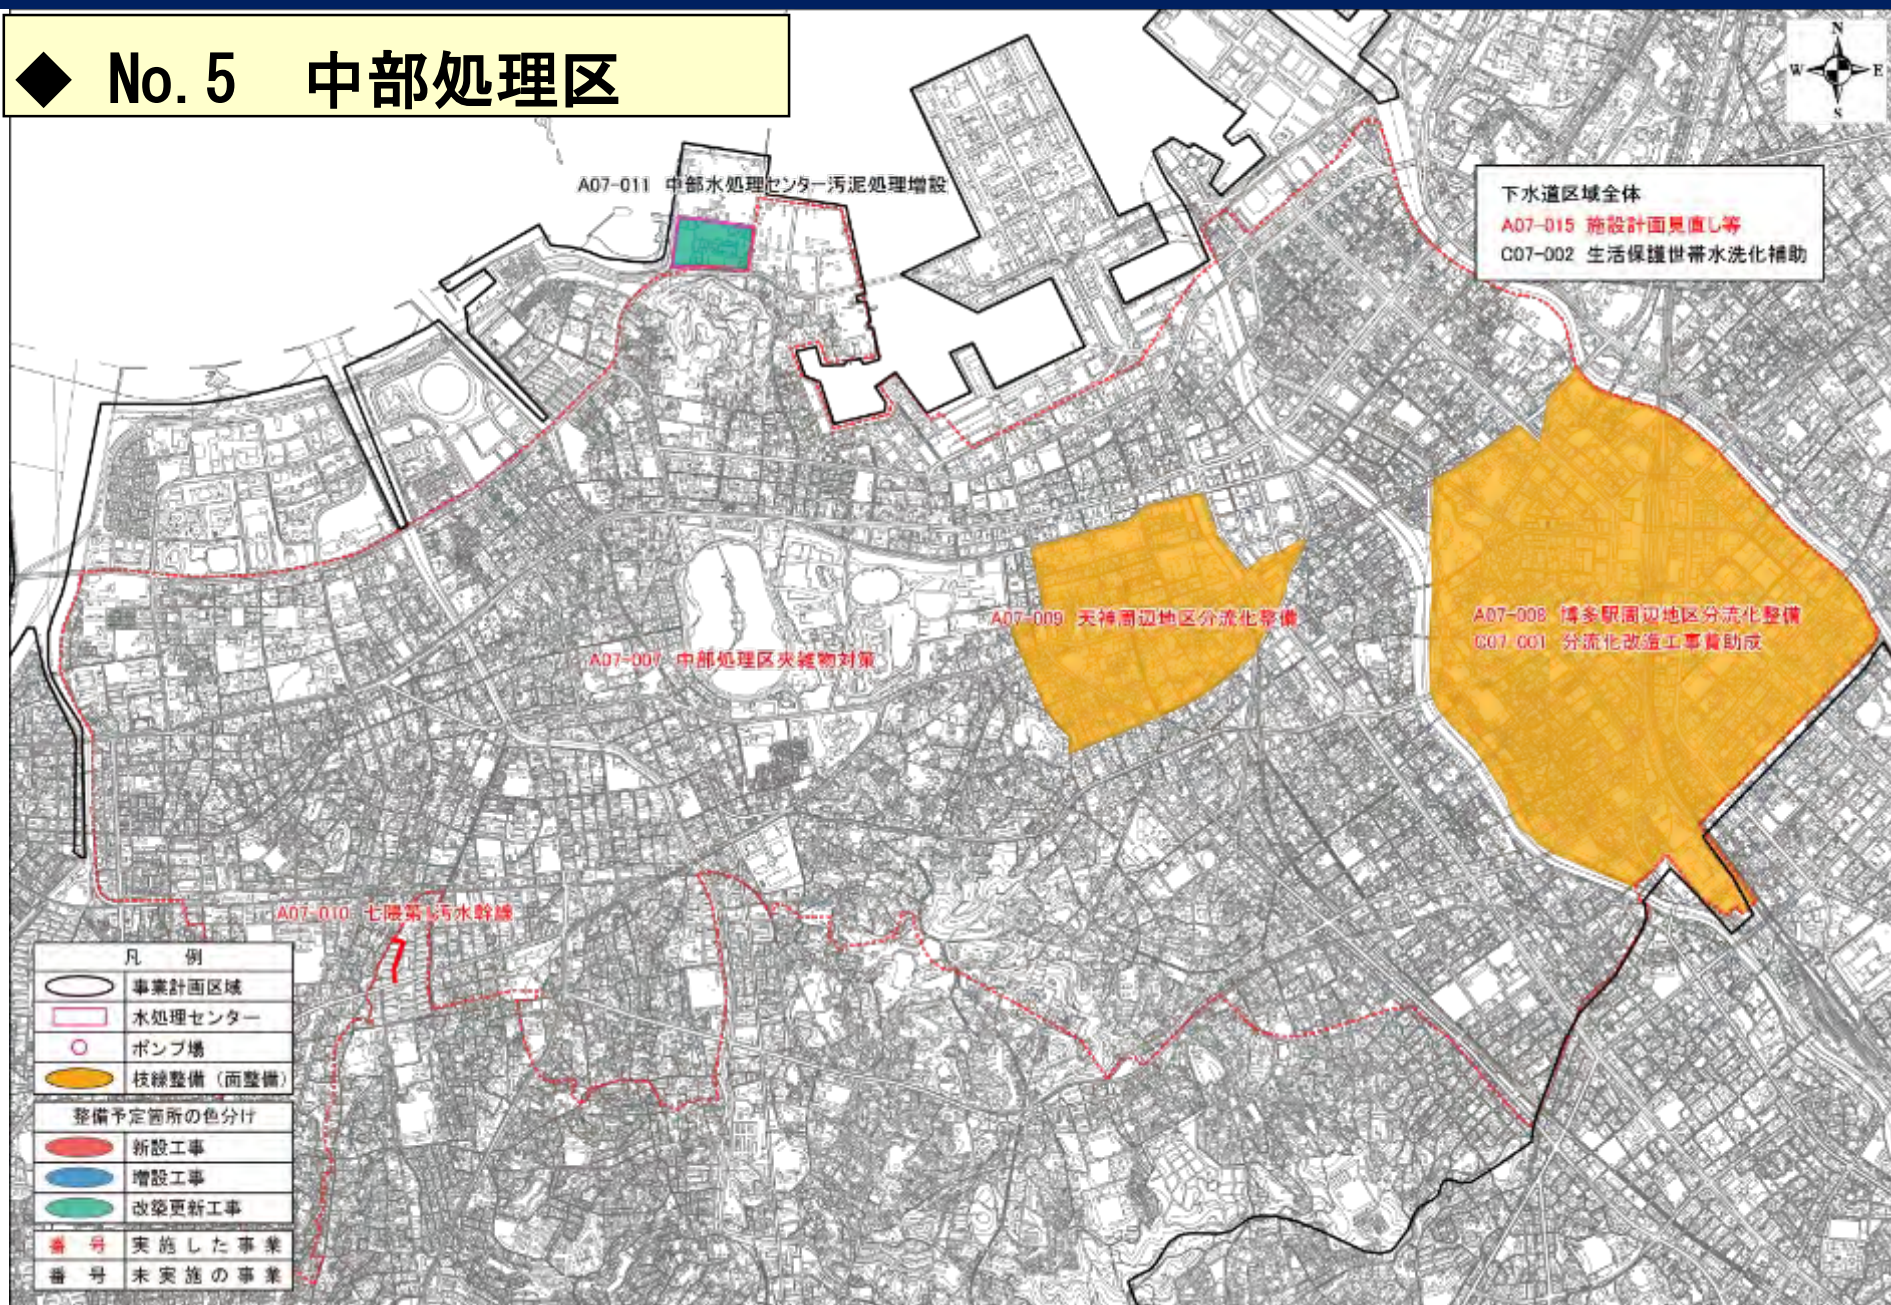


3. 要素事業の進捗・達成状況 (1)整備計画Ⅰ

◆ No. 6 西部処理区

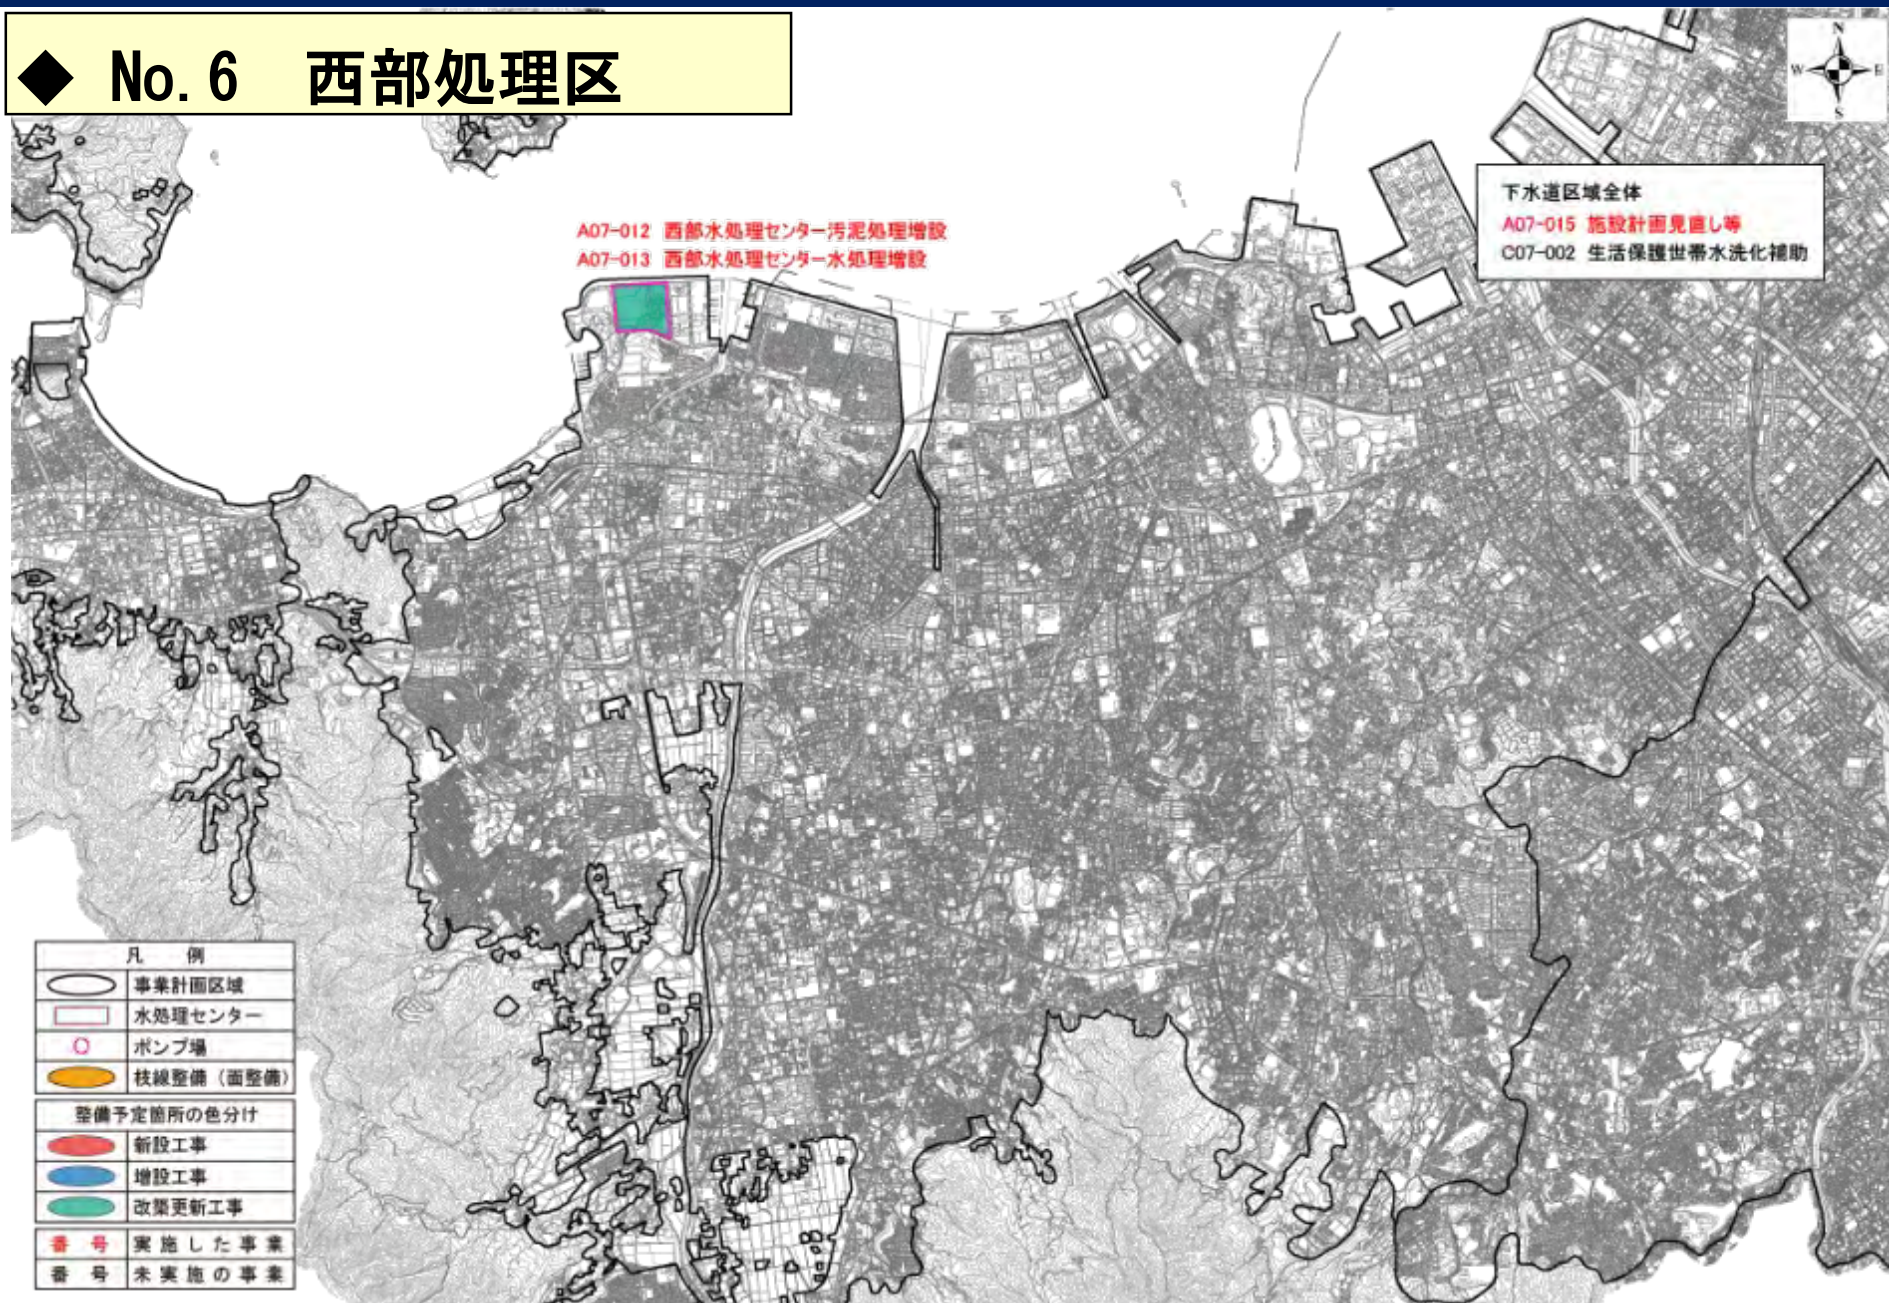

3. 要素事業の進捗・達成状況 (1)整備計画 I

◆ No. 7 新西部処理区

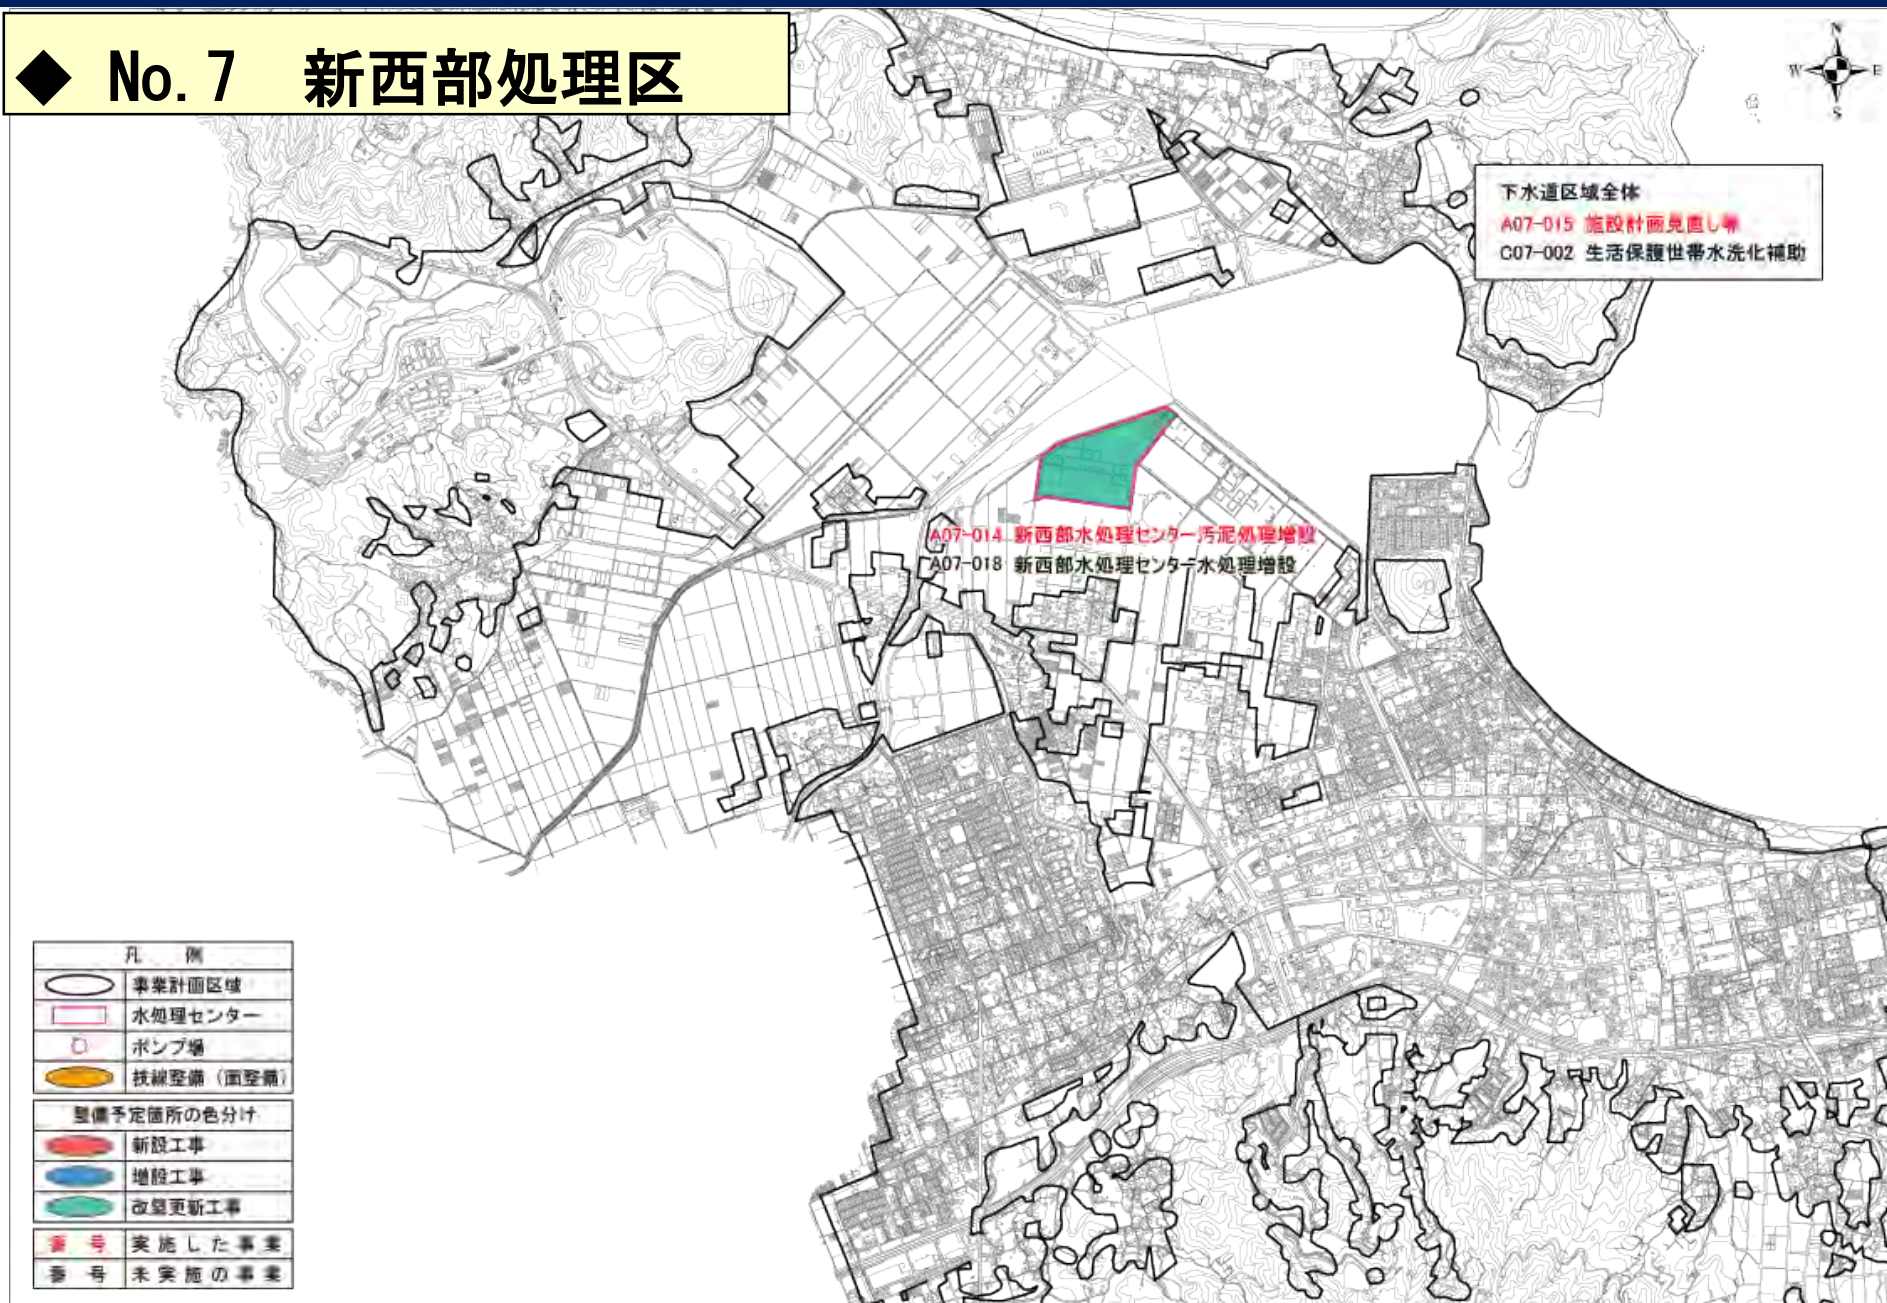

3. 要素事業の進捗・達成状況 (2)整備計画Ⅱ-1

整備計画Ⅱ-1『福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（防災・安全）』
（下水道ビジョンの主要施策：「地震対策の推進」、「下水道施設の適切な維持管理・更新」）

目 標	下水道整備により、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する
事業規模	期間：令和元年度～令和5年度、事業費：約783億円（基幹782.9億円、効果促進0.1億円）

指 標		当初 現況値 (R1)	最終 目標値 (R5)	評価値 (R5)	達成度
指標1	重要な管渠の地震対策達成率 耐震化が完了した管渠(km)／重要な管渠の延長(km)	67.1%	86.0%	120.0%	○
指標2	重要な施設の地震対策達成率 耐震化が完了した施設(箇所)／重要な施設数(箇所)	0%	50.0%	50.0%	○
指標3	予防保全工事実施率 工事完了した施設数(箇所)／予防保全工事施設数(箇所)	0%	100%	70.6% ※改築時期の見直しを考慮した場合 100%	△ (達成度○)
指標4	50年経過管渠における改築更新実施率 改築更新済み延長(km)／50年経過した管渠(km)	0%	100%	100%	○

今後の 方針	・計画的な事業の実施により、指標1・2・4の目標値を達成した。 ・指標3は、汚水ポンプ場及び水処理センターの老朽度調査の結果、想定よりも老朽化が進んでいなかったことから、改築時期を先送りしたため、目標値を下回っているが、引き続き、適切な時期に改築更新を実施していく。
-----------	---

3. 要素事業の進捗・達成状況 (2)整備計画Ⅱ-1

◆ No. 1 西戸崎処理区

西戸崎処理区全体

A07-005 西戸崎処理区ポンプ場改築

A07-008 西戸崎処理区下水道管渠(耐震化)

下水道区域全体

A07-055 水処理センター耐震補強詳細設計

A07-056 ポンプ場耐震補強詳細設計

A07-057 下水道管渠内調査

A07-058 施設設計見直し等

C07-001 下水道業務継続計画策定



A07-004 志賀島ポンプ場(改築)

A07-007 志賀島ポンプ場(耐震化)

A07-001 西戸崎水処理センター水処理改築

A07-002 西戸崎水処理センター汚泥処理改築


A07-003 西戸崎ポンプ場(改築)

A07-006 西戸崎ポンプ場(耐震化)

凡 例	
	事業計画区域
	水処理センター
	ポンプ場
	枝線整備(画整備)
整備予定箇所の色分け	
	新設工事
	増設工事
	改築更新工事
	番号 実施した事業
	番号 未実施の事業


3. 要素事業の進捗・達成状況 (2)整備計画Ⅱ-1

◆ No. 2 和白処理区

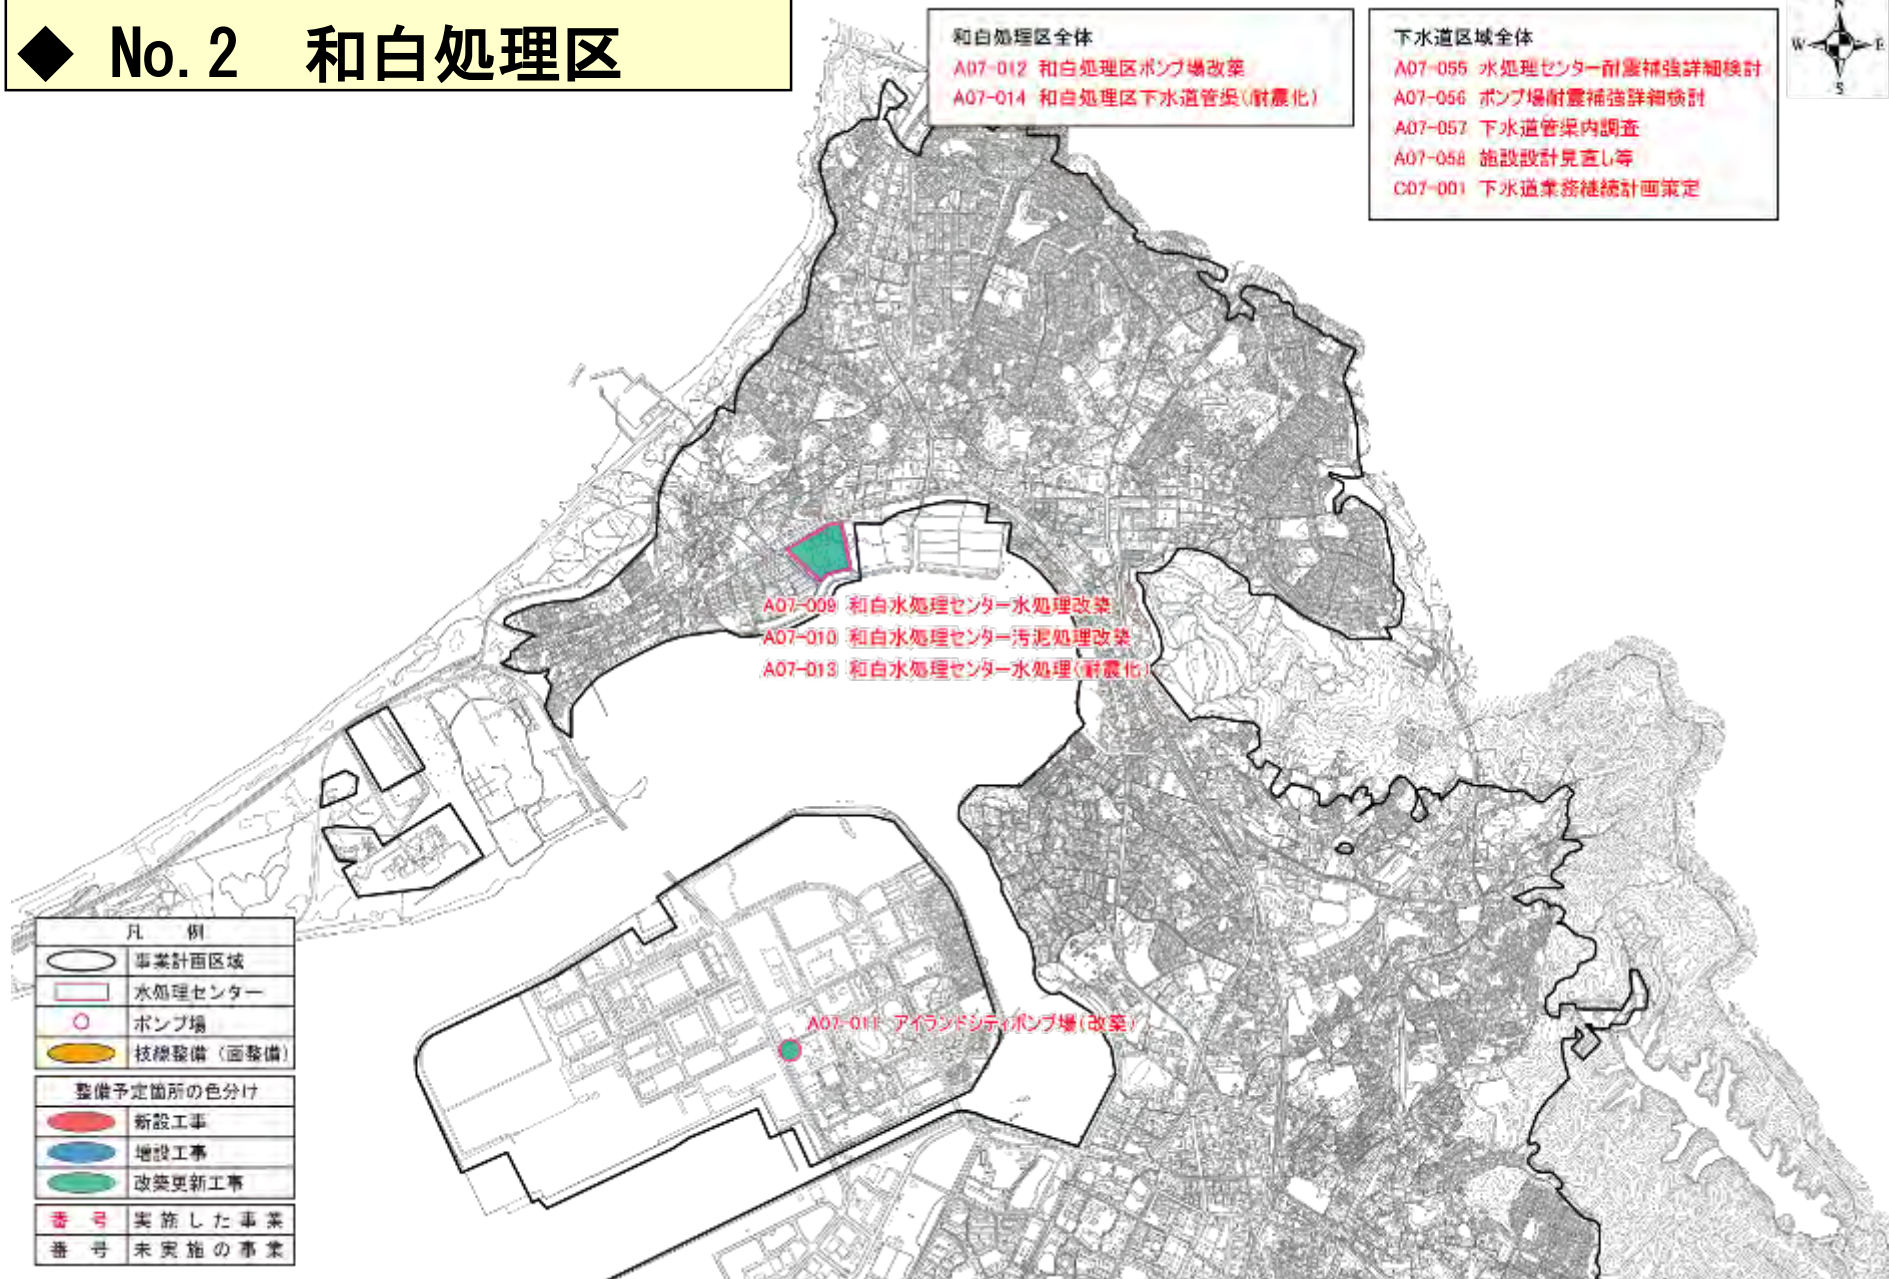

3. 要素事業の進捗・達成状況 (2)整備計画Ⅱ-1

◆ No. 3 東部処理区

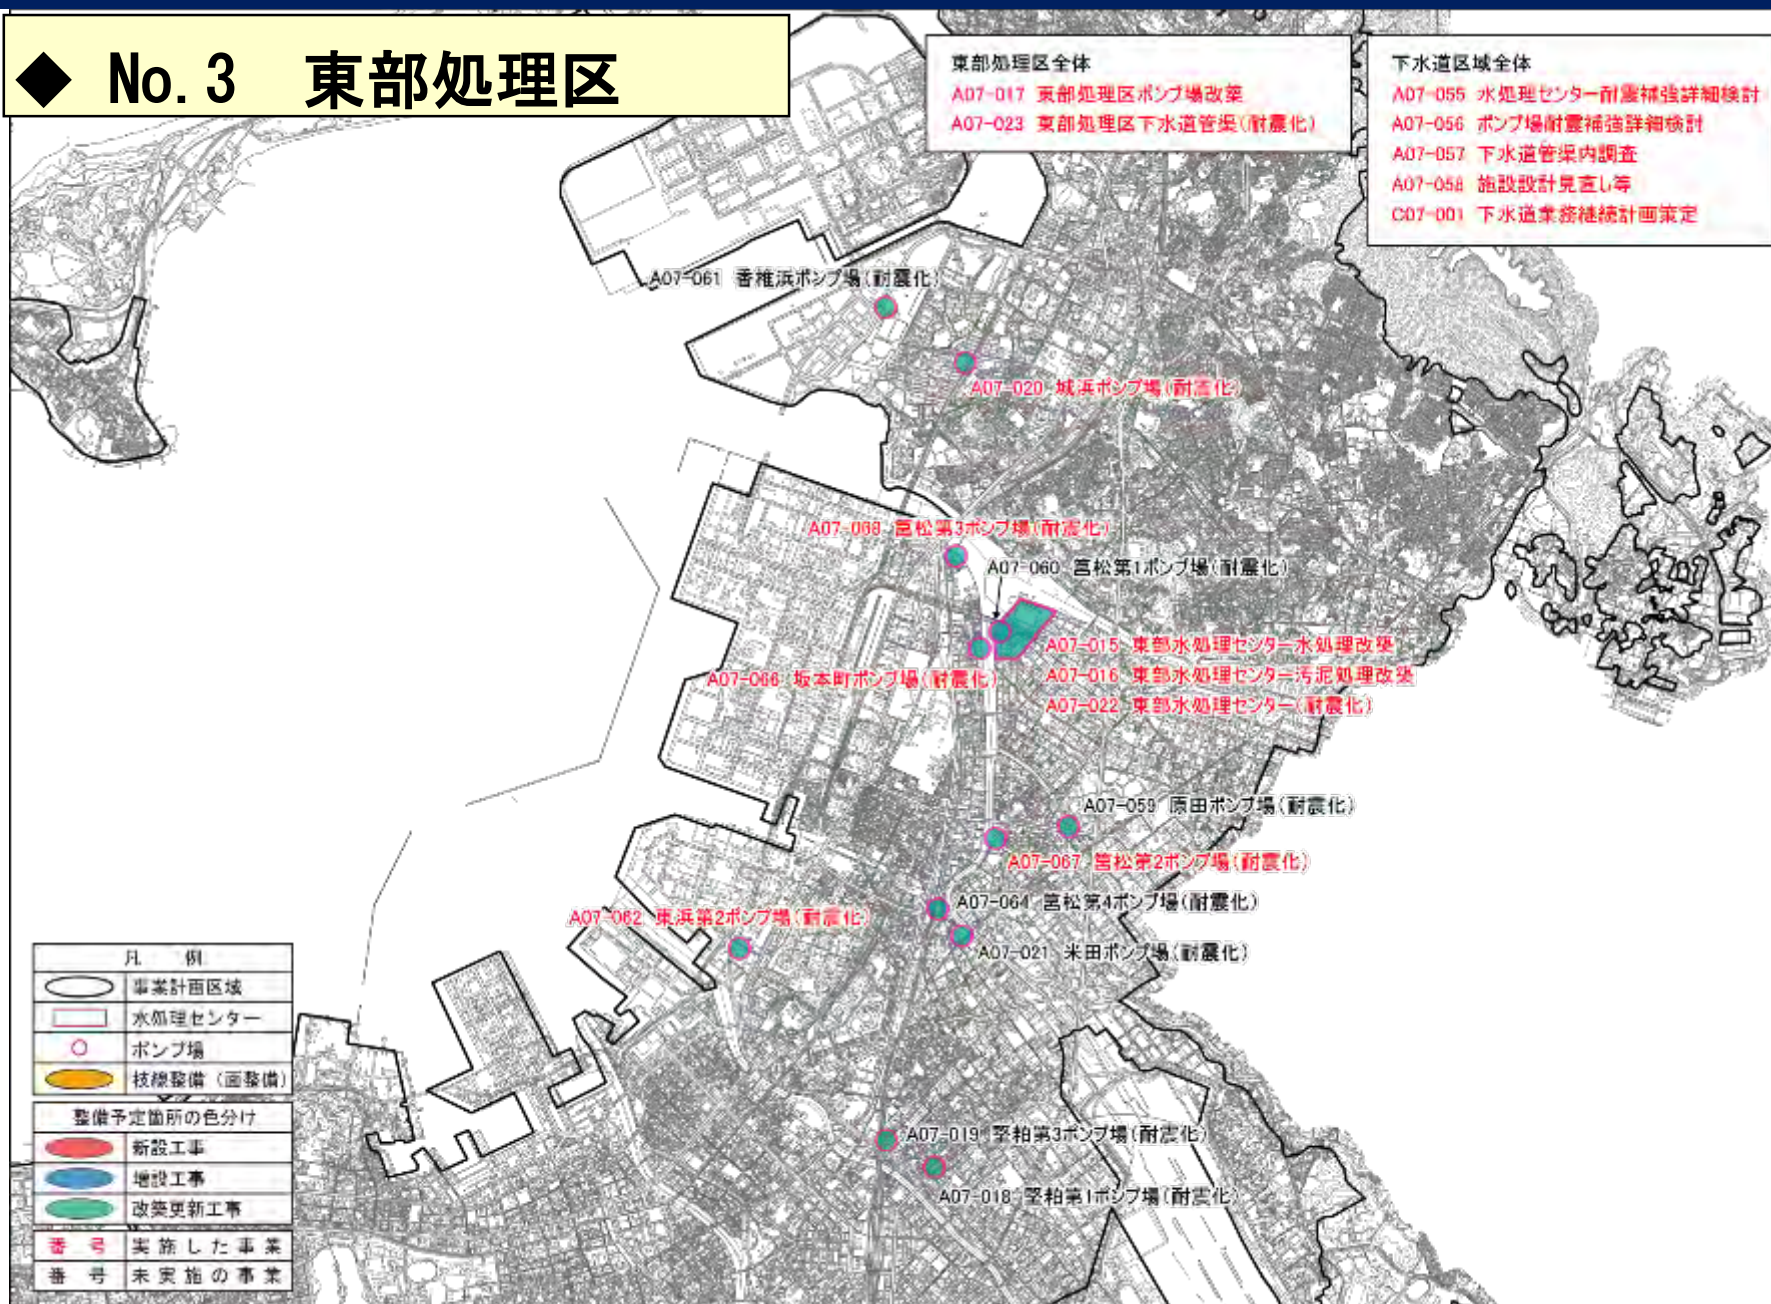

3. 要素事業の進捗・達成状況 (2)整備計画Ⅱ-1

◆ No. 4 南部処理区

南部処理区全体

A07-025 南部処理区ポンプ場改築
A07-027 南部処理区下水道管渠(耐震化)

下水道区域全体

A07-055 水処理センター耐震補強詳細検討
A07-056 ポンプ場耐震補強詳細検討
A07-057 下水道管渠内調査
A07-058 施設設計見直し等
C07-001 下水道業務継続計画策定




A07-024 月隈ポンプ場(改築)
A07-026 月隈ポンプ場(耐震化)

A07-071 東長尾第1雨水幹線

凡 例	
	事業計画区域
	水処理センター
	ポンプ場
	枝線整備(画整備)
整備予定箇所の色分け	
	新設工事
	増設工事
	改築更新工事
	番号 実施した事業
	番号 未実施の事業


3. 要素事業の進捗・達成状況 (2)整備計画Ⅱ-1

◆ No. 5 中部処理区

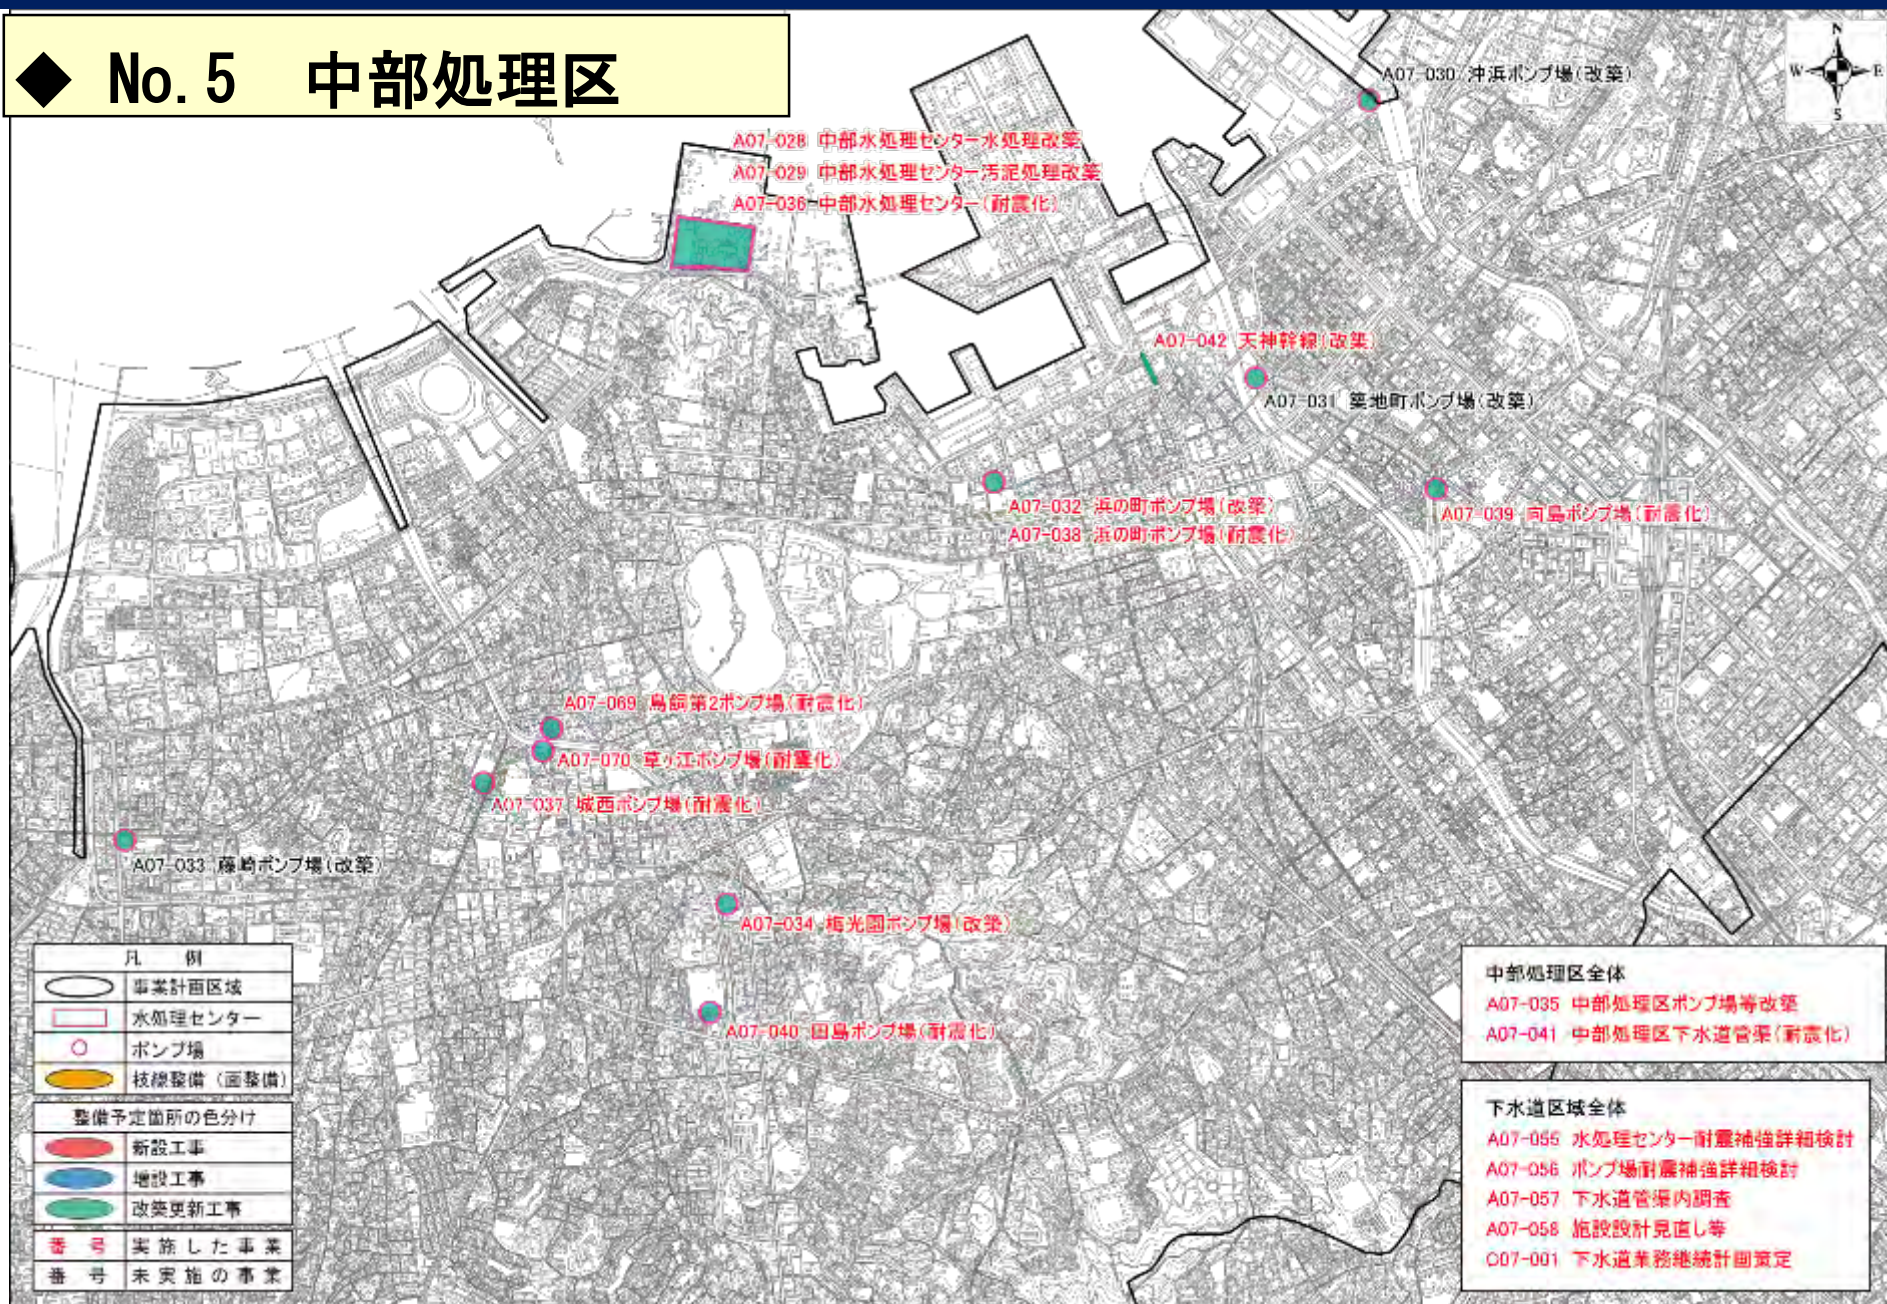

3. 要素事業の進捗・達成状況 (2)整備計画Ⅱ-1

◆ No. 6 西部処理区

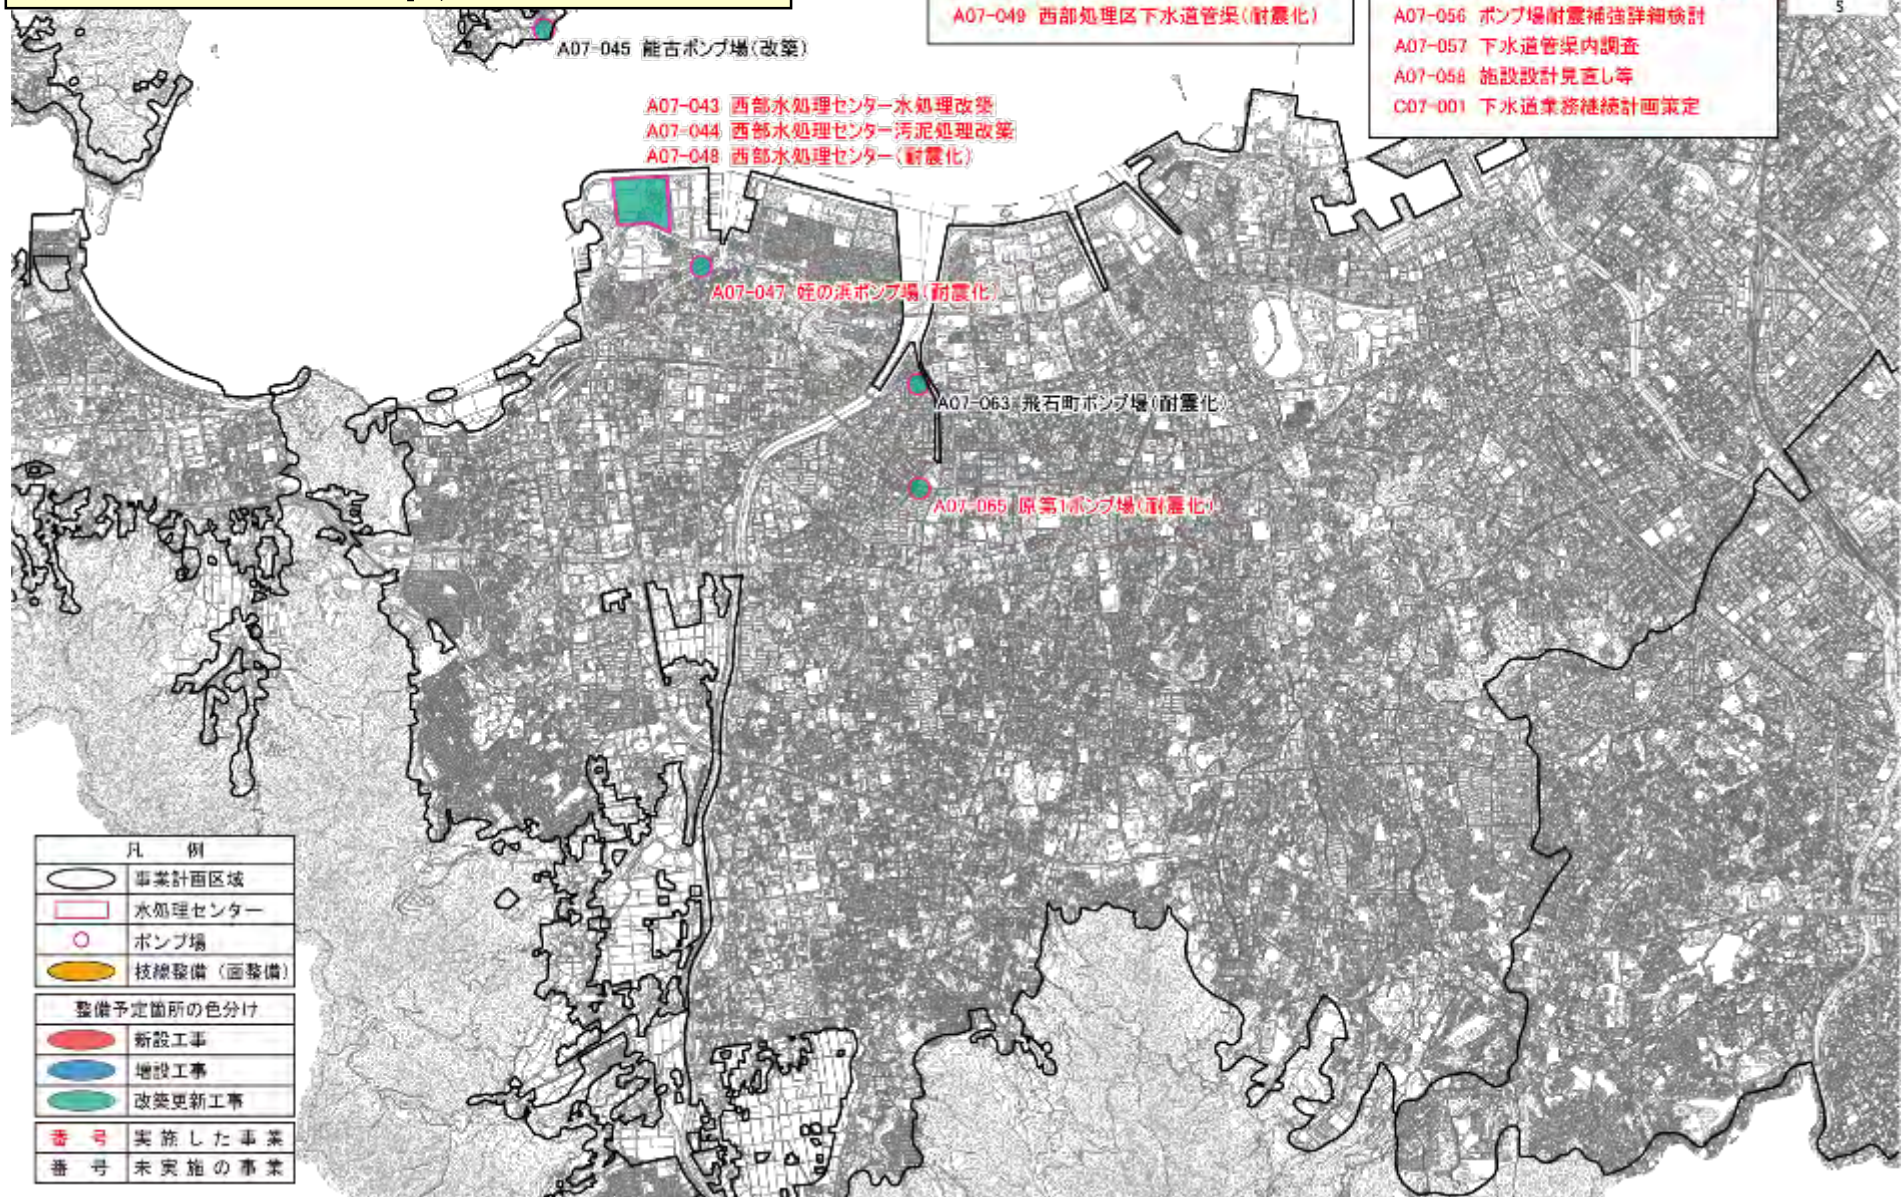

3. 要素事業の進捗・達成状況 (2)整備計画Ⅱ-1

◆ No. 7 新西部処理区

新西部処理区全体
A07-053 新西部処理区ポンプ場改築
A07-054 新西部処理区下水道管渠(耐震化)

下水道区域全体
A07-055 水処理センター耐震補強詳細設計
A07-056 ポンプ場耐震補強詳細設計
A07-057 下水道管渠内調査
A07-058 施設設計見直し等
C07-001 下水道業務継続計画策定

A07-050 新西部水処理センター水処理改築
A07-051 新西部水処理センター汚泥処理改築

A07-052 今宮ポンプ場(改築)

凡 例	
	事業計画区域
	水処理センター
	ポンプ場
	枝線整備(画整備)
整備予定箇所の色分け	
	新設工事
	増設工事
	改築更新工事
	番号 実施した事業
	番号 未実施の事業

3. 要素事業の進捗・達成状況 (3)整備計画Ⅱ-2

整備計画Ⅱ-2『福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現(防災・安全)(重点対策)』
(下水道ビジョンの主要施策:「浸水対策の推進」)

目 標	下水道整備により、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する
事業規模	期間: 令和元年度～令和5年度、 事業費: 約268億円(基幹265億円、効果促進3億円)

指 標		当初 現況値 (R1)	最終 目標値 (R5)	評価値 (R5)	達成度
指標1	下水道による浸水対策実施率 浸水対策の完了面積(ha)／浸水対策を実施すべき面積(ha)	51.1%	53.0%	52.2%	△
指標2	浸水防除機能が確保される面積率 浸水防除機能が確保できている面積(ha)／浸水防除面積(ha)	0%	100%	71.3%	△
		※改築時期の見直しを考慮した場合 100% (達成度○)			

今後の 方針	・指標1は、主に田村地区雨水管整備等において、地元調整や立坑用地選定に時間を要したこと等により完了時期が遅れたため、目標値を下回っているが、引き続き、早期完了に向けて事業を推進していく。 ・指標2は、雨水ポンプ場の老朽度調査の結果、想定よりも老朽化が進んでいなかったことから、改築時期を先送りしたため、目標値を下回っているが、引き続き、適切な時期に改築更新を実施していく。
-----------	--


3. 要素事業の進捗・達成状況 (3)整備計画Ⅱ-2

◆ No. 1 西戸崎処理区



3. 要素事業の進捗・達成状況 (3)整備計画Ⅱ-2

◆ No. 2 和白処理区

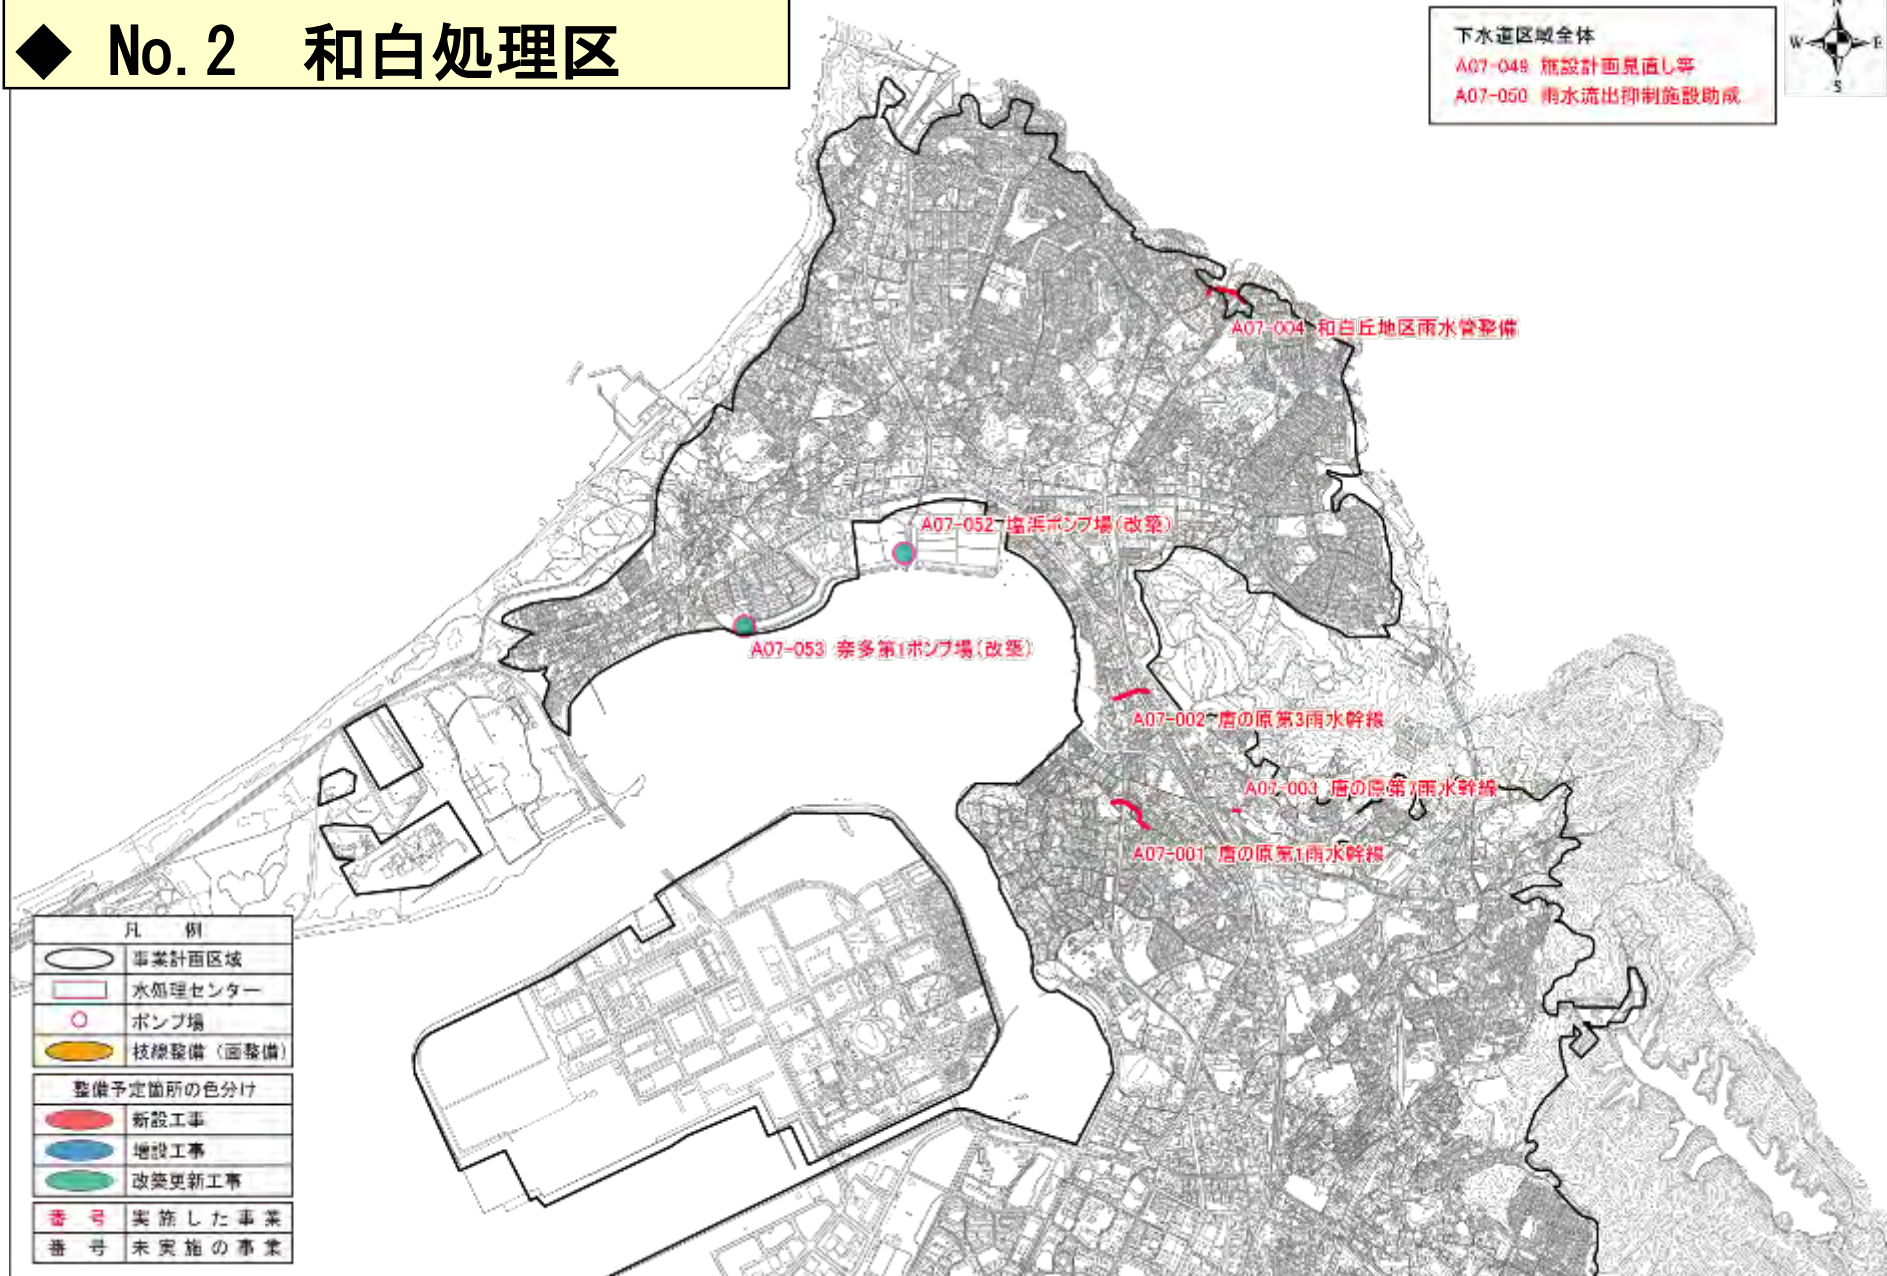


3. 要素事業の進捗・達成状況 (3)整備計画Ⅱ-2

◆ No. 3 東部処理区

番号	施設種別	要素となる事業名
A07-005	雨水	松田地区雨水管整備
A07-006	雨水	原田(2)地区雨水管整備
A07-007	雨水	松島地区雨水管整備
A07-008	雨水	原田(1)地区雨水管整備
A07-054	処理場	東部水処理センター(非常用発電)
A07-056	ポンプ場	松崎第1ポンプ場(改築)
A07-057	ポンプ場	津屋ポンプ場(改築)
A07-058	ポンプ場	笠松第1ポンプ場(改築)
A07-059	ポンプ場	笠松第2ポンプ場(改築)
A07-076	雨水	笠松地区雨水管整備
A07-078	ポンプ場	原田ポンプ場(改築)
A07-079	ポンプ場	坂本町ポンプ場(改築)
A07-082	ポンプ場	笠松第3ポンプ場(改築)


凡 例	
	事業計画区域
	水処理センター
	ポンプ場
	枝線整備(画整備)
整備予定箇所の色分け	
	新設工事
	増設工事
	改築更新工事
	番号 実施した事業
	番号 未実施の事業

下水道区域全体
A07-049 施設計画見直し等
A07-050 雨水流出抑制施設助成

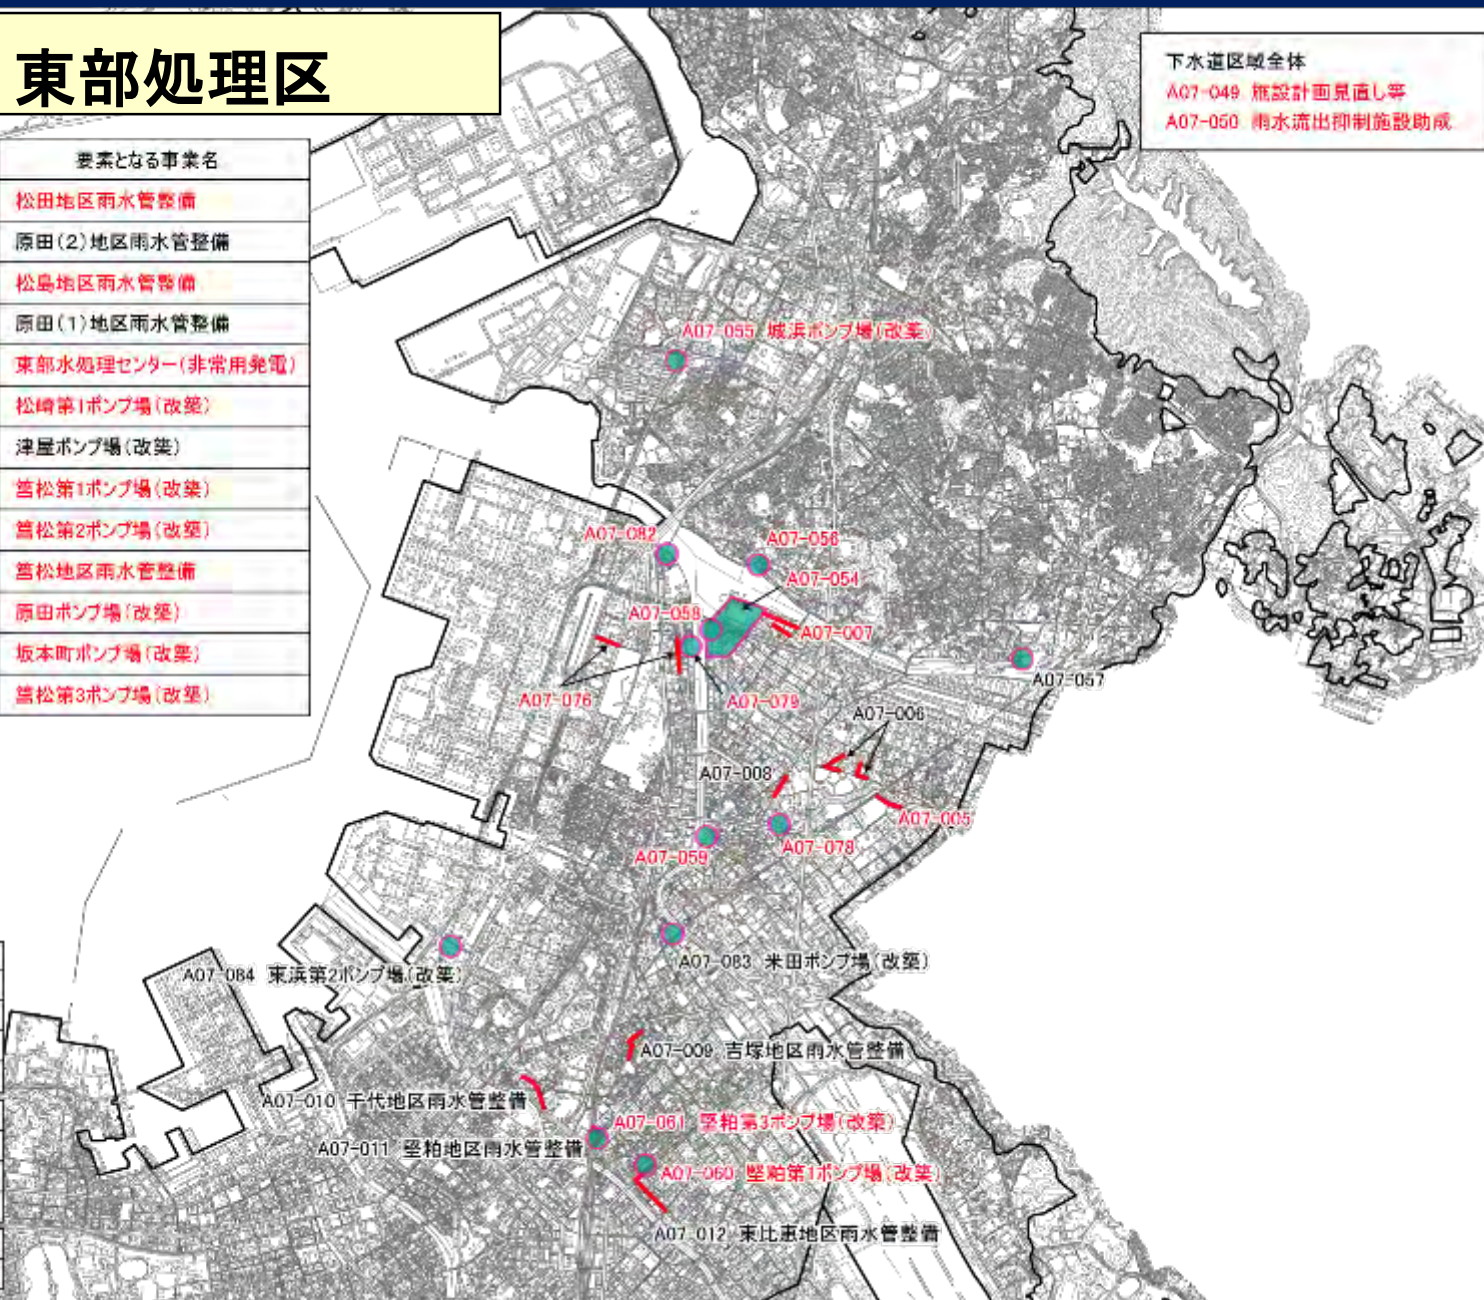

3. 要素事業の進捗・達成状況 (3)整備計画Ⅱ-2

◆ No. 4 南部処理区

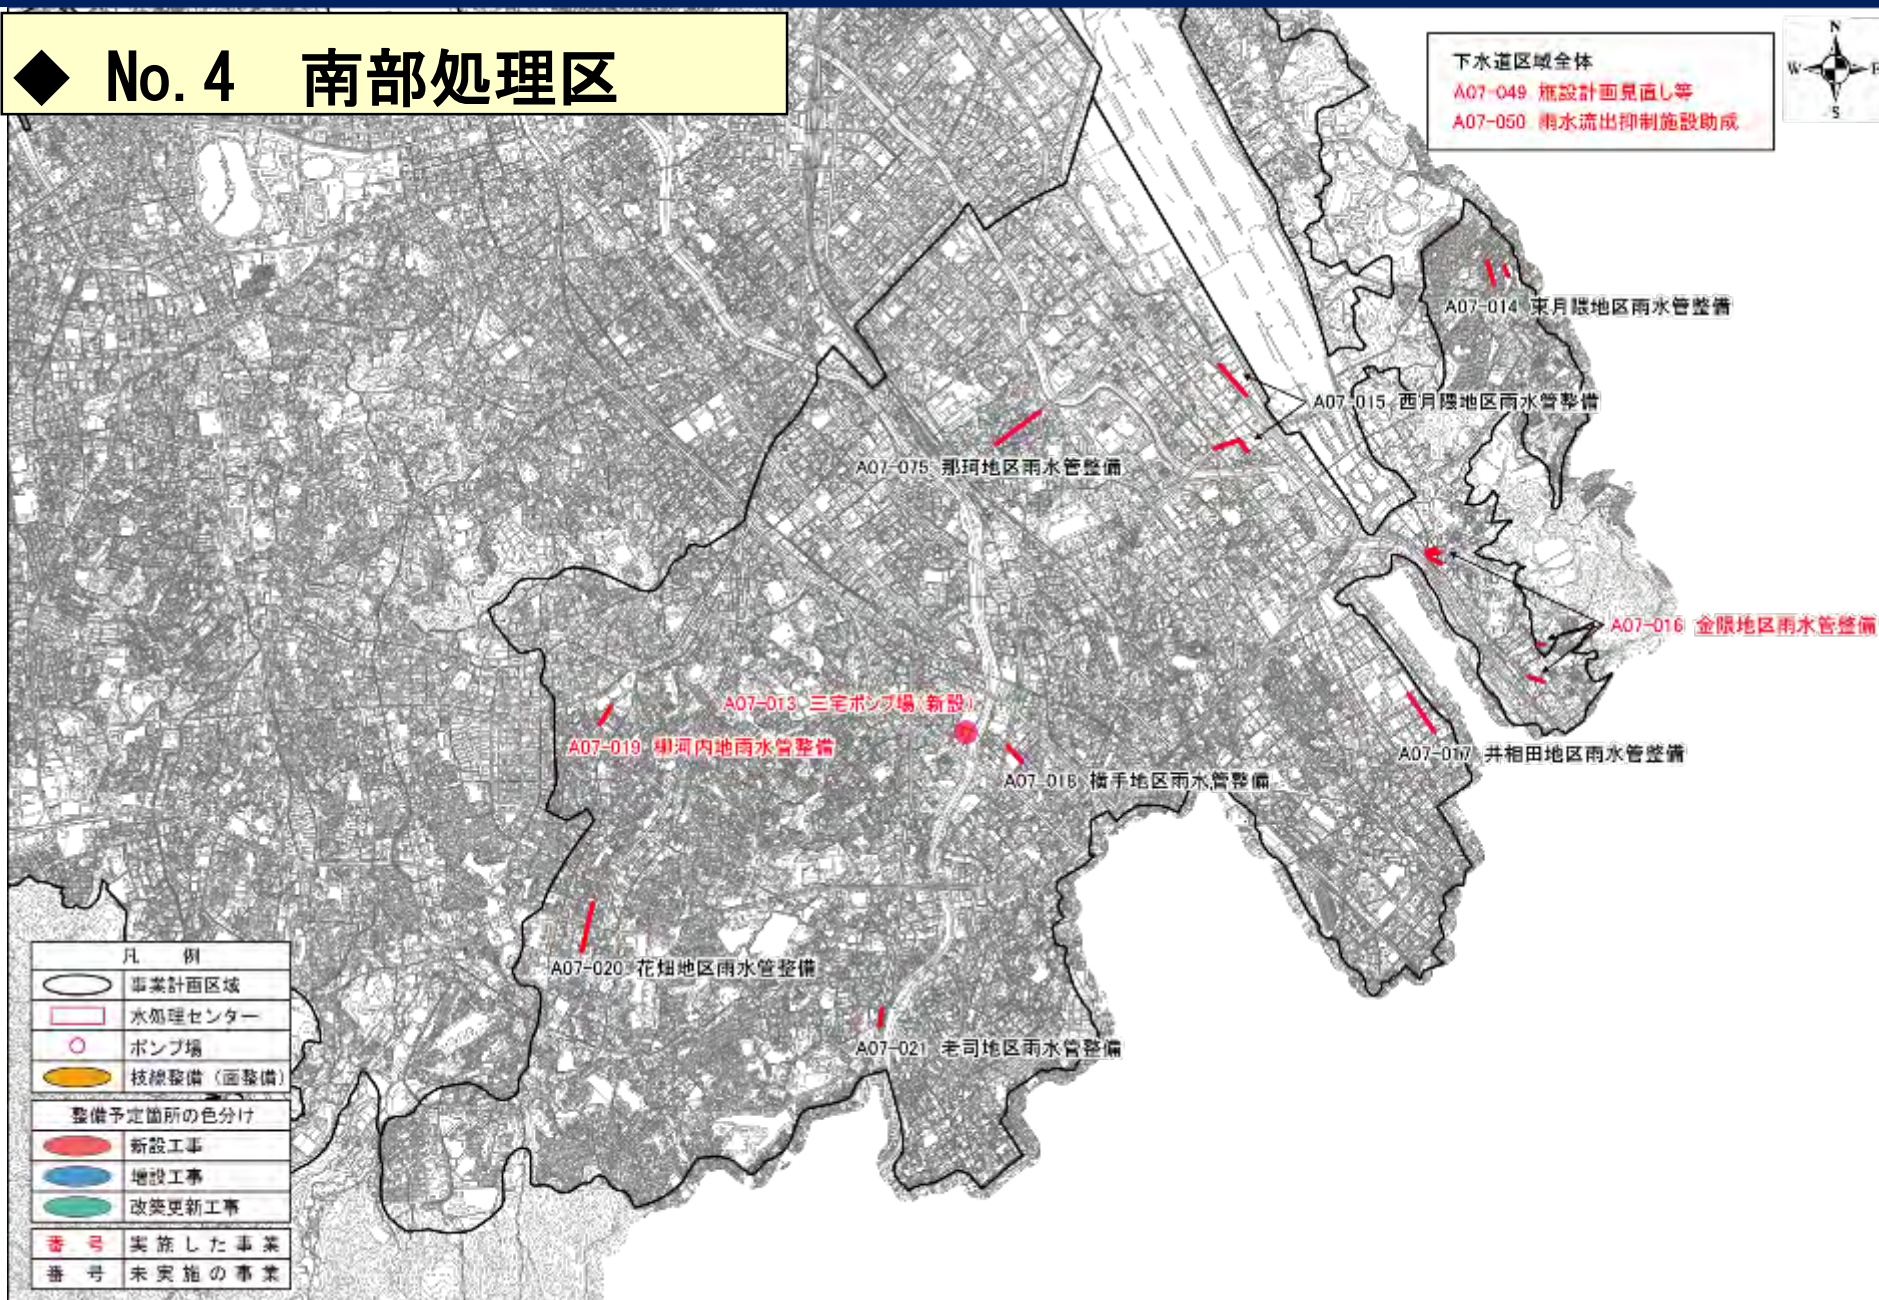

3. 要素事業の進捗・達成状況 (3)整備計画Ⅱ-2

◆ No. 5 中部処理区

番号	施設種別	要素となる事業名
A07-022	雨水	中部5号幹線
A07-023	雨水	中部6・8号幹線
A07-024	雨水	中部9号幹線
A07-025	雨水	中部11号幹線
A07-026	雨水	中部12号幹線
A07-027	雨水	中部13号幹線
A07-028	雨水	中部15号幹線
A07-029	雨水	天神外地区準幹線
A07-030	雨水	浸透施設
A07-031	雨水	上呉服地区雨水管整備
A07-032	雨水	下川端地区雨水管整備
A07-033	雨水	上川端地区雨水管整備
A07-034	雨水	中洲地区雨水管整備
A07-035	雨水	港地区雨水管整備
A07-062	ポンプ場	博多駅東ポンプ場(改築)
A07-063	ポンプ場	向島ポンプ場(改築)
A07-085	ポンプ場	博多駅北ポンプ場(改築)
C01-003	-	排水設備の設置推進

下水道区域全体

A07-049 施設計画見直し等

A07-050 雨水流出抑制施設助成


C07-001 雨水・水位情報システムの構築

C01-002 内水ハザードマップの作成

凡 例	
	事業計画区域
	水処理センター
	ポンプ場
	枝線整備(画整備)


整備予定箇所の色分け	
	新設工事
	増設工事
	改築更新工事

	番号	実施した事業
	番号	未実施の事業

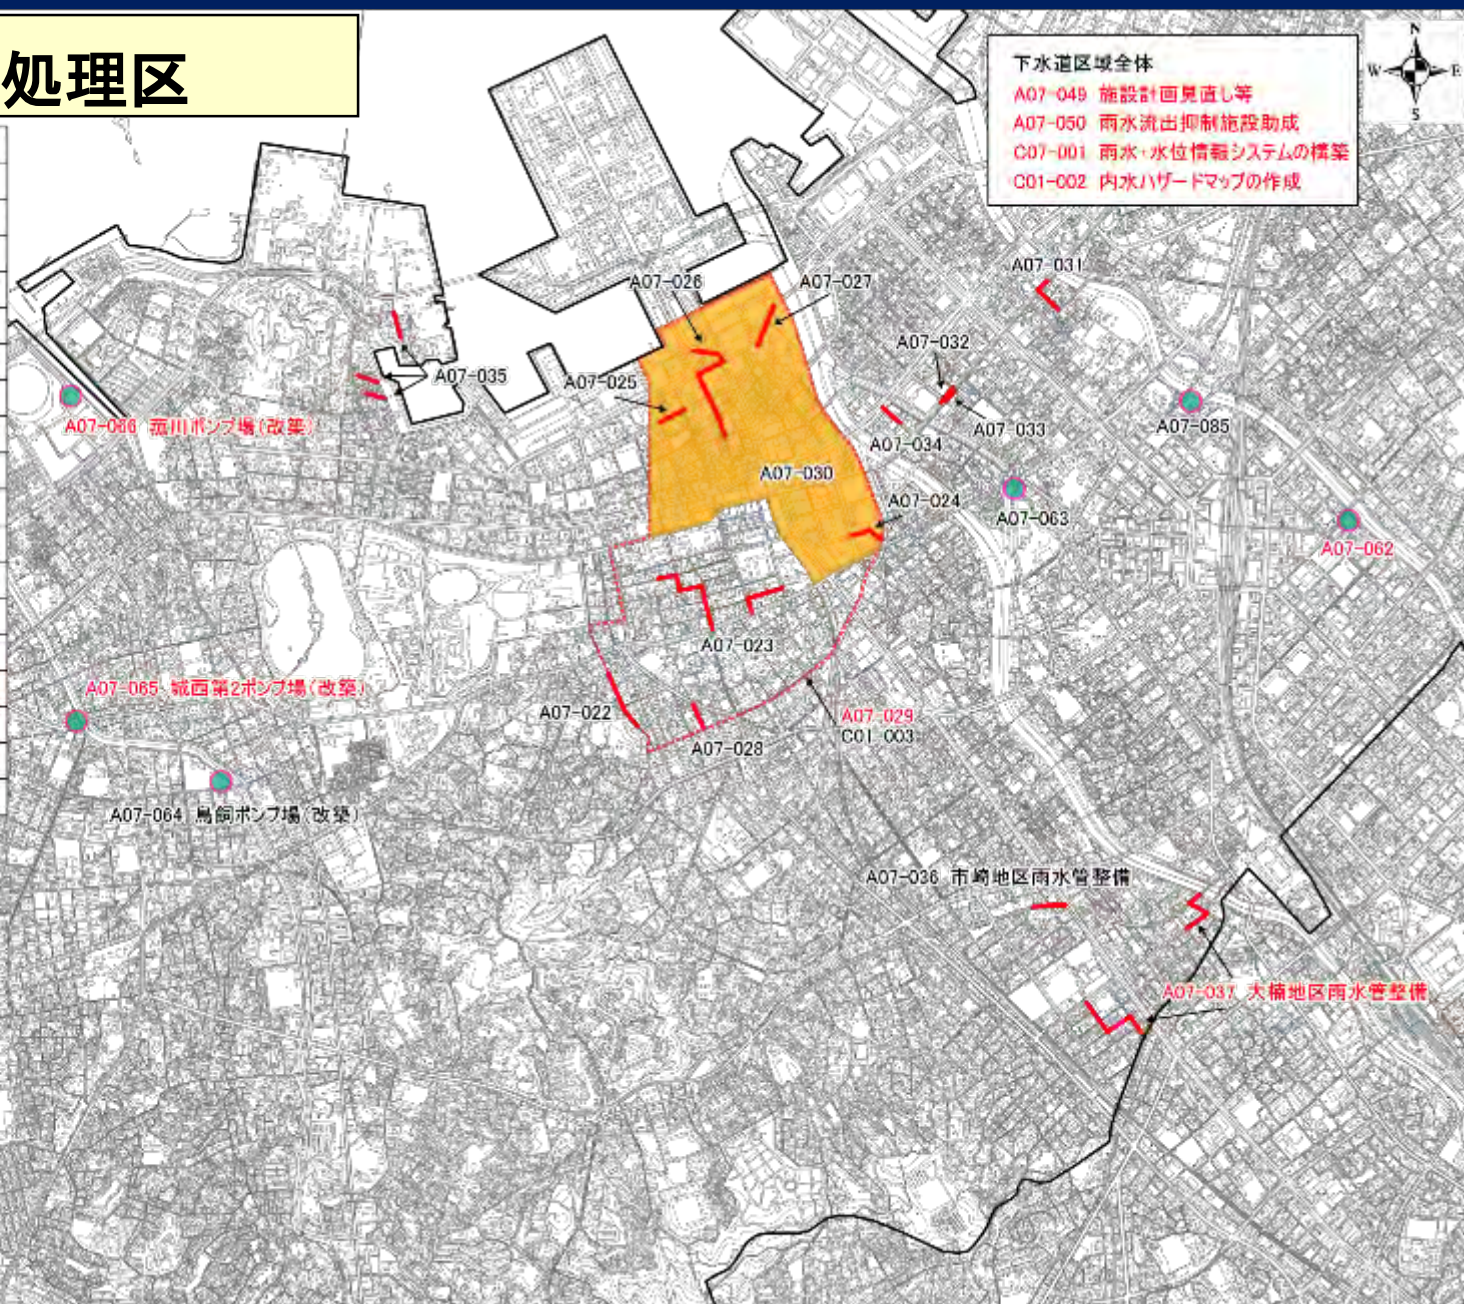


3. 要素事業の進捗・達成状況 (3)整備計画Ⅱ-2

◆ No. 6 西部処理区

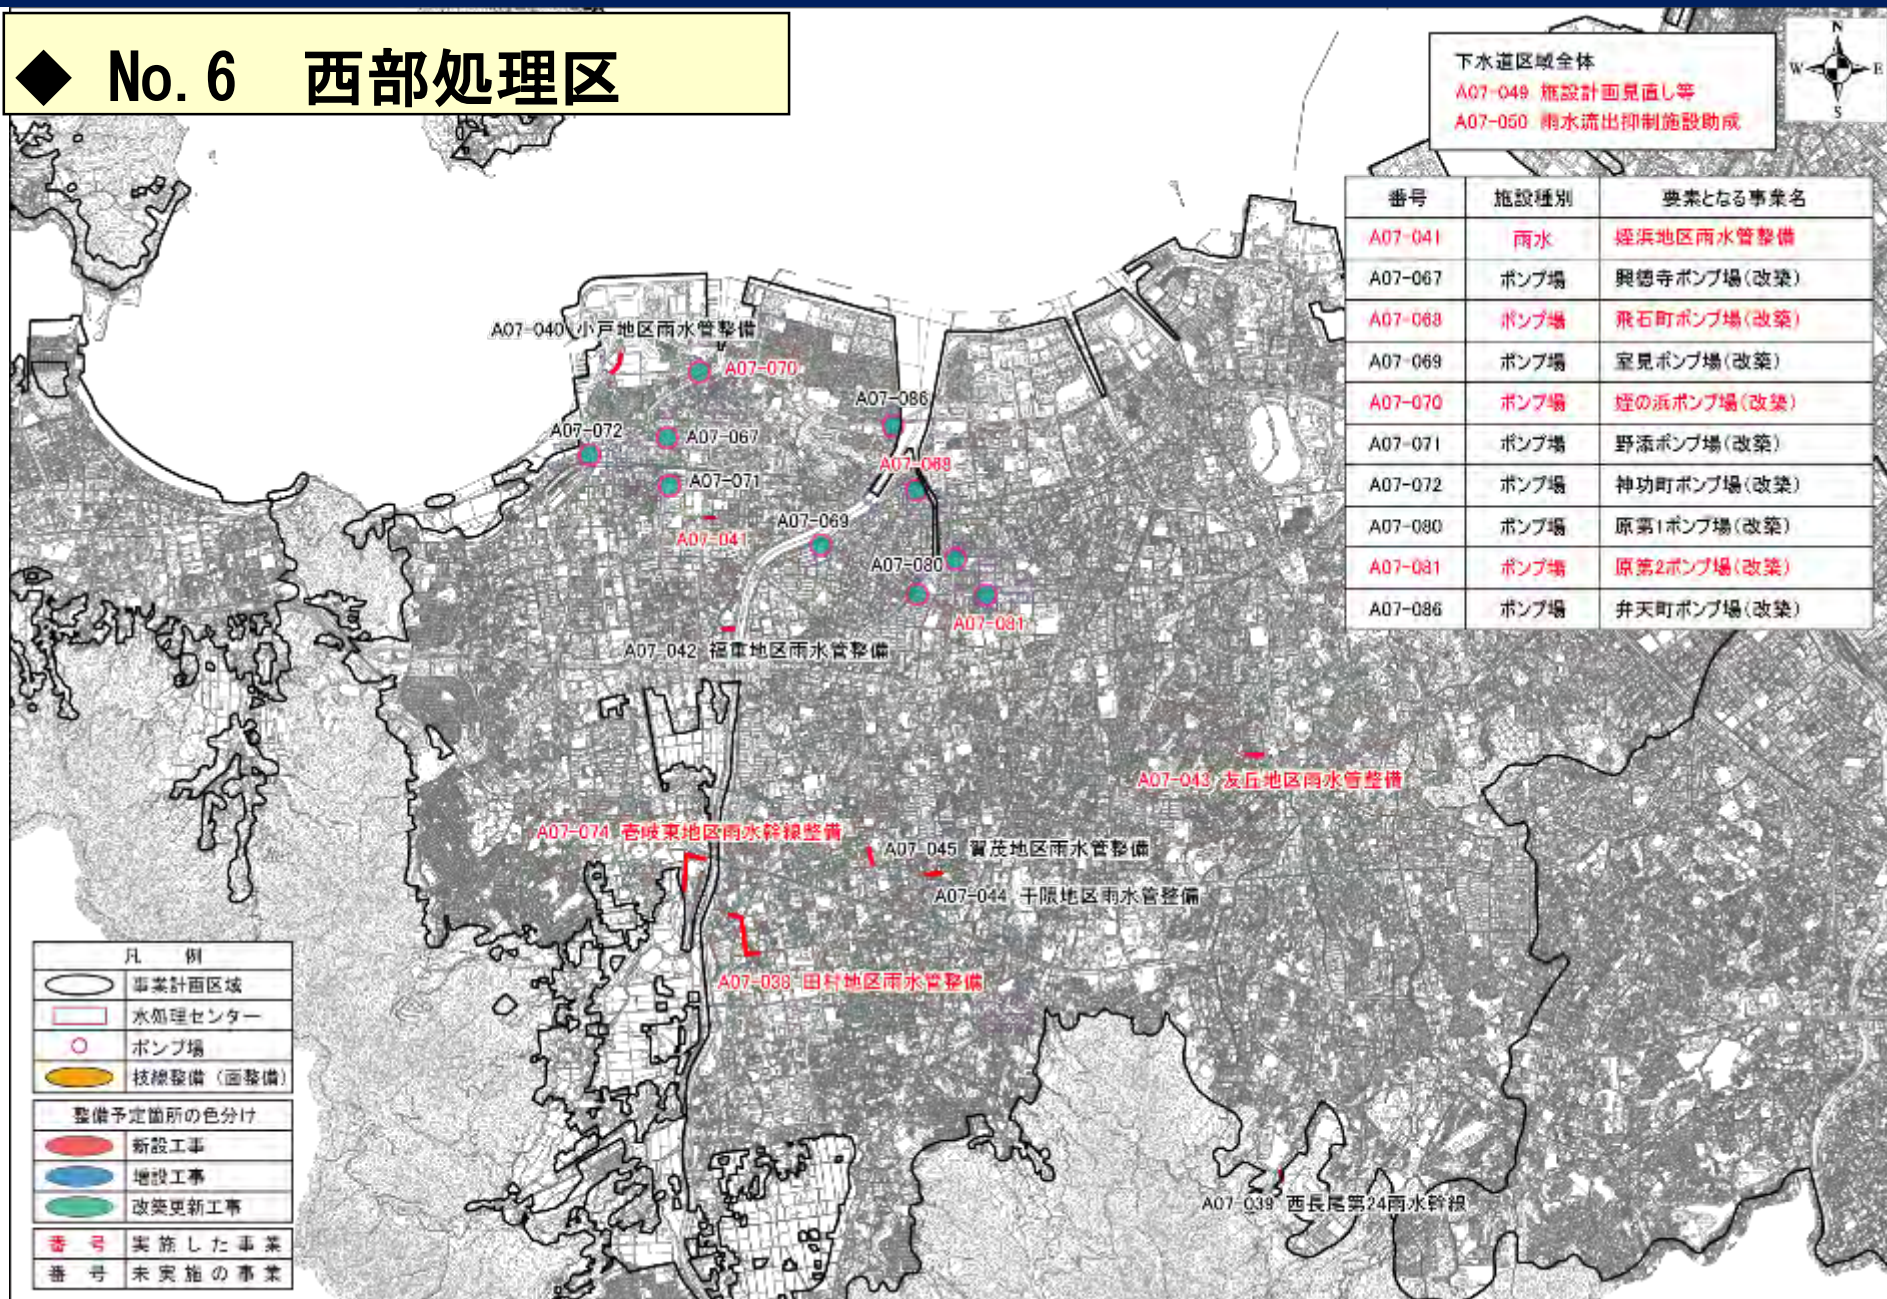

3. 要素事業の進捗・達成状況 (3)整備計画Ⅱ-2

◆ No. 7 新西部処理区

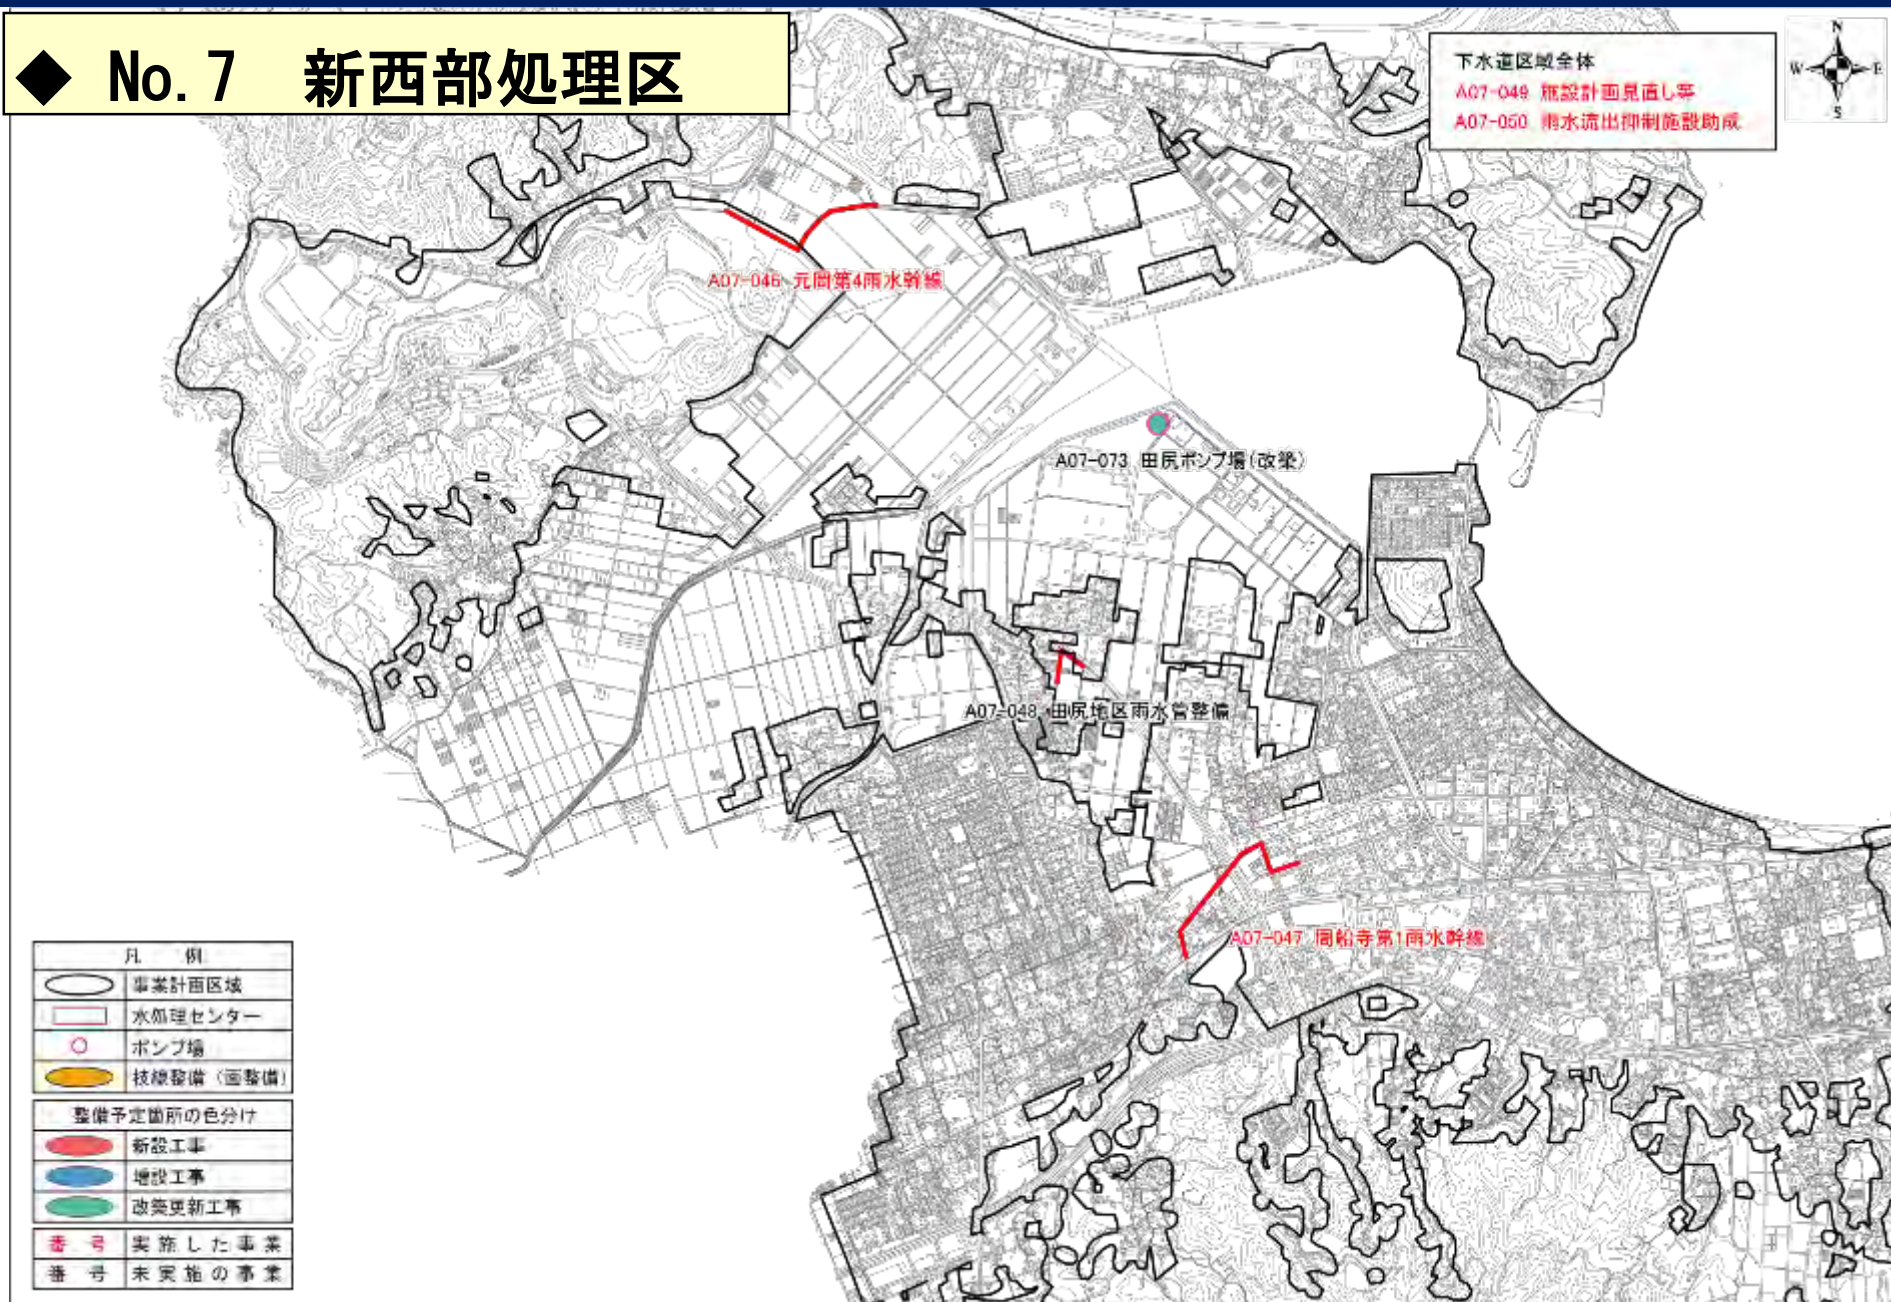

3. 要素事業の進捗・達成状況 (4)整備計画Ⅲ

整備計画Ⅲ『福岡市における良好な水環境の創造』 (下水道ビジョンの主要施策：「下水処理水の有効利用」)

目 標	再生水利用により、良好な水環境を創造する
事業規模	期間：令和元年度～令和5年度、 事業費：約17億円(基幹17億円)

指 標		当初 現況値 (R1)	最終 目標値 (R5)	評価値 (R5)	達成度
指標1	再生水供給面積 ※	1,485ha	1,540ha	1,528ha	△

※福岡市再生水利用下水道事業に関する条例(第3条 再生水の供給区域等)

・再生水を供給する区域は、節水条例第9条第1項に規定する雑用水道設置促進区域とする。


※福岡市節水推進条例(第9条 雑用水道設置促進区域)

・市長は、事業所その他の施設が集中して設置されている地域又は設置されることが想定される地域であって、当該地域における水の需要が多く、当該地域において特定用途に使用される水を雑用水とすることによって節水を効果的に推進することができると認められる地域を、雑用水道設置促進区域として指定することができる。

今後の 方針	・指標1は、九州大学箱崎キャンパス跡地のまちづくりの事業進捗にあわせて再生水供給面積を拡大した結果、想定よりも事業進捗が遅れたため、目標値を下回っているが、引き続き、まちづくりの事業進捗にあわせて再生水供給面積を拡大していく。
-----------	---

3. 要素事業の進捗・達成状況 (4)整備計画Ⅲ

◆ No. 1 中部処理区

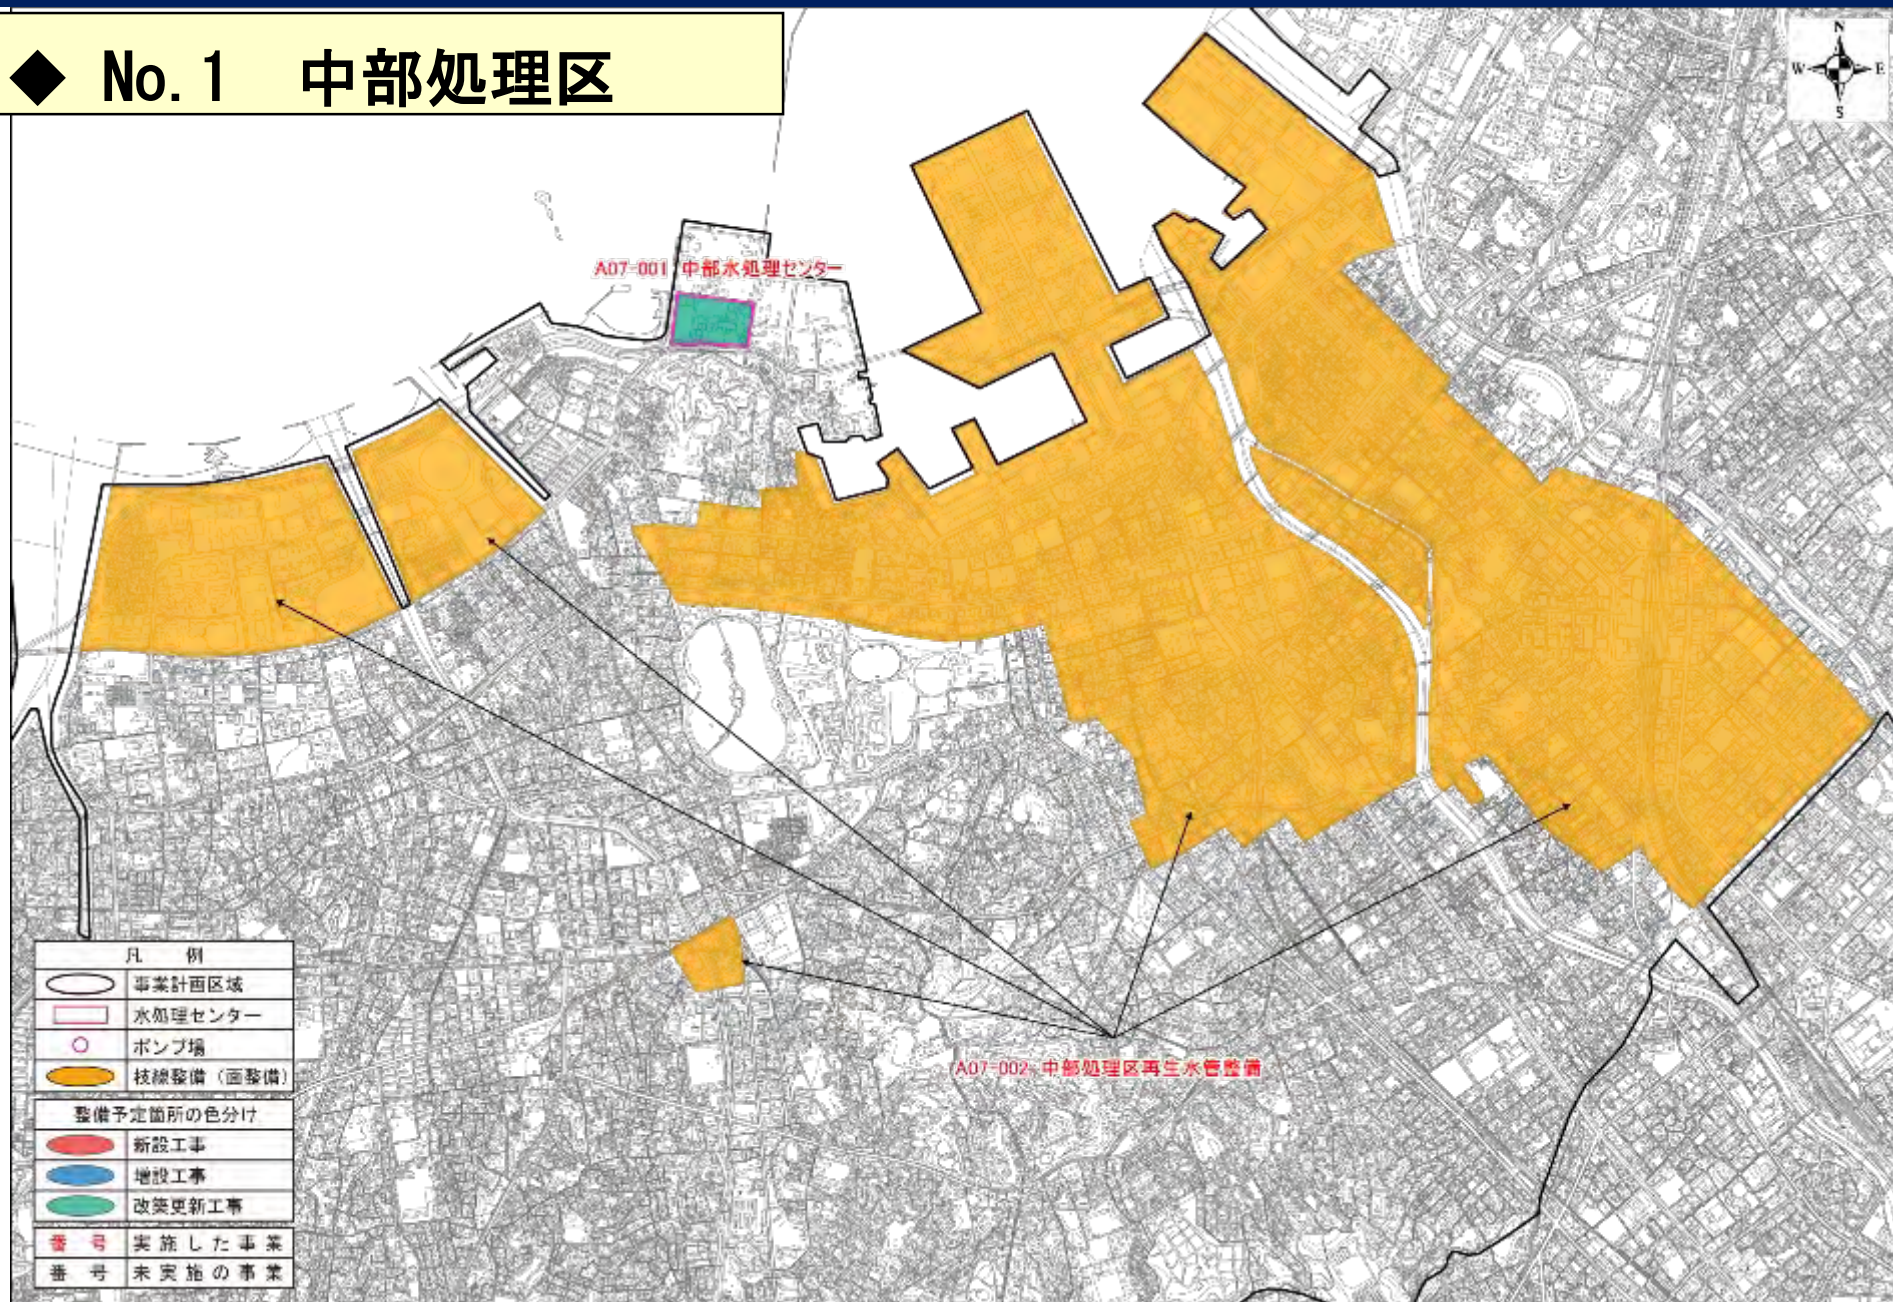

3. 要素事業の進捗・達成状況 (4)整備計画Ⅲ

◆ No. 2 東部処理区

