

福岡市立病院機構における
重要課題の進捗状況について

- 1 新病院の建設状況について
- 2 「ふくおかハウス」の建設について
- 3 「ふくおかハウス」建設募金活動状況
- 4 福岡市民病院の別館建設について

新病院・ふくおかハウスについて

1. 新病院の建設状況について

(1) 開院までのスケジュール

平成24年度						平成25年度												平成26年度											
10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
設計 (確認申請等)		着工	基礎工事				本体工事																		竣工	開院			
運営等検討																							引越し 開院リハ ーサル	院					
・運営基本計画 ・医療機器・情報システム調達 ・医療関連委託 ・開院準備																													

(2) 建設現場の状況について



建設現場全景（アイランドタワー15Fより平成25年12月撮影）




4階屋上庭園の一部)の工事の様子



1階の工事の様子



工事の外観（南面）

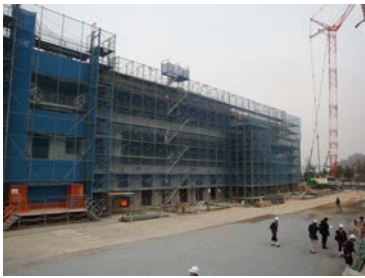


工事の外観（南面）



工事の外観（東面）

(3) 位置図・配置図

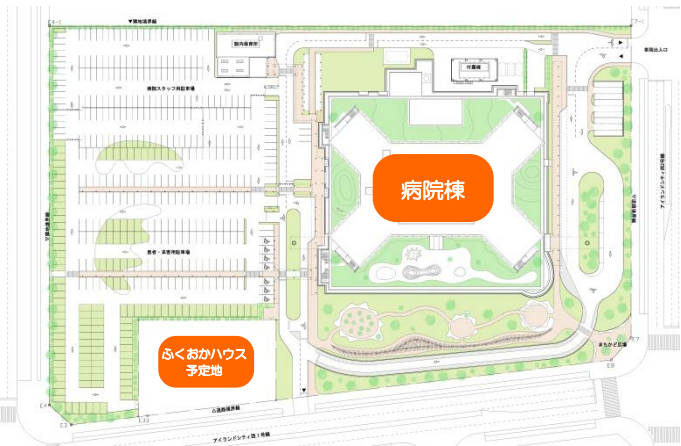

2. 「ふくおかハウス」の建設について

(1) 施設概要

- 場 所 福岡市東区香椎照葉5丁目26番39 福岡市新病院敷地内
- 規 模 16部屋、1,500㎡程度
キッチン、リビング、プレイコーナー、多目的室（図書室）他
- 名 称 「Donald・MacDonald・House ふくおか」（「ふくおかハウス」）
- 開設時期 平成26年11月（予定）
- スケジュール

平成25年度												平成26年度											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
設計(確認申請等)												建設工事											
												準備											
「ふくおかハウス」建設募金												開設											



3. 「ふくおかハウス」建設募金活動状況（12月末日現在）

（1）募金活動の取り組み状況

○周知活動・・・リーフレット配布約 42,500 枚

ポスター掲示約 180 枚（うち、地下鉄 19 駅などで掲示）

ホームページ約 16,500 アクセス

○報道・・・・・・新聞記事掲載

朝日	5月 2日	朝	新こども病院に家族滞在施設
	8月 9日	朝	ふるさと納税 お返し手厚く
西日本	5月 2日	朝	家族宿泊施設建設に募金を
	8月14日	朝	ふるさと納税急増 4 ヶ月で最多更新
	8月17日	朝	Jクラブと連携 街頭募金 建設費集めに奔走
	8月19日	朝	宿泊施設へ募金活動
	8月29日	朝	久山の少年野球チームが寄付
	9月25日	朝	亡き子思い 支援金リレー
	10月 4日	朝	こども病院に 43 万円寄付
	10月24日	朝	タレントの福田さん新こども病院へ寄付 家族滞在施設建設に
日経	5月 1日	夕	こども病院に滞在施設
	9月25日	朝	病児の家族滞在施設に
毎日	5月 2日	朝	建設費 2 億円は募金で
	9月25日	朝	福岡市に 5,000 万円寄付
	10月 8日	朝	付き添い家族の施設に
読売	5月11日	朝	こども病院に宿泊施設
	8月19日	朝	こども病院併設の家族用宿泊施設「ふくおかハウス」募金呼びかけ
	9月25日	朝	患者がひと息つける施設を
他	10月 3日	朝	[スポーツ報知] モーターボート選手会福岡支部 43 万円寄付

○募金活動・・・天神街頭、博多どんたく港まつり会場、福岡銀行本店、ヤフオクドーム、天神涼園地、レベルファイブスタジアム、アイランドシティ、福岡ポート、本城陸上競技場（北九州市）、各種団体総会などで計 21 回実施

○募金箱設置・・・5ヶ所設置（計 6 個）

○募金額・・・・・・ 8,270 万円余（12 月末判明分まで）

○「ふくおかハウス」建設募金活動の様子



博多どんたく港まつり会場での募金活動



ヤフオク！ドームでの募金活動



福岡銀行本店広場での募金活動



レベルファイブスタジアムでの募金活動

（2）今後の取り組みについて

今後、引き続き、周知活動を通して「ふくおか応援寄付」を利用した寄付を呼び掛けていくとともに、企業・団体を中心に寄付の依頼を行っていく。

4. 福岡市民病院の別館建設について

(1) 別館増築の趣旨

新興感染症発生時に迅速に対応できる感染症専用病床（4床）の新設や、狭隘化した救急部門を拡充し増加傾向にある救急搬送への対応等を行うため、病院駐車場に別館を増築するもの。

(2) 別館増築工事の契約概要

契約業者 福岡市博多区博多駅前1丁目31番17号
株式会社サンコービルド 代表取締役 園村 剛二
契約金額 503,685,000円（うち取引に係る消費税額 23,985,000円）
契約日 平成25年9月30日
工期 平成25年10月1日から平成26年3月25日まで（予定）

(3) 工事スケジュール

11月	12月			1月	2月以降
19～	上旬	中旬	下旬		
駐車場仮囲い閉鎖	杭打ち	土工事	コンクリート工事	型枠工事 鉄筋工事 他	本館改修 他

(4) 工事開始による影響と対策（図参照）

1. 駐車場について

別館工事に伴い、平成25年11月19日より第1駐車場及び第2駐車場を閉鎖し、病院北側の吉塚駅第2立体駐車場を、代替駐車場として活用。（外来患者については、2時間まで無料。）

2. 救急搬送について

従来は救急車が第1駐車場へ入り、北玄関より救急診療室に患者搬送を行っていたが、北玄関を閉鎖したことから、正面玄関へ救急車を乗り入れ、患者搬送を行う。

