


公共工事等事故情報

| | | | | | | | |
|------|--|------|--------------------------|-------|--|---------|-----|
| 事故分類 | 物損公衆災害 | 発生日時 | 令和 5年12月 18日(月曜日) 13時15分 | | | 工事関係者区分 | 元請け |
| 事故区分 | 埋設物等損傷 | 性別 | ——— | 年齢 | ——— | 業種区分 | 土木 |
| 被災程度 | 照明灯用電線管路破損 | | | 事故レベル | I | 休業見込日数 | ——— |
| 工事概要 | 植栽工事 | | | | | | |
| 事故概要 | 植栽帯高木部分をバックホウ掘削作業中、埋設標識シートが出てきたため、人力作業にて確認しながら作業を行っていた。しばらく作業を進めたが、標識シートの近くに管路が見当たらなかったため、安全だと思われる部分をバックホウにて掘削したところ、バケットの先端部分が照明灯ケーブルに触れ、管路を引き込んでしまった。 | | | | | | |
| 事故原因 | 埋設標識シートの付近を全て人力にて掘削作業を行わなかったことが原因である。 | | | | | | |
| 改善策 | 受注者 | | | | 福岡市 | | |
| | 掘削作業において、埋設標識シートの有無を確認すると共に、発見した場合は、周辺全て人力作業で掘削を行う。 | | | | 当課が発注し、稼働している施工業者に対して、本件事例の共有及び過去の事故事例並びに事故防止について周知を行った。 | | |

事故状況図

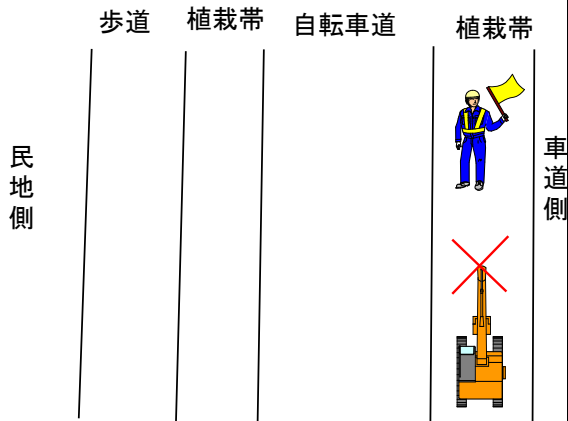

改善状況図

