


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	2023/12/27			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	断水1件			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	取付管及びます工付帯工						
事故概要	路盤開放していた試掘箇所において、仮復旧を行うため、バックホウにて掘削を行っていたところ、給水管(φ25PP管)をバケットにて引っ掛け、破損させてしまった。						
事故原因	試掘で給水管の位置が確認できていたが、事故発生日、現場代理人は地下埋設物の確認を怠っており、バケットにて給水管を破損させた。地下埋設物位置の確認不足が事故原因である。						
改善策	地下埋設協議の記録の周知徹底と現地マーキングを行う。						

事故状況図

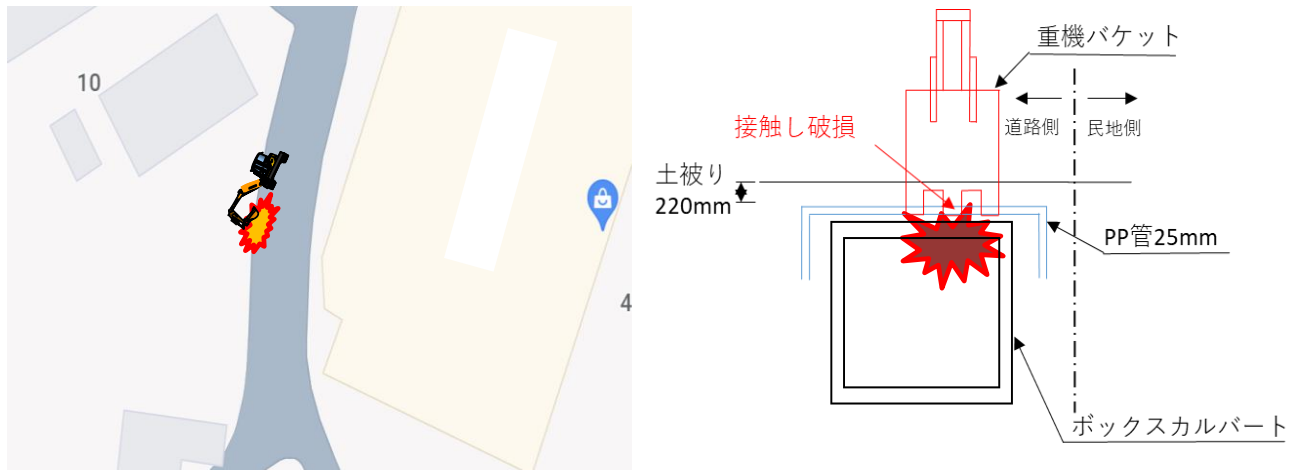

改善状況図

