


公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和 6年 2月 22日(木曜日) 15時 00分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他	性別	男性	年齢	54	業種区分	土木
被災程度	左手首骨折、左足切創			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	8日
工事概要	推進工事						
事故概要	地上より約3.0m地下の立坑の止水壁に生コンを打設しようと、バックホウ0.2m ³ (0.9t吊り)で生コンを入れたホッパーを吊り上げ旋回したところ、転落防止柵に接触し、バックホウがバランスを崩し傾き、オペレーターが転落防止柵もしくは立坑矢板に接触し負傷したもの。						
事故原因	本工事はため池工事であり、当日、雨天となり急ぎ作業を終えようと運転者が操作を急いだため、吊り荷を吊り上げた状態でアームを急旋回したことでバランスを崩し、バックホウが転倒したのと考えられる。						
改善策	規格に余裕がある重機を使用する。 朝礼時や工事中に焦らずに落ち着いて作業するよう声掛けや注意喚起を行う。						

事故状況図

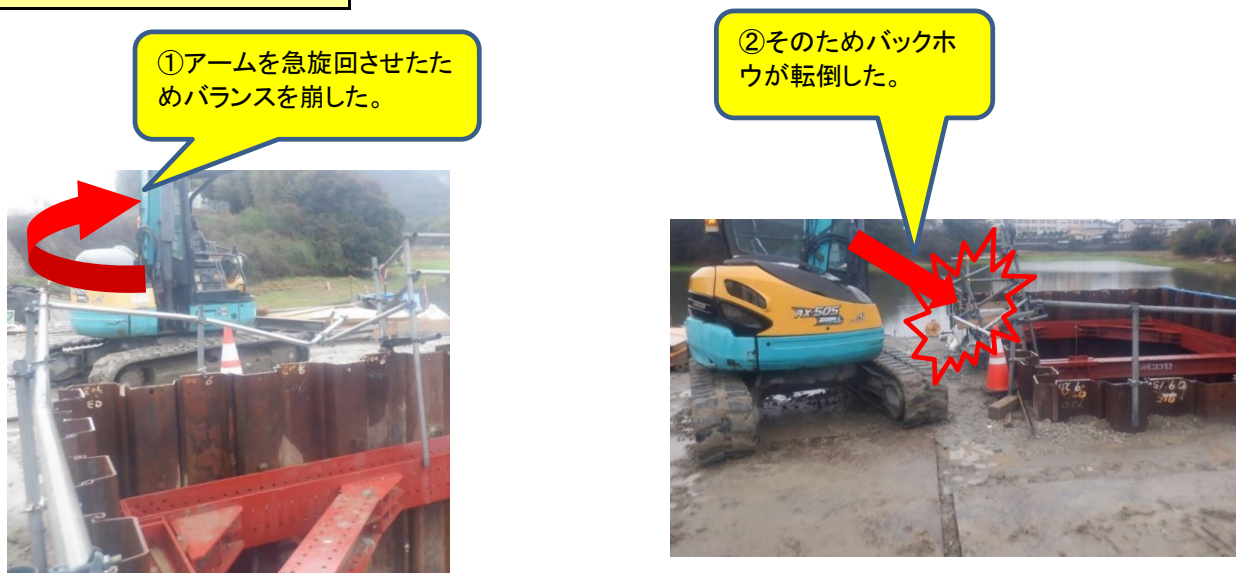

改善状況図

余裕がある規格の重機に変更

