

# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 6年 6月 20日(木曜日) 14時 10分			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	事故発生箇所での漏水			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	建物解体工事						
事故概要	仮囲い設置のため、単管を打ち込む作業中地中の埋設給水管(φ150)を破損させ漏水が生じた。						
事故原因	現地にての埋設配管経路及び標示杭(鋌等)の確認を徹底していなかった。						
改善策	再発防止協議及び現地マーキングを実施し、埋設配管経路標示杭(鋌等)の確認を徹底する。不明な場合は、監督員への連絡を行い協議のうえ施工する体制を整える。						

## 事故状況図




打込み単管施工中、漏水発生状況



埋設給水管破損状況

## 改善状況図

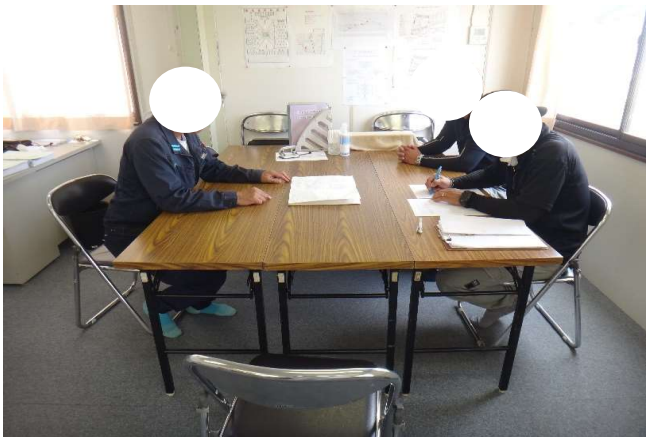

再発防止協議の実施状況



現地にての埋設配管経路確認の実施状況
