


## 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和6年8月5日(月曜日) 9時40分			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	ガス供給管(φ30、未供給管)			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	埋設管布設及び人孔設置						
事故概要	取付管布設及び人孔新設に伴う試掘作業に伴い0.1m <sup>3</sup> 級バックホウにて掘削中に、宅内へのガス供給管(φ30、ガス充填済、未供給管)を損傷させたもの。						
事故原因	試掘にあたっては、本来、人力掘削するべき掘削作業を0.1m <sup>3</sup> 級バックホウで掘削していたところ、ガス供給管(φ30、ガス充填済、未供給管)を損傷させたもの。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・作業前現地で埋設物位置と深さ、径、管種の確認をする</li> <li>・重機作業計画書を作成する</li> <li>・朝礼時、安全訓練で埋設物への安全意識の向上(傲り、思い込みを無くす)する</li> </ul>						

### 事故状況図

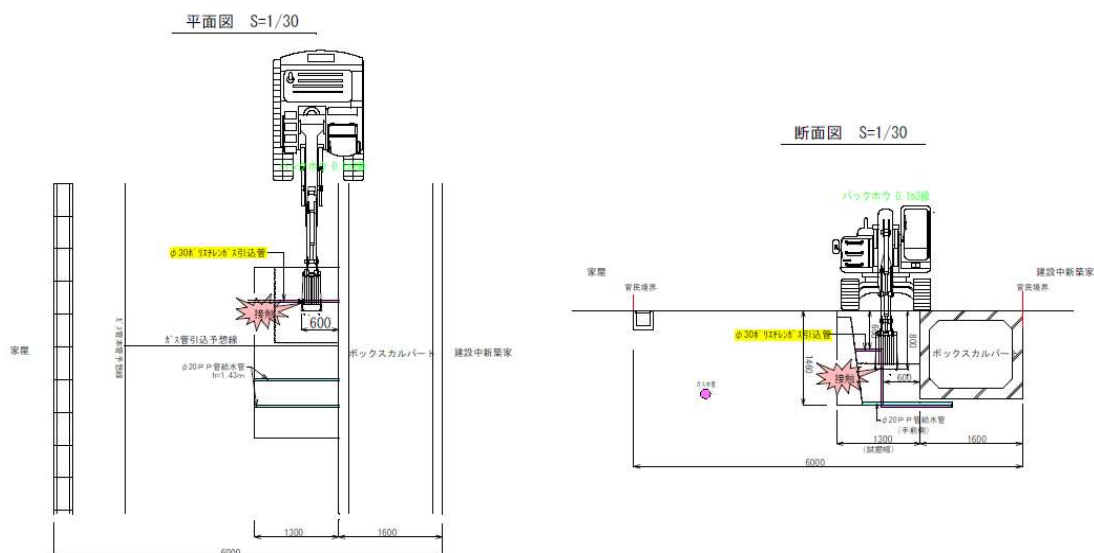

## 改善状況図



## 事故再発防止のための安全訓練



掘削時の埋設物付近手掘り状況
