

公共工事等事故情報


事故分類	労働災害	発生日時	令和 6年 6月15日(土曜日) 4時10分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	転倒	性別	男性	年齢	54	業種区分	土木
被災程度	右第4手節骨折			事故レベル	I	休業見込日数	不休
工事概要	シールド工法での管布設						
事故概要	シールド坑内のシールド切羽インバート部にて、セグメントピースの荷下ろしのためセグメント台車へ移動していた際、他の作業員がインバート上にあった切羽配水用のバキュームホースを引っ張り、被災者の足をすくってしまったため、被災者は足を取られ、右手が枕木に接触し負傷した。						
事故原因	<ul style="list-style-type: none"> ・バキュームホースが作業通路にはみ出していた。 ・ほかの作業員が周囲に人がいることを確認せず、バキュームホースを引っ張った。 ・両手にもものを持ったまま移動していた。 						
改善策	<p>事故再発防止研修を実施し、事故の検証・改善について検討を行い、下記の事項を徹底するよう努めることとした。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バキュームホース等は通路外に這わし、通路内に寄ってこない様、固定を行う。万一、通路等にはみ出した場合、直ちに通路外へ移動する。 ・バキュームホースを移動する際は、近くの関係者全員に声掛けを行い、全員と意思疎通をとった後に移動する。 ・トンネル内での歩行の際は、可能な限り両手に物を持たずに移動します。特に切羽部のインバートから枕木上の通路の昇降の際は、必ず両手をフリーにして行き来する事を厳守する。 						

事故状況図

事故状況写真(再現)

右手が枕木に接触

バキュームホース

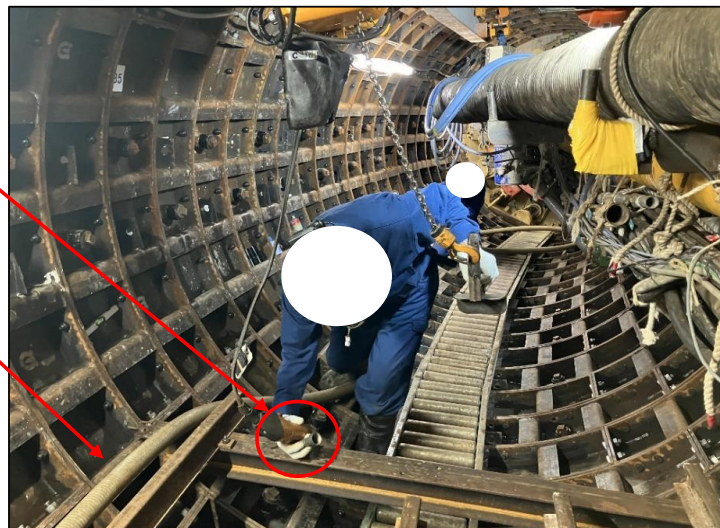

改善状況図

事故再発防止研修の実施状況

