


公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和 7年 2月 7日(金曜日) 14時 30分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	まれ・巻き込ま	性別	男性	年齢	40	業種区分	土木
被災程度	くるぶしの骨折			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	約2か月
工事概要	埋設管更新工事						
事故概要	バックホウにて作業を行っていた際にレーキを踏んでしまい、それに気づいた誘導員がバックホウに近付いて来たため、確認しようと振り返った際にバックホウの操作レバーにオペレーターの衣服が引っ掛かり、機械が旋回し、工事範囲を規制しているガードレールに衝突。ガードレールが倒れたことにより、付近にいた誘導員の足がガードレールと地面に挟まれた。						
事故原因	整理整頓が不十分だったために事故につながった。 雪の中での作業であったため、冬季の防寒対策として防寒着を着込んで作業を行っていたが、慣れない環境での作業で普段とは異なる服装だったことから、事故につながった。 安全ロックレバーを引き上げが徹底されていないことが事故につながった。						
改善策	毎朝のKY活動において、施工中の危険予知の徹底を行い、安全への意識向上を行うとともに安全ロックレバーを引き上げるよう徹底した。 衣類の操作レバーへのひっかけり防止のため服装は整え、かさばる服は脱いで作業する。 整理整頓を心がけ、事故につながる状態を作らない。 事故後に、全社員で安全大会を実施し、事故の原因・今後の再発防止策などを話し合った。						

事故状況図

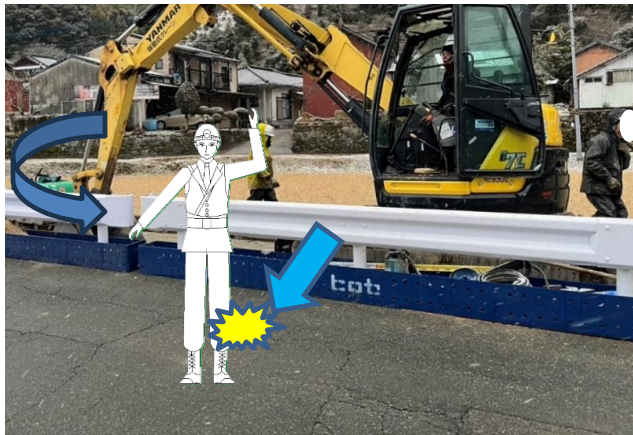

改善状況図

安全確認状況

