
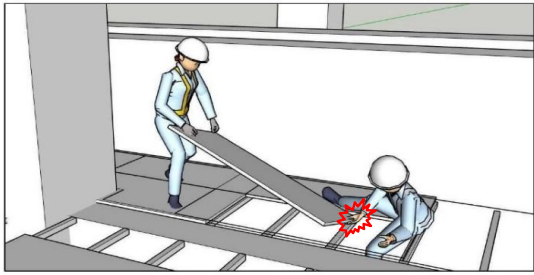
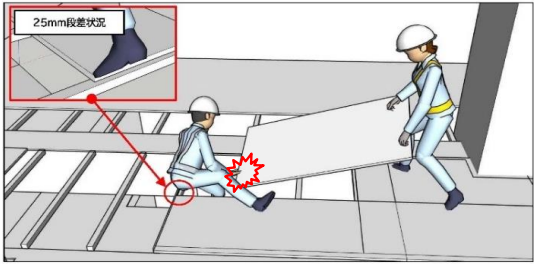


公共工事等事故情報


事故分類	労働災害	発生日時	令和 7年 7月 18日(金曜日) 11時 40分			工事関係者区分	三次下請
事故区分	その他	性別	男性	年齢	51	業種区分	設備
被災程度	右手指末節骨開放骨折、右手指中節骨裂離骨折			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	7日
工事概要	グレーチング敷設作業						
事故概要	屋内にて、作業員2人でグレーチング敷設作業中に被災者が取付箇所受枠に足をかけた際にバランスを崩し、持っていたグレーチングと受枠の間に右手の指を挟み骨折した。						
事故原因	1. グレーチング敷設作業について、安全に作業を行うための手順や方法が作業員に周知されていなかった。 2. 作業グループごとのKYKがなく、全体でKYKを行っていたため、グレーチング敷設作業に特化した危険性の共有がなされていなかった。						
改善策	1. グレーチング敷設作業の手順見直し 2. KYKの見直しおよび今回見直しを行った作業手順の周知 3. 安全教育の実施(作業員全員へ事故原因、再発防止策を周知)						

事故状況図

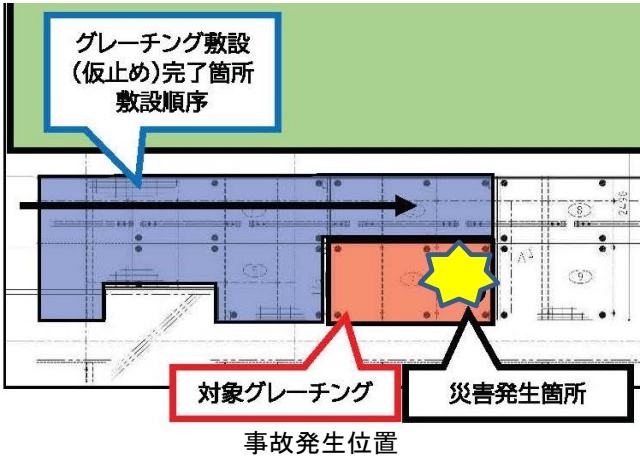

事故発生状況(※フルハーネス等は記載省略)


改善状況図



安全教育の様子



作業グループごとにKYKの実施

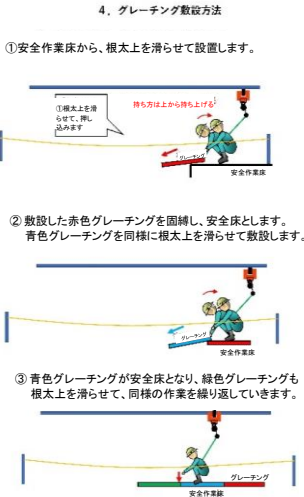

グレーチング敷設手順の見直し
