


1. 位置図

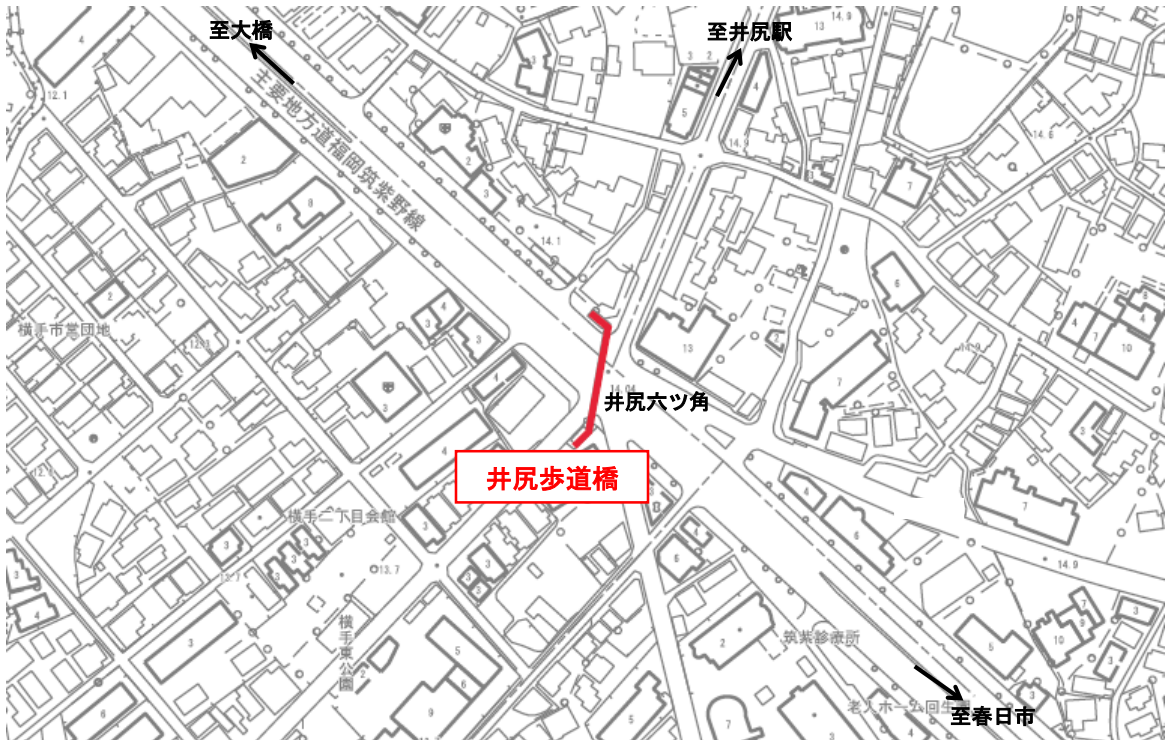

2. 工事概要


○工事目的

井尻歩道橋は1973年の竣工から約50年が経過しており、塗装の劣化や階段部の孔食等の老朽化が進んでいるため、塗装塗替等の全面的な補修工事を実施したもの。

○工事内容

- ・工 事 名：主要地方道福岡筑紫野線井尻歩道橋補修工事
- ・施工場所：福岡市南区井尻5丁目地内
- ・工 期：令和4年11月10日から令和5年3月30日まで
- ・受 注 者：直方工業（株）福岡営業所 所長 篠原 英介
- ・契約金額：112,211,000円
- ・主な施工内容：塗膜除去工 湿潤式工法
A=2,753m²
塗装工 複合型（自己修復）防食工法
A=857m²

3. 工事写真

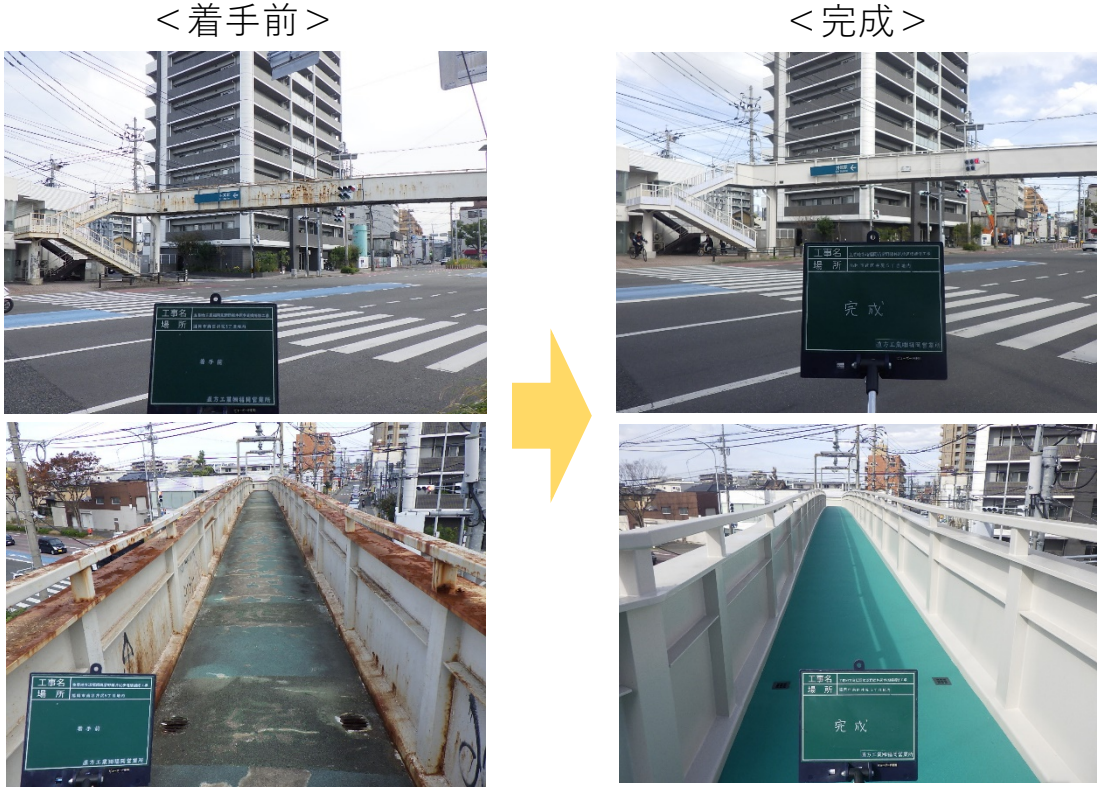

4. 特に顕著な事項

◇工程管理

適切な工程管理に加え、作業人員を増やすことにより通常よりも短い工期で工事を完了させた

◇創意工夫等

- ・LED投光器を使用し、暗所作業時の確実性・安全性が向上した
- ・歩行者の安全対策として、クッション材等を設置した
- ・鳥の糞害対策として、防鳥ネットを設置した

