


東区大岳2丁目地内配水管布設工事 工事概要

発注者:福岡市水道局配水部東部管整備課

受注者:株式会社キョーワ 代表取締役 馬場寛幸

契約金額:84,873,800円

1 位置図

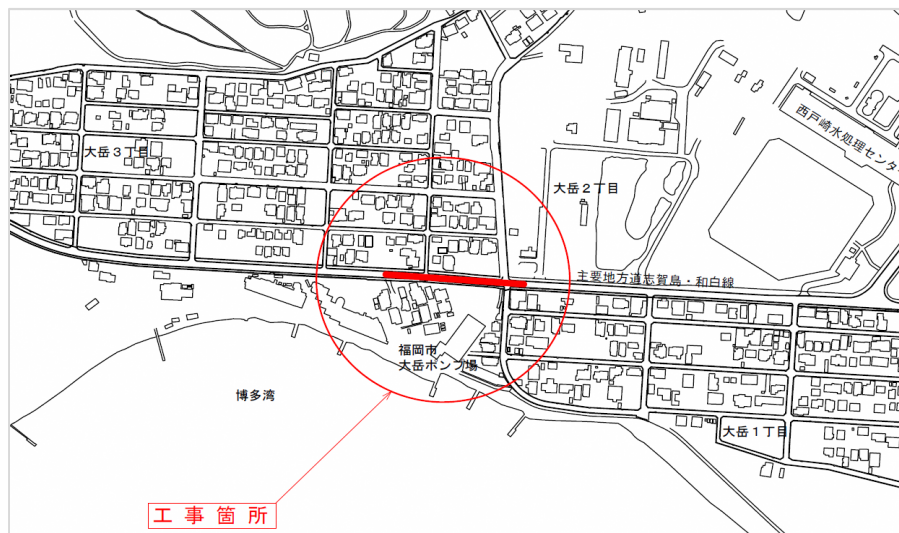

2 工事の概要

本工事は、福岡市地域防災計画に指定された避難所である福岡市立志賀中学校へ給水ルートを優先的に耐震化する「耐震ネットワーク工事」である。

- (1)工事件名 : 東区大岳2丁目地内配水管布設工事
- (2)工事場所 : 福岡市東区大岳2丁目
- (3)工期 : 令和3年6月16日～令和4年2月28日
- (4)工事内容 : 配水管布設φ250DIP-GXE L=158.2m
付帯工 一式

3 工事写真



地盤改良状況



推進状況



管挿入状況


4 特に顕著な事項

★施工・安全衛生

- ・主要地方道路及び地下埋設物が錯綜する工事箇所において、現場条件に配慮した事故防止対策を積極的に提案し、実行した。
- ・工事を通して環境負荷低減や作業員の安全性向上に関する取組みを行った。

★地域への貢献

- ・現場周辺環境に配慮した取組みや地元町内会との交流を積極的に行い、地域住民に対する工事への理解を深めた。

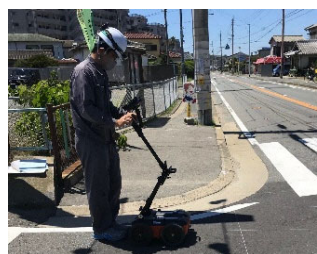

磁気探査



AED



粉じん対策
