

1. 位置図



2. 工事概要

○工事目的



市道大橋駅前1号線は、西鉄大橋駅とJR竹下駅とのアクセス道路であり、緊急輸送道路の1次ネットワークに指定されている。そのため、都市災害の防止及び電気情報通信ネットワークの信頼性向上、歩行空間及び都市景観の向上のため電線類地中化を行うものである。

○工事内容

- ・工事名：市道大橋駅前1号線電線共同溝整備工事（その3）
- ・施工場所：福岡市南区塩原3丁目地内外
- ・工期：令和4年6月10日から令和5年1月5日まで
- ・受注者：島村産業（株） 代表取締役 島村 信介
- ・契約金額：159,841,000円
- ・主な施工内容：管路工 L=2,694m 電力系特殊部 N=6基

3. 工事写真

<着手前>

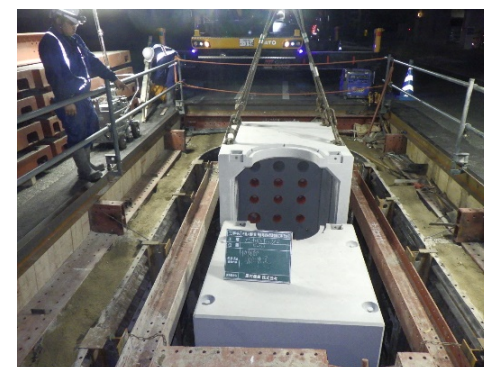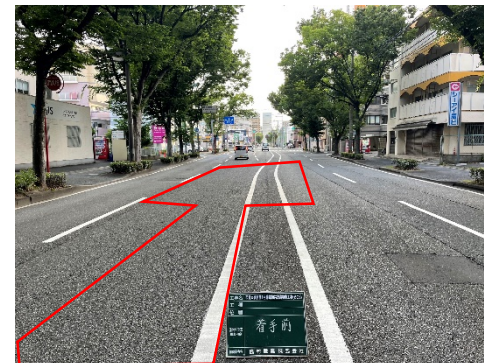

①特殊部施工状況

<完成>



②管路工施工状況

4. 特に顕著な事項

◇工程管理


週休二日（4週8休）を実施し、休日の確保を行った。

◇創意工夫

舗装切断時に静音ブレードを使用し、騒音を減少。

◇地域貢献

工事区間及びその周辺道路において、維持補修・清掃活動を行い、地域貢献を積極的に実施した。

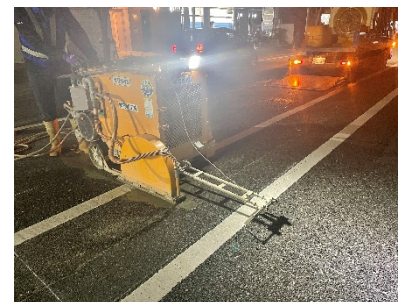

創意工夫（舗装切断）



地域貢献（舗装補修）



地域貢献（周辺道路清掃）
