

春吉（渡辺通二丁目外）地区下水道築造工事 工事概要

野方菱光株式会社

1.工事目的

本工事は、中央区渡辺通二丁目外地区における、老朽化した下水道管の改築・更新等を目的とした管更生等の工事である。

2.工事概要


工 事 名：春吉（渡辺通二丁目外）地区下水道築造工事
工 事 場 所：福岡市中央区渡辺通二丁目外地内
工 事 期 間：令和4年3月12日～令和5年3月5日
工 事 金 額：¥154,847,000
施 工 業 者：野方菱光株式会社 代表取締役 林 宗一
発 注 者：福岡市 道路下水道局 建設部 中部下水道課
工 事 内 容：管更生工φ250 L=205.8m、管更生工φ300 L=220.1m、管更生工φ400 L=153.0m、
管更生工φ450 L=56.1m、管更生工φ500 L=50.2m、桝及び取付管工 1式、付帯工 1式

特に顕著な事柄

- ◎歩行者や通行車両が多い地域であったが、充実した保安対策が実施され、無事故で工事を完了させた。
- ◎工事箇所沿線の営業店舗や病院、建築工事等との日程調整を密に行い、円滑に苦情なく工事を完了させた。
- ◎地下埋設管が輻輳している地域での施工であったが、地下埋設管探査レーダーを積極的に活用し、埋設物の破損事故なく工事を完了させた。
- ◎建設業労働災害防止協会による安全衛生研修を実施するなど、労働安全への取り組みが積極的に行われた。

3.位置図

：工事箇所

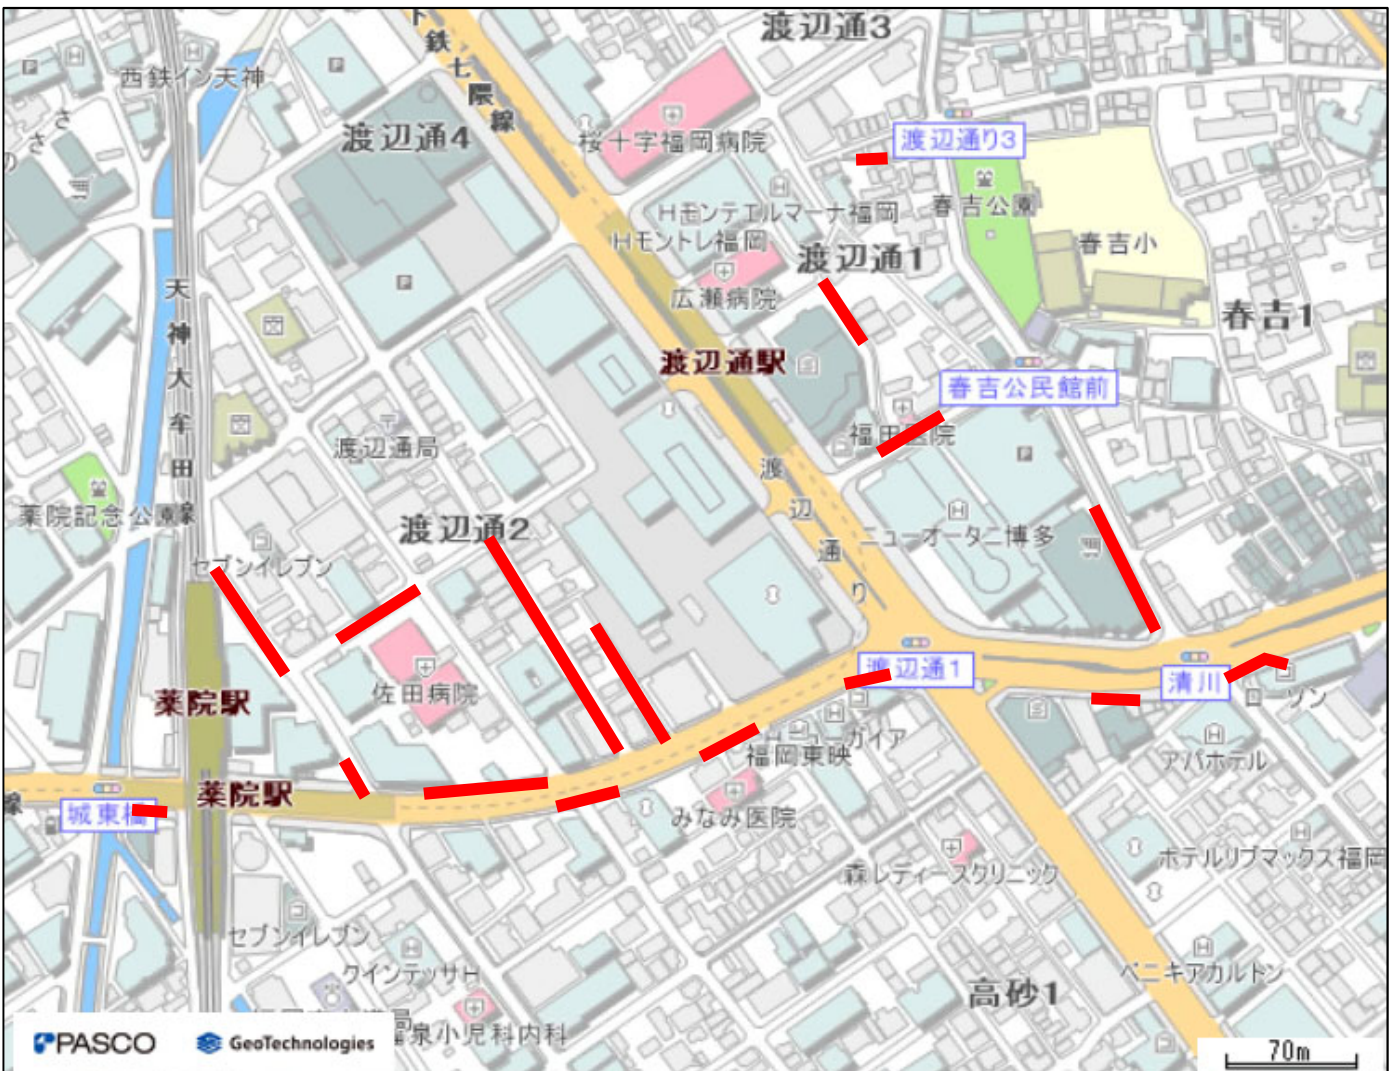

4.工事写真

下水道管内写真（管更生前）



下水道管内写真（管更生後）



地下埋設管探査レーダーの使用



建災防による安全衛生研修の実施

