比恵1号幹線(4)築造工事　工事概要

発注者：道路下水道局西部下水道課

- 受 注 者 ： 松鶴建設 株式会社　代表取締役　川田 和人
- 契約金額： 221,873,300 円

1 位置図

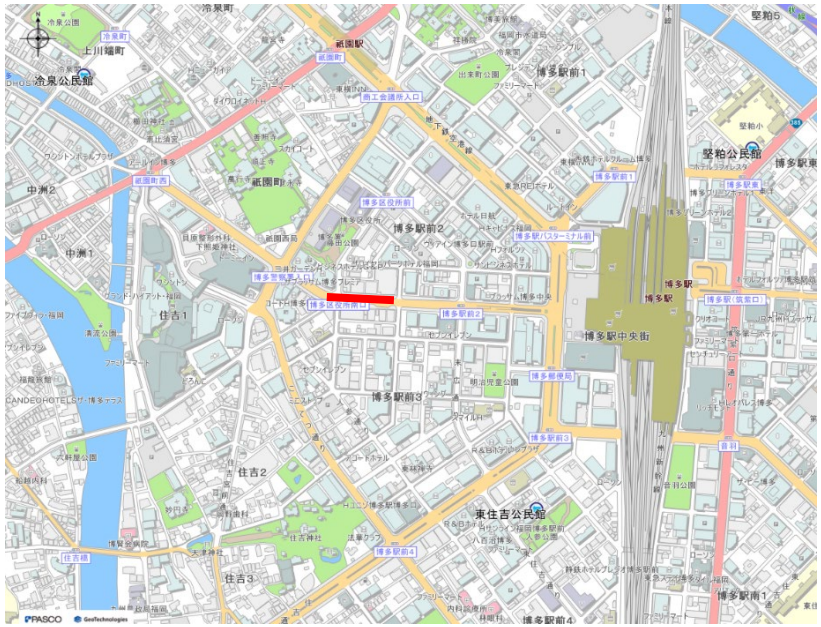

2 工事の概要

本工事は、博多区博多駅前二丁目外地内における既設合流幹線の耐震化を目的とした管更生工事である。

（1）件 名　比恵1号幹線(4)築造工事
（2）場 所　福岡市博多区博多駅前二丁目外地内
（3）工 期　R3.10.9 ～ R4.8.31
（4）内 容　管更生工（クリアフロー工法）
　　□3000×2100　L = 115.5 m
　　付帯工　1.0 式

3 工事写真

着手前

完 成

4 特に顕著な事項

★施工関係
・人孔蓋替工を「パラボラ工法」で施工し、騒音・環境負荷の低減、工期短縮、品質向上を図った。

★安全衛生関係
・施工区間の保安対策として、LEDソーラー充電式点滅灯を使用し、交通事故防止に努めた。
・人孔蓋替工に際して、多目的防音パネルを使用し夜間の騒音対策に努めた。

人孔蓋替工
「パラボラ工法」

LEDソーラー充電式点滅灯

多目的防音パネル
