福岡（平尾四丁目）外地区下水道築造工事　　工事概要

株式会社テシマ工業

1.工事目的

本工事は、中央区平尾四丁目外地区における、老朽化した下水道管の改築・更新等を目的とした管更生等の工事である。

2.工事概要

工　　事　　名　：　福岡（平尾四丁目）外地区下水道築造工事
工　事　場　所　：　福岡市中央区平尾四丁目外地内
工　事　期　間　：　令和３年６月１６日　～　令和４年４月２８日
工　事　金　額　：　¥150,108,200
施　工　業　者　：　株式会社テシマ工業　　代表取締役　手嶋　一晶
発　　注　　者　：　福岡市　道路下水道局　建設部　中部下水道課
工　事　内　容　：　管更生工φ250　L=673.2m，管更生工φ300　L=129.0m，管更生工φ400　L =24.7m，
管布設工φ250　L=20.9m，桝及び取付管工　1式，付帯工　１式

特に顕著な事柄

◎閑静な住宅街での施工であったが、低騒音型機械を積極的に使用し騒音対策に努め、苦情なく工事を完了させた。
◎現場周辺の道路及び公園の清掃活動、側溝の補修等を行う等、地域貢献への取り組みが顕著であった。
◎現場事務所での飛沫防止パーテーションの設置、作業前の検温を行う等、新型コロナウイルス感染症拡大防止への取り組みが積極的に行われた。
◎タープテントの常設、塩タブレットの常備、作業員に空調服を着用させる等、熱中症対策への積極的な取り組みが行われた。

3.位置図

：工事箇所

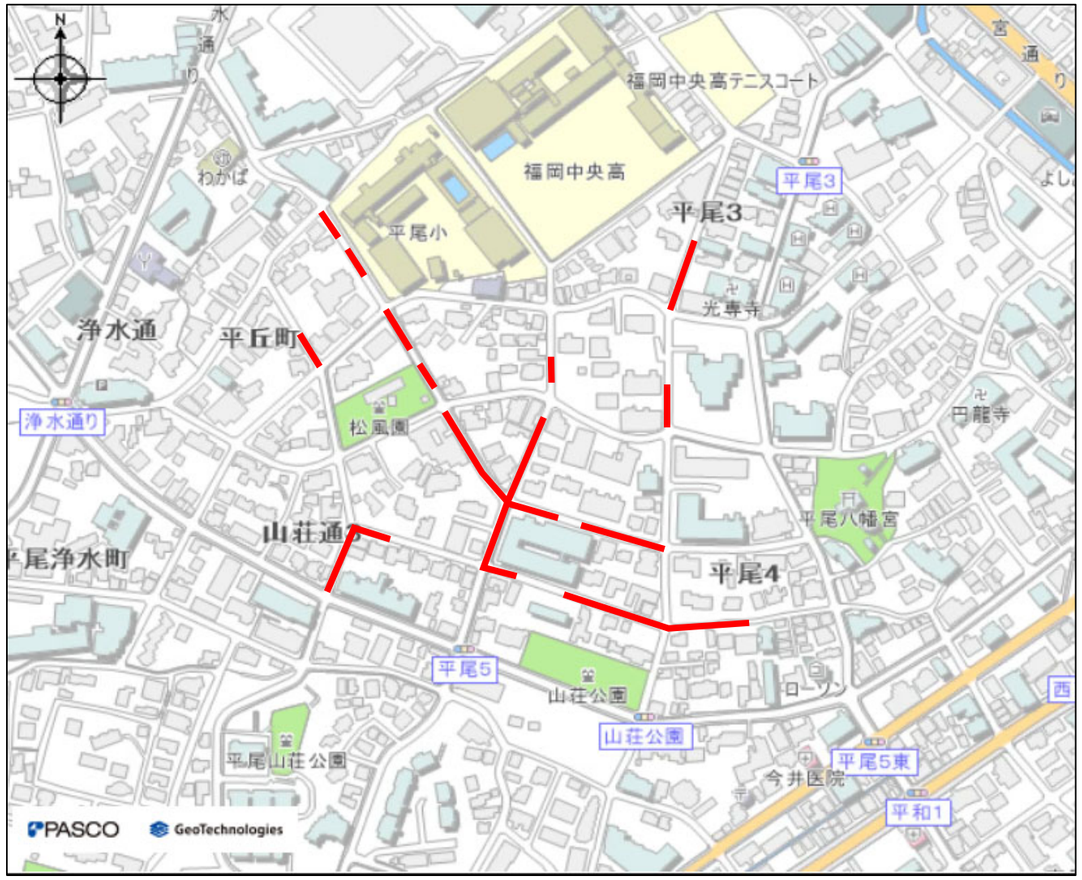

4.工事写真

オートアイドル機能付ミニバックホウの使用

地域への貢献（公園の清掃）

現場事務所内飛沫防止パーテーション設置

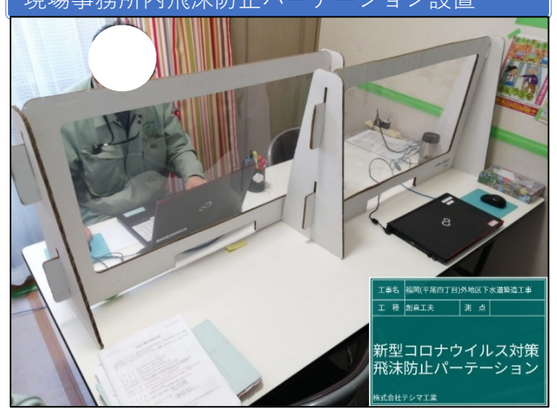

熱中症対策の実施（タープテントの常設）
