塩原第４雨水幹線築造工事　工事概要

発注者：道路下水道局西部下水道課

- 受 注 者 ： 大徳産業　株式会社　代表取締役　島村　愛加里
- 契約金額： 80,675,100　円

1　位置図

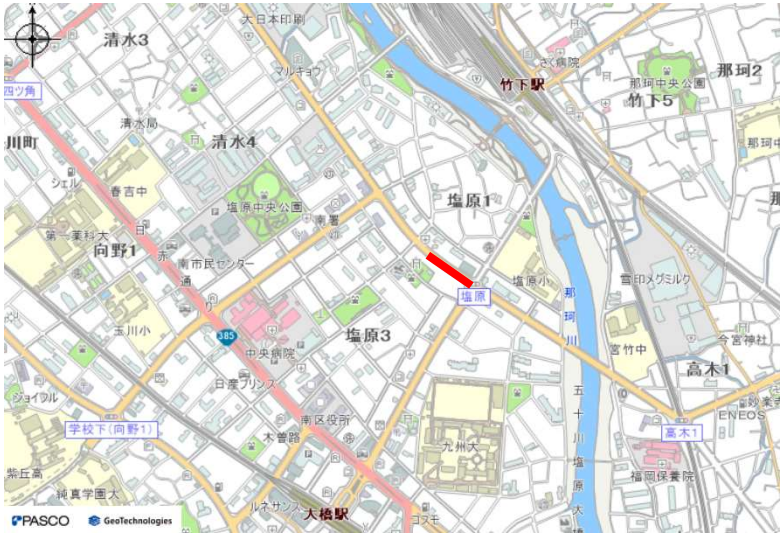

2　工事の概要

本工事は南区塩原一丁目地内における
既設雨水幹線の耐震化を目的とした管更生工事である。

（１）件　名　　塩原第４雨水幹線築造工事
（２）場　所　　福岡市南区塩原一丁目地内
（３）工　期　　R4.9.21　～　R5.3.9
（４）内　容　　管更生工（ダンビー工法）
　　○ 1500　　L = 122.1 m
　　付帯工　　1.0 式

3　工事写真

着　手　前

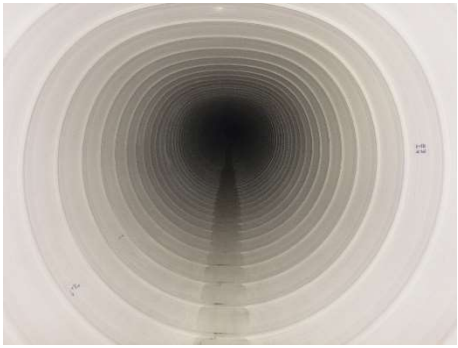

完　成

4　特に顕著な事項

★創意工夫等
・既設管口周りのコンクリートの浮き、クラック等が確認されたため補修材（マスターエマコ）を使用して補修を行った。
・既設人孔、コンクリート内部の鉄筋を損傷、切断しないよう、コンクリート探知機を使用した。

★地域への貢献
・「一人一花」運動としてプランターを設置し、工事現場のイメージアップを図った。
・現場周辺の清掃・除草活動を行った。

既設管口の
補修

コンクリート
探知機の使用

現場周辺の
清掃・除草活動

「一人一花」運動
