第６号　　令和８年９月発行



福岡中学校・馬出小学校 建替検討委員会ニュース



「福岡中学校・馬出小学校建替検討委員会」では、校舎の老朽化に伴う建替えを契機に福岡中学校の小規模校の課題を解決するため、令和５年度から建替えの方向性などについて協議しています。

令和８年７月８日(水)に第７回建替検討委員会を開催し、現在、学校と取り組んでいる新設小中学校の基本設計等の進捗状況について、委員の皆様に説明を行いました。

また、併せて仮設校舎設置の概要とスケジュール(別紙参照)、通学路の検討状況について報告を行いました。

1「前回までの確認事項」

＜第６回建替検討委員会(R7.6月)までに確認された事項＞

建替方針決定（R6.6月）


◆福岡中の小規模校の課題を解決するため、**施設一体型による小・中学校を整備**

◆馬出小の方が比較的、児童・生徒の安全が確保できること、コミュニティ活動の中心であることなどから、新設する学校校舎は、**馬出小校地に建設**

建替え方決定＜更地建替え案＞（R7.6月）

◆工事期間中は**福岡中に小学校の仮設校舎を建てて、小中学校の運営**を行いながら、**馬出小を更地**にし、既存校舎側と同様の位置に新しい**小中学校の校舎や体育館を建設**

2 建替えスケジュールの状況（最短イメージ）

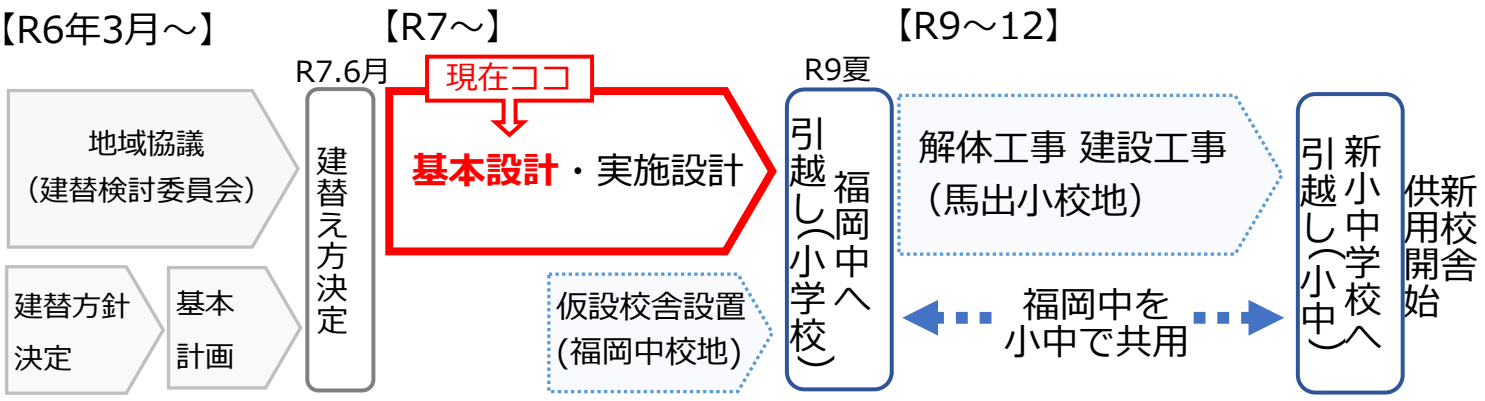

※ 次ページ以降も、ご覧下さい

お問い合わせ先
福岡中学校・馬出小学校建替検討委員会事務局（教育委員会学校計画第２課）
TEL：711-4252　FAX：733-5539
E-mail：gakkokeikaku.BES@city.fukuoka.lg.jp

3　新設小中学校の全体整備イメージ

<全体配置・ゾーニングの考え方について>


① 運動場　約8,500㎡
- 中学校規模の運動場を確保

② 児童広場　約1,000㎡
- 芝生の広場とし、低学年が遊べるスペースとして遊具なども設置

③ 馬出モール
- 正門から運動場へ抜ける馬出モールを軸とした動線計画（ﾒｲﾝ、ｻﾌﾞ、車両）
- 学校、地域動線を馬出モールへ集約して児童生徒昇降口と地域利用玄関を配置し、給食等車両動線と分離
- エレベーターを地域利用玄関の近くへ配置し、管理区分と縦移動のしやすさにも配慮

④ 駐車場
- 歩車分離できるよう、車両通用門を別途設置
- 身障者用及び来客用駐車場を整備、また、大型バスの進入・駐車もできるよう考慮

⑤ 交流・連携ゾーン（１階）
- １階北側には、児童生徒や地域との交流ができる空間を整備
- １階西側には、学校や地域が利用できる階段教室を整備
- 福岡中と馬出小、地域の歴史を感じ、学べる空間を検討

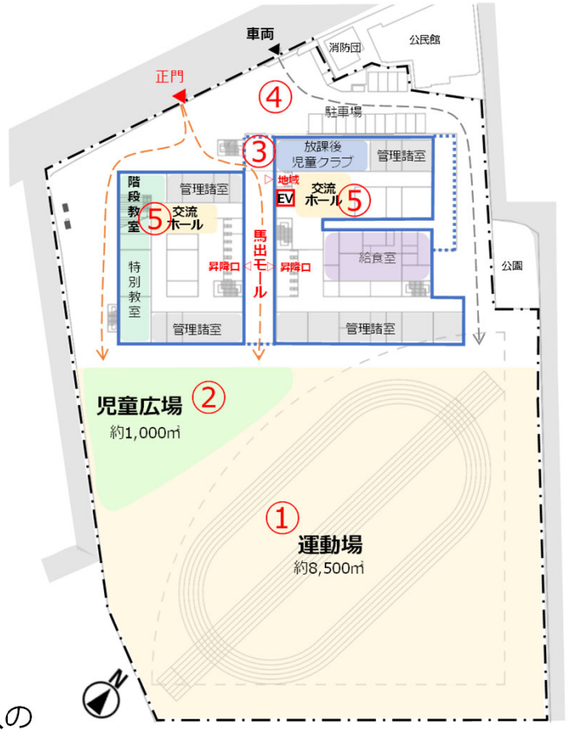

1階平面図兼配置図イメージ

➡ 基本設計では、基本計画をベースにした上記の考え方をふまえ、詳細を検討しており**児童生徒や地域がより使いやすく**、**防災面も配慮**した**基本設計案**に学校と共に取り組んでいます（ 詳しくは参考①②の基本設計案をご確認下さい）

<学校敷地内の記念物の整理について>

馬出小ゆかりの記念物については、今後、学校や地域と協議し、活用方法などの検討を行ったうえで、整理をしていきます。
（旧福岡市動植物園正門　など）




<参考①> 施設一体型小・中学校の「基本設計案」検討

基本設計案（イメージ）


配置イメージ

特徴：馬出モールを軸として、児童生徒昇降口と地域入口をそれぞれ配置
サブアリーナ(4、5F)、武道場(5F)を上階へ配置することで、**１階にゆとりをもたせ、児童生徒や地域との交流・連携ゾーンを確保しやすく、サブアリーナ・武道場の浸水リスクがない**
さらに、地下階がなくなることで工期も短縮

(各階の諸室構成)
- **5F** 武道場、テニスコート
  特別教室
- **4F** 普通教室、特別教室
  サブアリーナ(4、5F)
- **3F** 普通教室、特別教室
- **2F** 特別支援・普通教室
  図書室、メインアリーナ
- **1F** 管理諸室、階段教室
  放課後児童クラブ

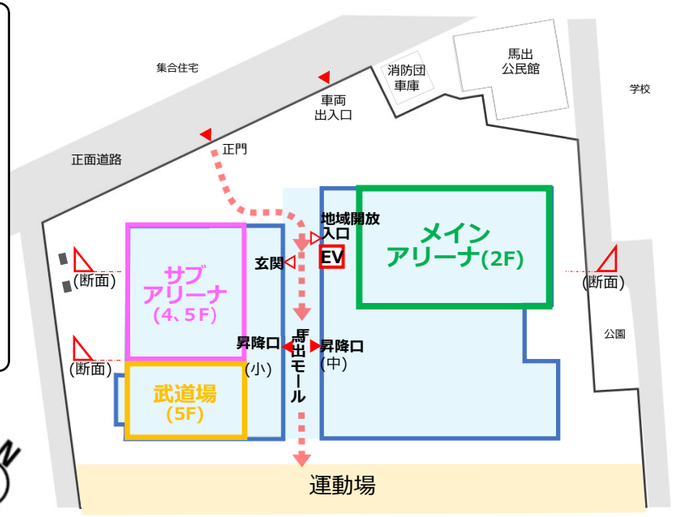

断面イメージ

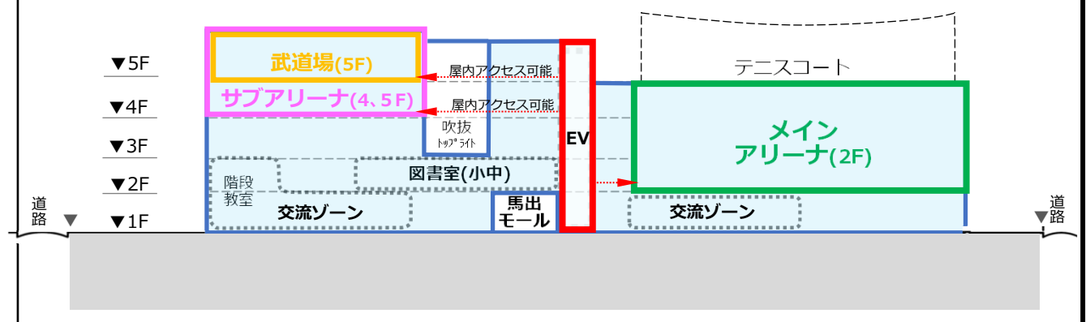


今後の詳細な実施設計等については、主に学校と協議をしながら設計に取り組んでいきます。
また、設計内容やスケジュール等については、今後も建替検討委員会にて報告を行い、「建替検討委員会ニュース」を通じて、適宜、保護者や地域の皆様へお知らせいたします。

＜参考②＞「基本設計案」の各階諸室構成イメージ

※主な諸室エリア（普通教室・特別支援教室、特別教室、管理諸室）のゾーニングイメージです

基本設計案（各階のゾーニングイメージ）

：普通教室、特別支援教室ゾーン
：特別教室ゾーン
：管理諸室ゾーン

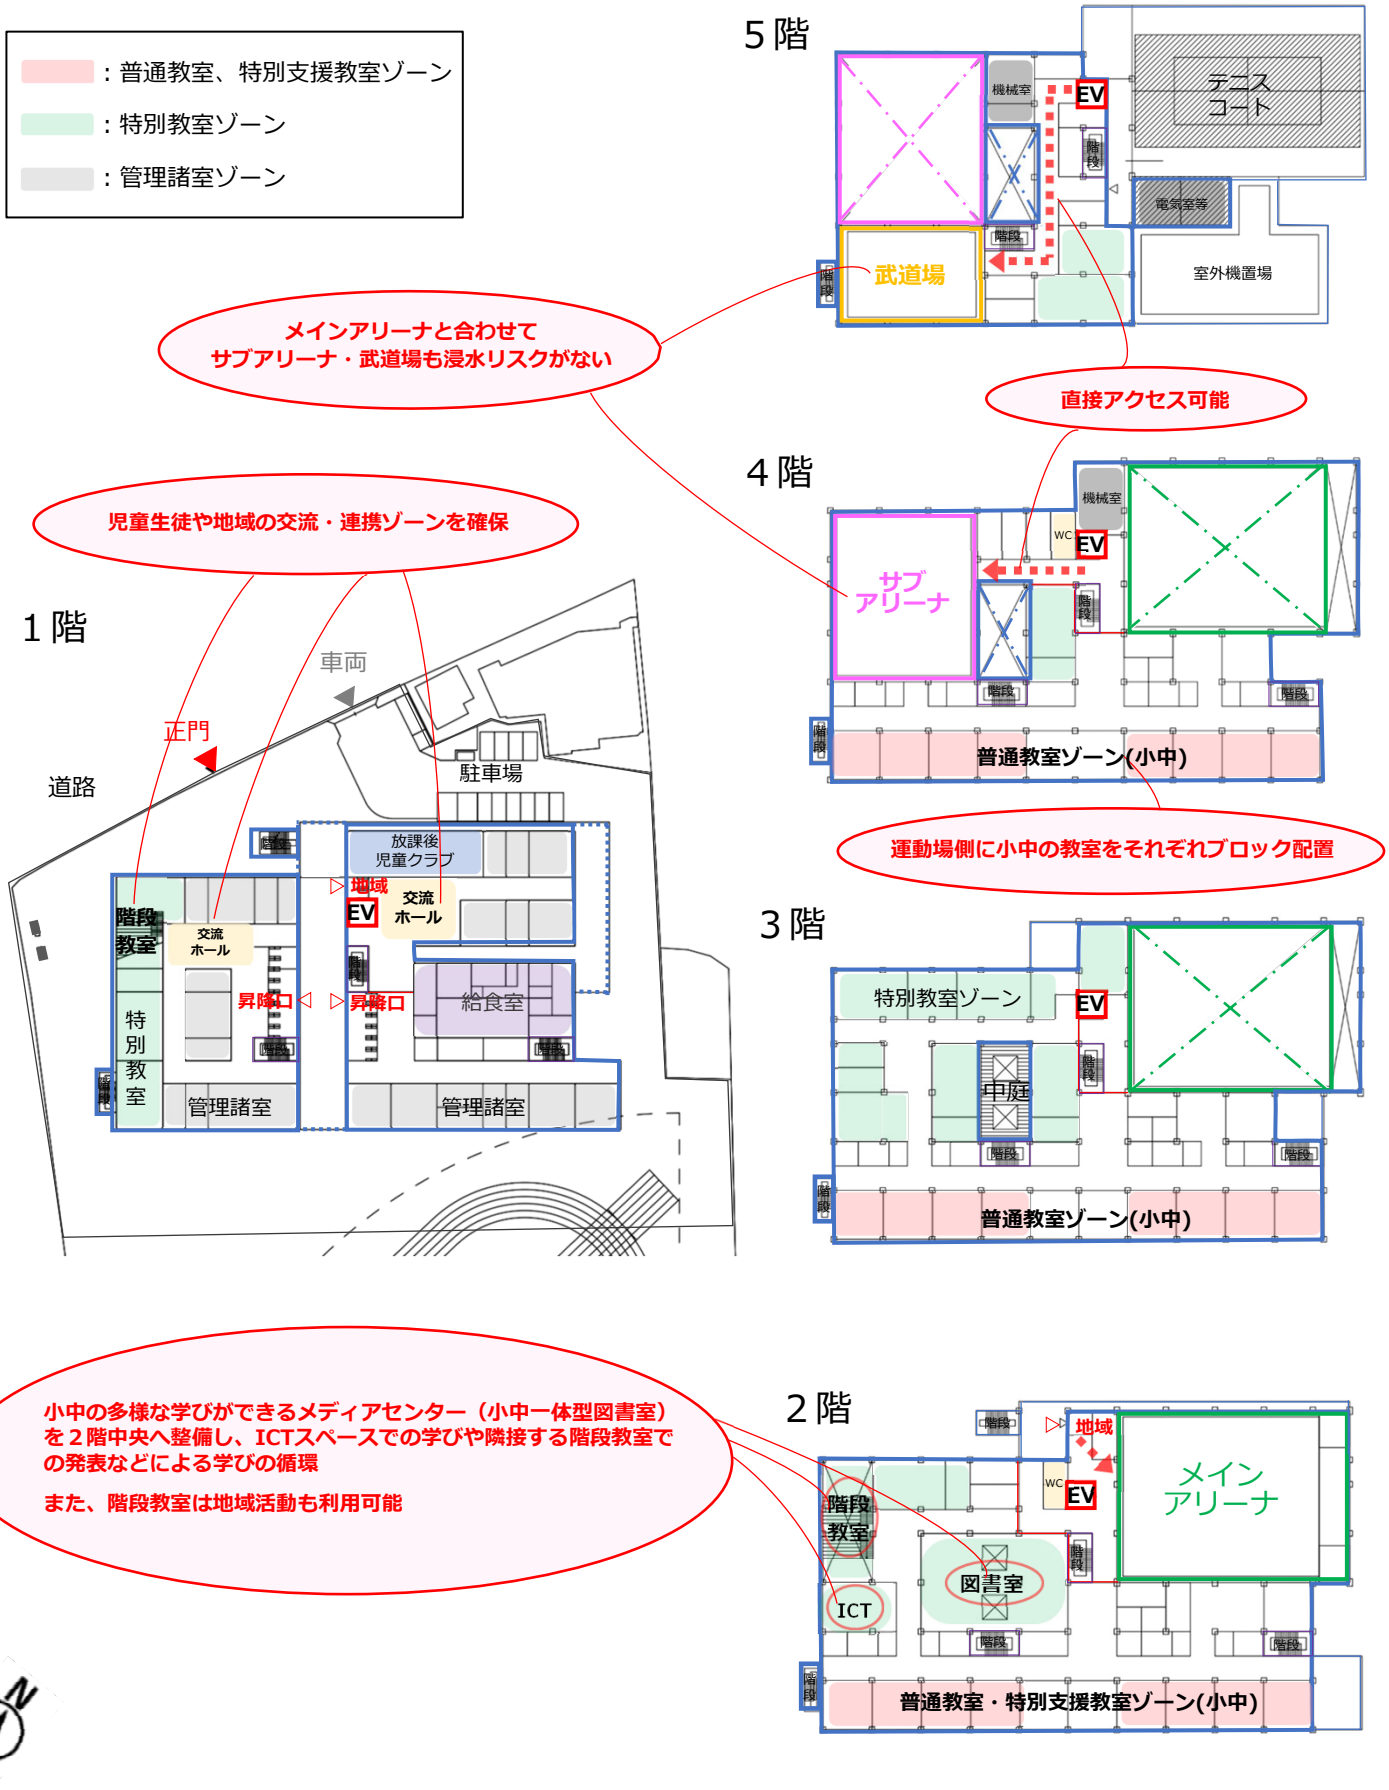

※ 本内容は基本設計段階のため、今後の実施設計等において変更の可能性があります。


福岡中学校・馬出小学校　建替検討委員会ニュース

別紙


福岡中学校への馬出小学校仮設校舎設置について（進捗報告）

仮設校舎設置の概要とスケジュール（予定）

現況（福岡中）

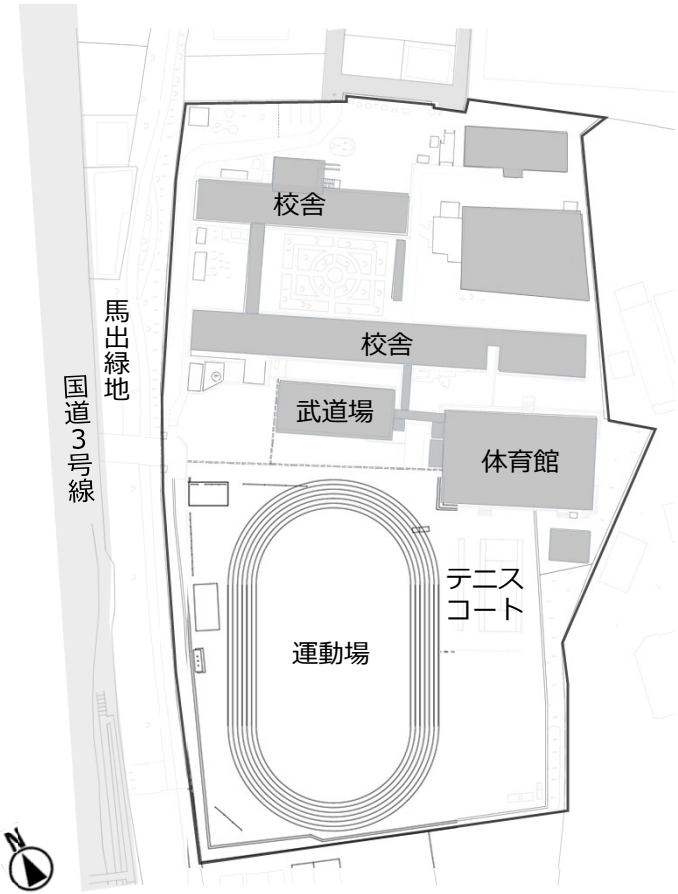

工事期間中（R8.冬～R9.夏）

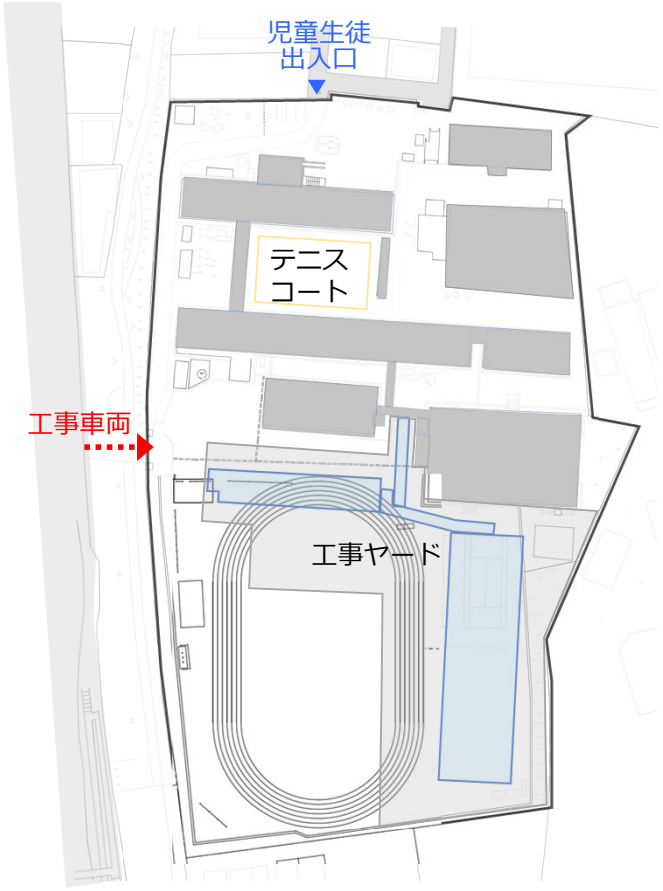

設置後（R9.２学期～）

※設置完了後、福岡中へ引越し（小学校）



※ 本内容は基本検討時点のため、今後の発注等において変更の可能性があります。
