箱崎２号幹線（２）築造工事　工事概要

発注者：道路下水道局西部下水道課

- 受 注 者 ： 吉岡工業 株式会社 代表取締役　吉岡 宏史
- 契約金額： 152,400,600 円

1 位置図

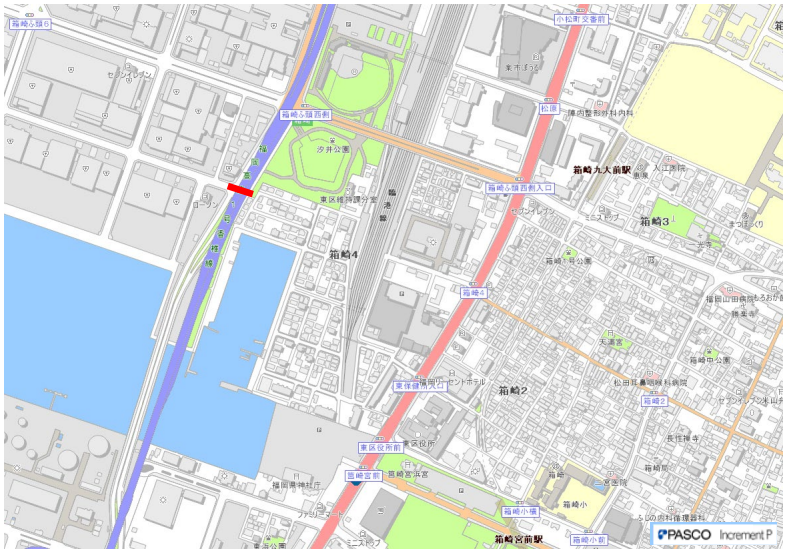

2 工事の概要

本工事は東区箱崎四丁目外地内における既設雨水幹線の耐震化を目的とした管更生工事である。

（１）件 名　箱崎２号幹線（２）築造工事
（２）場 所　福岡市東区箱崎四丁目外地内
（３）工 期　R3.10.9 ～ R4.5.20
（４）内 容　管更生工（クリアフロー工法）
□ 4000×4000　L = 44.8 m
付帯工　1.0 式

3 工事写真

着 手 前

完 成

4 特に顕著な事項

★安全対策
・色覚の個人差を問わず見やすいLED標示機を使用することで歩行者の安全対策向上を図った。
・2色カラー及び特殊形状の反射シートでどの方向からでも視認性に優れ、交通事故を防止した。

★地域への貢献
・「一人一花」運動としてフラワーポットを設置し、工事現場のイメージアップを図った。

「LED標示機」

「ＫＹブロック」

「一人一花」運動
